

RAPPORT DE MISSION DE SUIVI TICAD A AGADEZ

1 Introduction

Le présent rapport est le résultat d'une mission de suivi et de supervision organisée par le PNUD, bureau d'Agadez du 17 au 20 juillet 2014 dans le cadre du projet « Consolidation de la paix et la gouvernance dans le Sahel-TICAD, dans 4 communes de la région d'Agadez à savoir Ingall, Arlit, Tchirozérine et la Commune urbaine d'Agadez

Les membres de la mission :

1. Kiari Boukar, Coordonnateur de projet Terrain/Agadez
2. Yahaya Matchi Bassirou, Assistant Financier terrain PNUD/Agadez
3. Mohamed Adamba, Chauffeur

Du 17 au 20 juillet 2014, l'équipe PNUD/Agadez a entrepris une mission de suivi des projets mis en œuvre dans le cadre de TICAD dans 4 des 5 communes de mise en œuvre. Seule la commune d'Iferouane n'a pas été visité du fait que la commune vient juste de démarrer les travaux.

Dans chaque commune, l'équipe s'est entretenue avec les autorités municipales, les Comités de Gestion des projets et les entrepreneurs responsables de la réalisation des chantiers. Les entretiens avec la mairie et les COGES ont porté sur la gestion des fonds du projet, le niveau de réalisation, les contraintes rencontrées et la voie de solutions entreprise par les COGES. Dans chaque commune, l'équipe de la mission a fait le tour des ouvrages et s'est entretenue avec l'entrepreneur et les bénéficiaires. Ces derniers ont apprécié l'impact attendu et le changement que ces projets vont apporter à leur vie. Le tableau ci-après synthétise le niveau de réalisation, les contraintes rencontrées sur terrain, mais aussi l'impact attendu du projet. Les observations et recommandations de l'équipe de la mission sont aussi présentées dans la matrix.

2 Synthèses des résultats de la mission

COMMUNE	PROJET	DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET	REALISATIONS A JOUR	EFFETS/IMPACTS ATTENDU	OBSERVATIONS/CONTRAINTES ET SOLUTIONS PROPOSEES
Ingall	Transformation d'une case de santé en CSI en matériaux définitifs à Amatalal et construction d'un (1) bloc de deux classes en matériaux définitifs à Inkoussoutane	Transformation d'une case de santé en CSI à Amatalal :	<ul style="list-style-type: none"> • Les constructions sont terminées • Enduit et toitures sont encours • Dans l'ensemble les travaux sont à 80% 	<ul style="list-style-type: none"> • Bénéficiaires : 9 villages pour une population d'environ 4500 hts. • Augmentation de la fréquentation médicale 	<p>Observations :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les travaux de la construction des classes sont à l'arrêt en attendant le déblocage des fonds • pas de panneaux de visibilité <p>Contraintes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pas de difficultés majeures signalées <p>rapport de la première tranche déposé</p> <p>Recommandations :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accélérer le traitement du rapport et le décaissement des tranches suivantes • Mettre des panneaux de visibilités sur tous les sites • Continuer si possible les travaux sur fonds propre
		Construction de deux classes en matériaux définitifs à Inkoussoutan	<ul style="list-style-type: none"> • La construction et l'enduit sont terminés ainsi que la pose des IPN. • Reste la pose des tôles. 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 campements et environs 40 élèves qui suivent les cours présentement dans des pailotes seront le bénéficiaires directs 	
Tchiro	Extension et équipement du centre en Développement Communautaire dans la commune de TCHIROZÉRINE	Construction d'un bloc de 3 salles de cours et équipement	<ul style="list-style-type: none"> • Les travaux de maçonnerie sont en achevés, • Enduit et pose de la toiture en cours 	<ul style="list-style-type: none"> • Environ 10.000 jeunes de la commune de Tchiro vont bénéficier du centre et des formations qui y seront dispensées • 70 à 90 nouveaux élèves attendus pour la rentrée prochaines 	<p>Observations</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les travaux avancent lentement à cause du mois de Ramadan. • Absence de plaque de visibilités • Rapport des premières tranches bouclées et déposé. <p>Contraintes</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le mois de ramadan a ralenti les travaux <p>Recommandations</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accélérer le traitement du rapport et le décaissement des tranches suivantes • Mettre des panneaux de visibilités sur tous les sites
		Construction d'un mur de clôture au CFDC	<ul style="list-style-type: none"> • Les travaux sont en cours estimés à 75% 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 personnes dont 49 femmes ont été mobilisées pour les travaux 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Achat d'équipement de travail pour les élevés 	<ul style="list-style-type: none"> • L'équipement est acheté et livré, matériels disponibles dans le centre 		<ul style="list-style-type: none"> • Poursuivre les travaux notamment les murs de clôture pour éviter des dégâts liés à la pluie
		<ul style="list-style-type: none"> • Branchement eau et électricité 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchement d'eau est effectif, reste celui de l'électricité 		
Agadez	Construction des ouvrages d'assainissement de la vieille ville d'Agadez et de gabions de protection de la digue du grand kori et Appui au maraichage (au profit de 5 groupements du quartier Alerçès)	Construction digue de protection (400ml en gabion)	<ul style="list-style-type: none"> • La construction de la digue est terminée 	<ul style="list-style-type: none"> • La ville d'Agadez est protégée contre les crues du Kori ainsi que les maraichers d'Alerçès 	<p><u>Observations</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pas de panneau de visibilité sur le site • Travaux ralenti par le mois de ramadan • Rapport de la première tranche soumis <p><u>Contraintes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Problème de main d'œuvre pour les ouvrages d'assainissement <p><u>Recommandations</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Placer les plaques de visibilités sur tous les sites • Augmenter la main d'œuvre pour accélérer les travaux de construction des 65 ouvrages d'assainissement • Accélérer le traitement des rapports pour le prochain décaissement
		Construction 65 ouvrages d'assainissement dans la vieille ville d'Agadez	<ul style="list-style-type: none"> • Début des travaux de construction des ouvrages d'assainissement 	<ul style="list-style-type: none"> • La vieille ville d'Agadez assainie et plus de 500 emplois créés chez les jeunes 	
		Appui aux producteurs d'Alerçès	<ul style="list-style-type: none"> • Activité pas encore commencée 	<ul style="list-style-type: none"> • Une meilleure production chez les maraichers d'aleçès 	

Arlit	« Arlit Sarho »	<ul style="list-style-type: none"> - Collecte et traitement /transformation des déchets plastiques 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 jeunes sont formés en transformation de déchets plastiques en pavé et bordure de chaussée. • Une unité de transformation des plastics créée 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 jeunes formée, 2100 Hj créés et 70 personnes mobilisé pendant 1 mois 	<p style="text-align: center;"><u>Observations</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Les travaux ont beaucoup avancés • Les puisards et les salles d'hospitalisation sont déjà réceptionnés • Le rapport de la première tranche bouclé et déposé • Pas de panneau de visibilité sur certains sites <p style="text-align: center;"><u>Contraintes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • La gestion de main d'œuvre qui attend d'être payée <p style="text-align: center;"><u>Recommandations</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Accélérer le traitement du premier rapport et décaissement des tranches pour finir les travaux • Mettre un panneau de visibilité sur les autres sites
		<ul style="list-style-type: none"> - Réalisation de 65 puisards des eaux usées 	<ul style="list-style-type: none"> • 65 puisards d'assainissement réalisée et réceptionnés 	<ul style="list-style-type: none"> • Résolution d'écoulement des eaux usées sur les voies publiques • Création de 53 emplois au cours de la période 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Construction et équipement de 2 salles d'Hospitalisation au CSI Boukoki 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Les 2 salles d'hospitalisation sont terminées, équipées et réceptionnées 	<ul style="list-style-type: none"> • Une population de 15 000 personnes sera bénéficiaire du CSI • Les salles résolvent le problème de transfert. • 29 emplois pendant la construction des salles 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Crépissage des clôtures des 7 écoles 	<ul style="list-style-type: none"> • Le crépissage est en cours des écoles est cours 	<ul style="list-style-type: none"> • Main d'œuvre : 119 personnes mobilisées et 1190 Hj créés pour cette première phase 	

3 Conclusion

La mission du suivi des activités du projet TICAD- Sahel dans les communes d'Agadez tire les conclusions suivantes

- Tous les projets s'exécutent normalement et sont très avancés dans toutes communes de mise en œuvre.
- Les rapports de la première tranche des fonds sont bouclés soumis au PNUD par l'ensemble de communes visitées.
- La mission a constaté que malgré le niveau d'exécution des travaux sur les sites, les plaques de visibilité ne sont pas placées. La mission a vivement recommandé aux communes de les placer dans un bref délais
- Vu le niveau avancé de la mise en œuvre des projets sur le terrain, la mission recommande vivement au PNUD d'accélérer le traitement des rapports soumis afin que le décaissement de la prochaines tranches des fonds interviennent le plutôt possible.
- Les travaux sont presque terminées dans les communes et que certaines réalisations sont déjà réceptionnées, la mission recommande la libération simultanée des deux dernières tranches des fonds pour permettre de finir les travaux dans les délais et d'apurer les dettes accumulées par les entrepreneurs et les mairies.

4 Photos des réalisations


<u>COMMUNES/PROJET</u>	<u>SITUATION ACTUELLE</u>	<u>ETAT DE REALISATION AU 20 juillet 2014</u>	
<p>Construction des ouvrage d'assainissement dans la vielle ville d'Agadez</p>	 <p><i>Photo 1 : système d'évacuation des eaux usées dans la vielle ville d'Agadez</i></p>	 <p><i>Photo 2 : ouvrage de collectes des eaux usées en construction dans la vielle d'Agadez</i></p>	 <p><i>Photo 3: ouvrage de collectes des eaux usées en construction dans la vielle d'Agadez</i></p>
			

Photo 4: Transformation des déchets plastiques dans des fours à Arlit

Photo 5 : confection des pavés à partir des plastiques

Photo 6: Pavés confectionnés à Arlit

Crépissage des murs de 7 écoles à Arlit

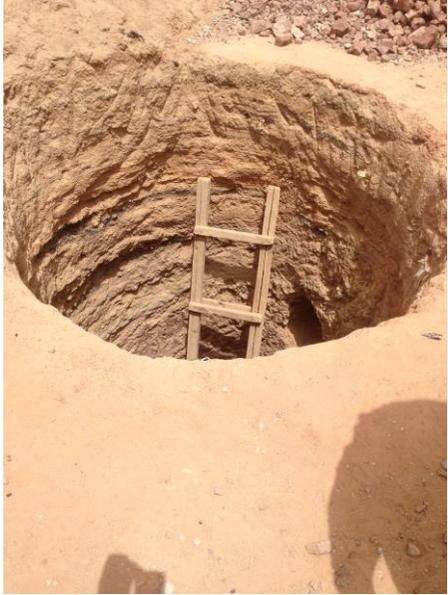

Photo 7: travaux de crépissage de murs



Photo 8: murs d'une école crépis



Photo 9: travaux d'assainissement en Arlit

Construction de salles d'hospitalisation au CSI BKK à Arlit



Photo 10: les travaux de construction de salle d'hospitalisation en cours



Photo 11: Cérémonie de réception des salles d'hospitalisation en présence du Préfet du Département



Reception des Salles d'Hospitalisation et de la Douche du CSI Boukoki II (PNUD) TICAD le 18/06/2014 à Arlit
06.18.2014

Photo 12: Equipement des salles d'hospitalisation en lits et matelas

Extention et équipement du CFDC de Tchiro



Photo 13: vue du bloc formation professionnelle du CFDC d'Abalak



Photo 14: : Salle de cours en construction au CFDC de Tchiro



Photo 15: Vue du matériel d'apprentissage livré au CFDC de Tchiro

Transformation de case de santé en CSI et construction de Classes à Ingall



Photo 16: Classe qui abritait les élèves détruite par le vent



Photo 17: Salles en construction



Photo 18: Salle de cours construites



Photo 19 : Construction de la digue de protection du Kori à Agadez
