



**MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE**

\*\*\*\*\*

**Service National des Actions Humanitaires**

\*\*\*\*\*

**Projet de Réhabilitation Communautaire de Forécariah et Kindia**

TF-HUMAN SECURITY

GUI/02/002/A/01/34

ID 00041682



---

# **RAPPORT DE CLÔTURE**



Octobre 2009

## **I. CONTEXTE**

Depuis plus d'une décennie, la Guinée est pays d'asile des centaines de milliers de réfugiés venant des pays voisins –la Sierra Leone, le Liberia et la Guinée-Bissau. En 1999 la situation politique en Guinée-Bissau s'est normalisée, ce qui favorisa le rapatriement des réfugiés en provenance de ce pays;

Début 2000, 500.000 Libériens et Léonais étaient toujours en Guinée, rassemblés dans les camps ou vivant des petites activités agricoles ou d'artisanat en dehors des camps;

Comme en septembre 2000, les attaques rebelles sévères s'étaient déroulées le long des frontières avec la Sierra Leone et le Libéria. Ce qui occasionna des pertes en vies humaines et matérielles et des mouvements des populations. Guékédou, Forécariah et Kindia sont parmi les villes les plus touchées pendant la guerre.

Selon les statistiques du Gouvernement, vers novembre 2002, on a dénombré 350.000 déplacés venant des zones frontalières.

Le HCR estimait le nombre de réfugiés à 192.000 en fin 2001. Durant le 2e semestre, les réfugiés ont été déplacés des frontières vers les sites à l'intérieur du pays. Au même moment une campagne de rapatriement volontaire pour des réfugiés Léonais était lancée dans les perspectives du processus électoral de mai 2002.

En Novembre 2002, les réfugiés se chiffraient à 90.000 et les déplacés à 82.000. Tout dernièrement, la Guinée a été Victime d'une épidémie de fièvre jaune en (début 2001) et des inondations en haute Guinée en Août – septembre 2002.

La succession de ces aléas a provoqué un important mouvement de populations à l'intérieur du pays. Cette situation a occasionné une forte dégradation de l'environnement naturel (Coupe abusive de bois par le biais des différentes activités socio- économiques des populations réfugiés, déplacées et des communautés ôtes) et de l'accessibilité des populations aux services sociaux de base (Education, Santé, Eau – Hygiène -Assainissement).

Dans le cadre de l'amélioration de ces conditions, la Guinée a bénéficié de l'appui du Gouvernement Japonais à travers le financement du projet de réhabilitation communautaire des Préfectures de Forécariah et Kindia.

Pour assurer la mise en œuvre de ce projet, le PNUD a recruté une équipe de dix personnes (voir composition au chapitre IV).

## **II- RESUME :**

Le présent rapport retrace les appuis apportés par le projet de réhabilitation communautaire de Forécariah et Kindia (PRCFK) aux populations de 10 communautés Rurales de développement des préfectures de Kindia et de Forécariah affectées par les conflits afin d'améliorer leur condition de vie.

Le PRCFK durant sa mise en œuvre a produit les résultats qui sont présentés dans le présent rapport.

Fondamentalement, la stratégie du projet a reposé sur la valorisation des ressources locales à travers l'implication des acteurs locaux (élus ; ONG, PME, services techniques déconcentrés de l'état et les bénéficiaires).

Les activités de l'équipe de projet ont été axées sur des programmes de travail conformes aux résultats attendus.

La mise en œuvre des activités du PRCFK a commencé par le reboisement de 200 ha d'essences forestières en raison du retard accusé pour le démarrage du projet en fin Juillet 2005.

Cette activité a été suivie par les études des infrastructures (écoles et postes de santé) dans un contexte assez difficile (manque d'équipements de travail dont les procédures d'achat ont connu un retard considérable).

Le présent rapport décrit de manière exhaustive l'ensemble des activités menées par le projet, les résultats atteints et les impacts directement mesurables.

## **III- BREF APERÇU DES OBJECTIFS ET RESULTATS DU PROJET**

Initié par le Gouvernement Guinéen, le PRCFK est financé par les fonds du Gouvernement japonais (Human Security Fund) dont la gestion est confiée au PNUD.

La tutelle du projet est assurée par le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation par le biais du Service National de l'Action Humanitaire (SENAH). Le Projet intervient dans deux préfectures : Forécariah et Kindia.

Le principal objectif de développement du projet est de contribuer à réduire la pauvreté des populations réfugiées, déplacées et des communautés hôtes dans les Préfectures de Forécariah et Kindia.

**Deux objectifs immédiats sont prévus :**

**Objectif immédiat 1 : répondre aux besoins des populations déplacées, réfugiées et des communautés hôtes en service sociaux de base par :**

- 1-1 La Construction et l'équipement de 8 postes de santé dotés d'énergie solaire ;
- 1-2 La Construction et l'équipement de 6 écoles primaires rurales ;
- 1-3 La Construction de 4 banques de céréales dans les zones productrices ;
- 1-4 La Construction d'une maison des jeunes à Farmoriah considéré comme centre principal de Pamelap ;
- 1-5 L'Amélioration du système de drainage des eaux de ruissellement à Farmoriah ;
- 1-6 Aménagement de 15 forages
- 1-7 Réhabilitation de 59 Km de piste.

**Objectif immédiat 2 : Réhabilitation et préservation de l'environnement naturel dans les zones sinistrées** à travers :

2-1- Le Reboisement de 200 Ha dans les zones sinistrées avec des essences forestières (acacia, Gmelina, le Tectona grandis etc) y compris l'initiation de 200 jeunes à la gestion des pépinières forestières;

2-2 - L'adoption et l'utilisation des foyers améliorés par 800 ménages et la formation de 800 femmes à la fabrication des foyers améliorés par les matériaux locaux ;.

La Sensibilisation et La formation des populations cibles sur la gestion durable des ressources naturelles (2000 personnes) :

2- 3- L'aménagement de 30 ha de bas-fonds

2-4- La vulgarisation de la prévention des maladies liées à l'environnement à travers la Radio Rurale auprès de 50% des populations;

**IV-COMPOSITION DE L'EQUIPE DU PROJET**

L'équipe de projet est constituée de 12 personnes dont :

- Un Expert National / Coordonnateur ;
- Une Expert National en développement communautaire ;
- Un Assistant Administratif - Financier
- Une Assistante Administrative - Secrétaire ;
- Deux Ingénieurs (Génie civil et rural) ;
- Deux Animatrices spécialistes en développement communautaires ;
- Deux Chauffeurs ;
- Deux Gardiens.

En raison des variations de coûts des activités entre 2001 et 2005, cette composition de l'équipe devait servir à réduire les coûts de fonctionnement du projet afin de réaliser le maximum de résultats sur le terrain.

Le recrutement de l'équipe de projet en mi- juillet 2005 a été suivi par une semaine de formation au siège du PNUD au cours de laquelle elle a procédé à l'élaboration du programme annuel et trimestriel de travail et à la compréhension des termes de référence.

**V - SITUATION DE REFERENCE AU DEMARRAGE DU PROJET**

Le démarrage du projet a eu lieu 3 ans environ après la période de formulation. Initié pour répondre aux besoins des populations réfugiées, déplacées et des communautés hôtes suite aux attaques rebelles le long des frontières (2000 et 2001), la mise en œuvre du projet commence en Août 2005 après le retour des réfugiés et des déplacés.

Il est important de noter que malgré ce retour officiel des réfugiés et déplacés, certains continuent de rester dans les zones d'accueil et mènent des activités économiques auprès des populations hôtes. Le traumatisme qu'ils ont connu pendant les atrocités ne les encourage plus à retourner chez eux.

Il est alors aisé de comprendre que le projet, loin d'être un projet d'urgence, sera exécuté comme projet de reconstruction en privilégiant les zones d'accueil. Ainsi, certaines activités seront délocalisées pour le respect des politiques sectorielles (cartes scolaires et sanitaires) et des priorités des communautés bénéficiaires.

Dans les principales zones d'intervention du projet, la situation de référence a été marquée par une quasi absence de structures de santé dans certains villages de Forécariah qui avaient reçu les populations déplacées (Dandayah, Maliguiagbé, Hérico etc), des infrastructures détruites à Simbarayah et Kolakhouré dans la Préfecture de Kindia.

La situation scolaire avait un visage assez triste dans certains villages comme Modia et Mafèrènyadi dans la CRD de Farmoriah ou alors à Salounfofo et Kolakhouré, dans la Préfecture de Kindia.

Cette situation est plus visible sur les images réalisées par l'équipe de projet lors de sa visite de prise de contact sur le terrain.

#### a)- PRISE DE CONTACT AVEC LES AUTORITES ET POPULATIONS BENEFICIAIRES

Cette prise de contact a débuté à Forécariah où l'équipe a pris part au conseil préfectoral qui s'est déroulé à Mafèrinyah les 25, 26 et 27 Juillet 2005.

A Kindia, la prise de contact a commencé par la présentation de l'équipe et du projet aux Autorités du Gouvernement par le Chargé de programme FENU/PNUD.

La Prise de contact avec les autorités Préfectorales à Kindia a été suivie par une tournée de présentation du projet aux élus et populations des zones cibles.

L'équipe de projet, en compagnie d'un représentant de la Préfecture s'est rendue dans les CRD de Madina Woula (Districts de Simbarayah, et Kolakhouré), Souguéta (Districts de Bourounforè) et Kolenten (Districts de Saloum Fofò).

L'étape de Kindia a pris fin par une réunion de synthèse avec l'autorité Préfectorale, les services techniques préfectoraux et les autres intervenants le 05 Août 2005 sous la présidence du Secrétaire Général chargé des collectivités. Il faut noter que cette étape a été marquée par les situations particulières des infrastructures existantes à Kolakhouré et à Simbarayah comme indiquées sur les images ci-dessous :



*Le poste de santé de Simbarayah dans le salon de l'agent de santé*




*Vue d'ensemble du poste de santé de Kolakhouré :*

- La porte fermée est celle du poste de santé non fonctionnel depuis la rébellion
- Le second appartement initialement prévu pour logement du chef de poste de santé est actuellement occupé par les agents de sécurité



*Vue de face de l'école primaire de Kolakhouré*

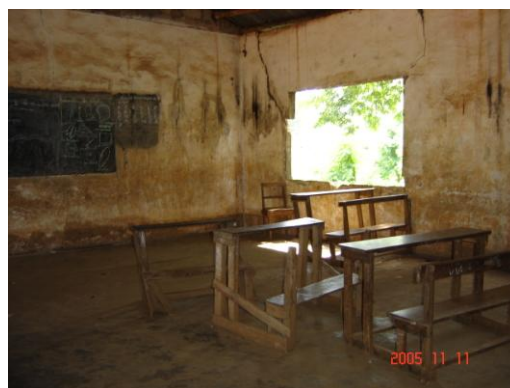

*Vue de la salle de classe*

Du 08 qu 12 Août 2005, l'équipe de projet a sillonné les CRD de Farmoriah, Benty, Kaliah, Moussayah, Sikhourou, Allassoyah, Mafèrinyah et Kabak pour présenter le projet aux élus et populations bénéficiaires de Forécariah.

Dans la Préfecture de Forécariah, les situations suivantes ont retenu l'attention de l'équipe (voir images ci-dessous)



*Une vue d'ensemble de l'école Primaire de Modia dans la CRD de Farmoriah*



*UNE SALLE DE CLASSE A MAFERENYADI (CRD FARMORIAH)*

Trois salles de classe seront bientôt réalisées sur ce site de Modia par le projet. Ces trois salles de classe sont délocalisées à Tamagalidy qui ne correspond pas à la carte scolaire.



*Une salle de classe à Modia*



*Une autre salle de classe de 28 élèves à Modia*

Ces images sont largement représentatives de la situation de référence du projet. Les activités du projet ont permis d'améliorer cette situation en dotant les communautés d'infrastructures et de structures de gestion communautaires capables d'assurer la préservation des acquis.

Les différentes prises de contact ont permis à l'équipe de rencontrer environ 900 personnes (autorités locales, élus et autres populations bénéficiaires des zones cibles).

NB : Au cours des réunions de synthèse des visites de sites dans les deux Préfectures, une délocalisation de certaines infrastructures s'est avérée indispensable pour les raisons suivantes :

- Soit parce que les infrastructures ont été déjà réalisées sur ces sites ;
- Soit parce que ces infrastructures programmées en situation d'urgence ne correspondent pas aux cartes scolaires et sanitaires ;

(Voir tableau suivant)

**b)-TABLEAU DE DÉLOCALISATION DES INFRASTRUCTURES**

PREFECTURES	ECOLES PRIMAIRES		POSTE DE SANTÉ		PISTES		FORAGES	
	Prévues	Retenues	Prévus	Retenus	Prévues	Retenues	Prévus	Retenus
FORECA RIAH	Mafèrènyadi	Pamelap	Sory Woula	Hérico	Sory Wou-la	Kondékhouré	Mafèrènyadi 2 forages	1 forage
	Tamagalidy	Modia	Mafèrènyadi	Démbayah			Gbérika 2 forages	1 forage
							Fèndèmodiah 0 forages	Fèndèmodiah 1 forage
KINDIA	Bourou nforè	Saloum Fofa	Saloum Fofa	Simbarayah				

Le reste des infrastructures est sans changement. Les délocalisations ont fait l'objet de document de justification de la part des services techniques ou des CRD concernées.

## **VI - ACTIVITES REALISEES ET RESULTATS ATTEINTS PAR LE PROJET**

**Objectif immédiat 1 : répondre aux besoins des populations déplacées, réfugiées et des communautés hôtes en service sociaux de base par :**

1-1 Construction et équipement de 8 postes de santé dotés d'énergie solaire ;

Les 8 postes de santé ont été implantés en fin d'année 2005.

De nos jours, ces infrastructures sont entièrement terminées, réceptionnées et fonctionnelles comme indiquent les images ci-dessous.



*Le poste de santé de Simbarayah dans la CRD de Madina Woula et ses latrines*

1-2 Construction et équipement de 6 écoles primaires rurales ;

Les 6 écoles primaires rurales sont entièrement réceptionnées et fonctionnelles.

Ainsi, les cases rondes de Modia sont aujourd'hui remplacées par une infrastructure de trois salles de classe en dur, l'école de Mafèrènyadi dotée de table banc, Kolakhouré et Salounfofo sont également dotés d'école de trois salles de classe chacun.



*L'école primaire de Saloun Fofo CRD Kolenten*





*Trois salles de classe à la place des trois cases rondes de Modia*

Auprès de chaque école il a été installé et formé une Association des parents d'élèves (APEAE) responsable de l'entretien et de la maintenance de l'infrastructure, des équipements et de la mobilisation sociale des parents autour de l'école.

1-3 - Construction de 4 banques de céréales dans les zones productrices ;

Les quatre banques de céréales sont terminées et mises à la disposition de quatre Comités de Gestion des banques de Céréales (COGEBAC).

Les COGEBAC sont des structures qui gèrent les banques de céréales sous la responsabilité des Unions des organisations paysannes évoluant dans chaque District bénéficiaire. Ces structures fonctionnent avec des outils de gestion mis à disposition par le projet.



*La banque de céréales de Tonkoyah  
(CRD Allassoyah)*

1-4 - Construction d'une maison des jeunes à Farmoriah considéré comme centre principal de Pamelap ;

Pour réaliser le centre culturel de Farmoriah, le projet a d'abord identifié les organisations de jeunesse existant dans la CRD (une quarantaine environ). Ces organisations ont été regroupées autour de trois structures qui ont la responsabilité partagée dans la gestion du centre culturel placé sous la tutelle de la CRD qui assure la prise en charge du salaire du Directeur recruté sur le tas après un appel à candidature.

Le centre culturel est équipé de mobiliers et d'énergie solaire. Cependant, la jeunesse continue de réclamer le matériel audio-visuel que le projet n'a pas pu fournir.



### *Une vue d'ensemble du centre culturel*

Les trois structures de gestion conformément à l'Arrêté du Ministère de tutelle.

- Un Comité d'Animation ;
- Un Directeur du centre recruté et pris en charge par le budget de la CRD ;
- Un comité Directeur composé de représentants des Associations, du conseil communautaire et de la Direction Sous-préfectorale de la Jeunesse ;

Ces structures sont formées et sensibilisées sur leurs rôles et leurs responsabilités.

#### 1-5 - Amélioration du système de drainage des eaux de ruissellement à Farmoriah ;

En raison de la forte dégradation de la situation monétaire du pays entre 2001 et 2005, le système de drainage de Farmoriah n'a pu être réalisé par le projet.

#### 1-6 - Aménagement de 15 forages

Les études techniques de réalisation et le dossier d'appel d'offres des forages ont été réalisés par le projet.

A la suite du lancement de l'avis d'appel d'offres, les propositions reçues ont coûtées le triple de l'enveloppe disponible ; ce qui a valu l'abandon des forages au profit des pistes rurales.

#### 1-7- Réhabilitation de 59 Km de piste.

Les pistes ont été réparties en deux catégories :

- a)- Les pistes à travailler en HIMO (Gbéréyiré, Maliguiabori et Kolayiré), soit au total 18 km
- Ces trois pistes sont entièrement terminées et opérationnelles à la satisfaction des populations.



*La piste de Kolayiré travaillée en HIMO par les réfugiés et les populations hôtes*

*(Mr Carlos H. BARRY, Chargé de Programme PNUD/FENU, entretenant une réfugiée à la tâche sur la piste de Kolayiré, CRD Kaliah)*

b)- Les pistes en travaux mécanisés (Kondékhouré, Gbérika et Bourounforè):

Les travaux des pistes de Kondékhouré et de Gbérika (6 et 15 km) sont réalisés à 100% et entièrement payés. Cependant, sur celle de Bourounforè (20 km), l'ensemble des ouvrages de franchissement ont été réalisés. Malheureusement, les fonds restants ne pouvaient plus couvrir les travaux de reprofilage et d'ouverture des canaux d'évacuation de la piste.

**Objectif immédiat 2 : Réhabilitation et préservation de l'environnement naturel dans les zones sinistrés:**

2-1- Le Reboisement de 200 Ha dans les zones dégradées avec des essences forestières (acacia, Gmelina, le Tectona grandis etc);

Les activités de terrain du projet ont débuté avec le lancement du processus de reboisement dont la campagne était déjà en cours.

Pour mener cette activité, la fourniture des plants a été assurée par une PME locale recrutée à cet effet tandis que l'encadrement des populations a été confié aux services techniques des eaux et forêts des deux Préfectures.

L'équipe de projet était chargée d'assurer la supervision des opérations et la sensibilisation des communautés.



*Une reprise de jeune plant dans les 40 ha reboisés à Simbarayah (CRD Madina Oula), Préfecture Kindia*

## 2- 1 - Résultats du reboisement

### a. Préfecture de Kindia

Sous préfecture	Sites	Essences forestières			Fruitiers				SuP. (ha)
		Gmelina	Teck	A.mang	Oranger greffé	Citronnier greffé	Mang greffé	Palmier nain	
Madina Oula	Simbaraya	30000	20000	5000	200	300	150	400	30
	Baadè Kanty	-	12500	7500	200	100	50	100	10
Kolentén	K. Centre	14600	11000	11900	320	320	100	170	20
Sougueta	Konkouyéya	25400	24000	25600	450	400	150	500	40
	<b>TOTAL</b>	<b>70000</b>	<b>67500</b>	<b>50000</b>	<b>1170</b>	<b>1120</b>	<b>450</b>	<b>1170</b>	<b>100</b>

A Kindia, la superficie reboisée est de 100 hectares c'est-à-dire 100 %



*Une zone reboisée à Simbarayah (2006)*

**b- Préfecture de Forecariah**

Sous préfecture	Sites	Essences forestières				Fruitiers				
		Gmelina N+scht	Terminalia	Teck Nu+scht	A.mang	Oranger greffé	Citronnier,	Mang greffé	Palmier nain	Clémentine
BENTY	Morkania et Dakhagbé	0	1000	8700	15000	489	161	70	115	140
Farmoriah (Pamelap)	Mafèrenyady	7310	0	21178	20000	545	316	90	145	135
	Petit Lori									
Kaliah	Kaliah centre	1680	4000	13362	15000	300	550	50	70	50
	Bérika	0	0	60000		250	300	50	100	49
	Bokariah	2540		7760	5000	174	0	40	74	47
	<b>TOTAL</b>	<b>11530</b>	<b>5000</b>	<b>111000</b>	<b>55000</b>	<b>1758</b>	<b>1327</b>	<b>300</b>	<b>504</b>	<b>412</b>

Légende

Teck = tectona grandis

**N+SCHT**= racines nues et en sachets

A. mang = acacia mangium

A Forécariah, la superficie reboisée est de 100 hectares c'est-à-dire 100% dont 20% en essences fruitières.

Dans le but de favoriser la préservation des zones reboisées, et de promouvoir l'intéressement des populations aux activités, le projet a octroyé des essences fruitières.

Au cours de l'année 2006, les 200 ha ont été regarnis pour remplacer les plants détruits par les intempéries. Ces travaux de regarnissage ont été menés dans le même schéma que le reboisement, des comités de gestion sont installés et formés pour leur préservation sur les 5 sites de Forécariah et 4 à Kindia

## 2-2 - L'adoption et l'utilisation des foyers améliorés par 800 ménages et la formation de 800 femmes à la fabrication des foyers améliorés par les matériaux locaux ;

Cette activité a été confiée à une ONG recrutée dont le contrat regroupait les activités suivantes :

- L'adoption et l'utilisation des foyers améliorés par 800 ménages et la formation de 800 femmes à la fabrication des foyers améliorés par les matériaux locaux ;
- Sensibilisation et formation de 2000 personnes sur la gestion durable des ressources naturelles ;
- L'initiation de 200 jeunes à la gestion des pépinières ;
- La Sensibilisation et La formation des populations cibles sur la gestion durable des ressources naturelles (2000 personnes) ;

Cette ONG a entièrement fini ses activités sur le terrain et le rapport a été déposé en trois copies indiquant les résultats qui sont portés dans les produits du projet.

## 2- 3- L'aménagement de 30 ha de bas-fonds

Cette activité, à cause de la dévaluation de la monnaie locale n'a pu être réalisée.

## 2-4- 50% des populations des zones cibles ont une connaissance des méthodes de prévention des maladies liées à l'environnement

Pour mener cette activité, le projet a signé une convention avec la **radio rurale** de Kindia. La mise en œuvre des clauses de cette convention a permis de réaliser :

- Dix huit (**18**) magazines et une dizaine de jeux publics sont réalisés sur **la prévention des maladies liées à l'environnement**
- Trois grands thèmes ont été développés (**Environnement, Santé et Éducation**).
- **Dix huit sous thèmes** ont été développés dans **9 villages** de Forécariah et **9 villages** de Kindia.

**NB** : Ces activités ont mobilisé environ **1500** personnes et les **rediffusions** continuent.

## VII- PRODUITS DU PROJET ET LECONS APPRISES

La mise en œuvre du projet a eu des effets positifs sur la population. Ces effets peuvent être mesurés par les impacts directs dont entre autres :

- - **45** Emplois permanents et **391** emplois temporaires ont été créés ;
- - **737** femmes sont formées à la fabrication des foyers améliorés ;
- - **1627** Personnes formées à la gestion durable de l'environnement ;
- - **24** Villages dont 13 à Forécariah touchés par les formations ;
- - **22** Plans de gestion des ressources naturelles élaborés dans **22** villages ;
- - **22** Comités de gestion des forêts communautaires formés (environ **198** personnes) ;
- - Une amélioration sensible du taux de scolarisation et de couverture sanitaire dans les deux Préfectures ;
- - La restauration de l'environnement naturel des zones reboisées ;
- - Environ **80%** des populations touchées par la radio rurale connaissent la prévention des maladies liées à l'environnement ;

- Une amélioration de la conservation des vaccins et autres poches de sang à Forécariah par la dotation de la DPS et de l'hôpital Préfectoral en réfrigérateurs solaires;
- -Une amélioration de la production locale par le désenclavement des zones de production et la mise à disposition des moyens de stockages et de conservation des produits agricoles ;
- - L'amélioration de l'encadrement des jeunes et le développement des arts dans la CRD de Farmoriah à travers les Associations de jeunes affiliées au centre culturel ;
- Le poste de santé de Gbérika équipé d'énergie solaire ;
- **8** comités de suivi des postes de santé installés ;
- **9** Comités de gestion des forêts communautaires installés et formés ;
- **6** APEAE installées et formées ;
- **810** enfants installés dans des salles de classe bien équipées étudient dans de meilleures conditions
- **500** tonnes peuvent être stockées par banque
- Les membres de 45 organisations paysannes sont formés à la gestion d'une banque de céréales à travers 4 comités de gestion des banques (COGEBAC) ;
- **50** Associations de jeunesse de la CRD de Farmoriah affiliées au centre culturel et trois structures de gestion installées ;
- La CRD prend en charge des frais récurrents liés au fonctionnement du centre culturel ;
- **18** villages touchés par la sensibilisation sur la prévention des maladies liées à l'environnement.
- Les séances de sensibilisation ont mobilisé environ **1500** personnes autour de 3 thèmes principaux (Education, Santé et Environnement).

## **VIII-Les LECONS APPRISES**

- 1 - Le PRCFK (projet d'urgence) a été formulé en 2001 suite aux attaques rebelles le long des frontières de la Guinée du Sud et du Sud-est. En raison des difficultés de mobilisation des fonds, la mise en œuvre n'a débuté qu'en fin Juillet 2005.

Ce décalage a eu pour conséquence :

- Une modification de la localisation de certaines infrastructures à cause du fait que les populations déplacées pour lesquelles elles étaient prévues sont retournées chez elles ;
- Une variation négative des coûts initiaux qui n'était plus favorable à la réalisation de toutes les prévisions (les forages, l'aménagement de bas-fonds et l'assainissement de Farmoriah n'ont pu être exécutés) ;

### **Leçon No 1 :**

1. Les résultats inscrits dans un projet et les priorités des bénéficiaires peuvent être altérés par le temps entre sa formulation et son exécution.

2 - Les populations bénéficiaires des travaux de pistes en HIMO (Gbéréyiré, Maliguiafori et Kolayiré dans la Préfecture de Forécariah) n'ont pas accepté de participer aux travaux pour des raisons multiples :

- Le traitement proposé par l'entreprise ne répond pas à leurs attentes ; c'est peut être inférieur à ce qui est prévu par le projet (Maliguiafori) ;
- Ils n'ont pas coutume de travailler leur piste à la main, ils préfèrent la machine (Gbéréyiré) ;
- Cette situation pourrait rendre difficile les entretiens futurs.

### Leçon No 2:

1. Malgré les avantages liés au HIMO, il n'est pas toujours adapté à toutes les communautés ; son adoption doit se faire en rapport avec les bénéficiaires et les meilleurs résultats sont obtenus lorsqu'ils sont responsabilisés à la gestion des fonds avec un encadrement technique.

- 2 - Le District de Modia dans la CRD de Farmoriah, Préfecture de Forécariah, pour répondre au besoin de scolarisation de ses enfants a construit trois paillotes et recruté des enseignants pour encadrer les classes. La construction d'une école de trois classes était réellement une priorité pour ce District.

De nos jours, le District de Modia dispose d'une belle infrastructure de trois classes grâce au PRCFK à la suite des délocalisations provoquées par le retour des déplacés. Cette école qui cadre avec les priorités de la communauté est l'une des mieux tenues du projet et toutes les occasions sont mises à profit par cette communauté pour démontrer son adhésion et sa joie ;

### Leçon No 3 :

L'adhésion de la population à une activité de développement est proportionnelle à la satisfaction d'un besoin ressenti par elle.



## **IX - CONCLUSION ET SUGGESTIONS**

La mise en œuvre du projet a eu une incidence positive sur les communautés bénéficiaires en se fiant aux réactions de leurs représentants au cours de l'atelier sur la gestion des infrastructures tenu les 14 et 15 Décembre 2006 à Kindia.

Pour favoriser la réinstallation des populations dans leurs localités d'origine, les Autorités locales souhaitent que les activités du projet PRCFK soient élargies aux zones qui ont subi les attaques rebelles (CRD Madina Oula, Sikhourou, Moussayah et Benty).

Dans le souci de favoriser l'atteinte des objectifs d'un TTF, il serait souhaitable de planifier le processus de recrutement du personnel et d'achat des équipements (véhicules et autres matériels informatiques) pour faire coïncider leur disponibilité avec la date de début du projet.

Les recommandations suivantes sont nécessaires à la pérennisation des acquis du projet :

- La poursuite du renforcement des capacités des comités de suivi, du personnel et l'approvisionnement en médicaments et matériels médical
- Encourager l'intégration des enseignants contractuels dans la fonction publique
- Poursuivre la négociation des formations des structures de gestion, la fourniture de palettes et des produits phytosanitaires aux banques de céréales avec le concours de l'ONG AIDE-ACTION évoluant sur le terrain ;

Toutes ces recommandations devront s'appuyer sur un engagement des Services techniques Préfectoraux de tutelle à assurer un encadrement régulier des structures de gestion mise en place par le projet.

# **ANNEXES**

## 1- SYNTHÈSE DU RAPPORT DE CLÔTURE DU PROJET

### PREVISIONS, REALISATIONS, RESULTATS ET IMPACTS DU PROJET

PREVISIONS			REALISATIONS		OBSERVATIONS
OBJECTIFS IMMEDIATS	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS	RESULTATS	INDICATEURS	
répondre aux besoins des populations déplacées, réfugiées et des communautés hôtes en services sociaux de base	1- Huit postes de santé sont construits et équipés d'énergie solaire	<p>1- Création de 24 emplois</p> <p>2- Réduction de 5% de la morbidité et de la mortalité</p> <p>3- taux de vaccination accru à 95%</p> <p>4- Amélioration de la capacité de conservation des médicaments</p> <p>4-- Le poste de santé de Bérika est équipé d'énergie solaire</p>	<b>Huit (8) postes de santé équipés d'énergie solaire sont réalisés</b>	<p>1-Sept (6) PME locales ont été recrutées</p> <p>2-16 emplois sont créés (1 Gardien et 1 agent par poste de santé)</p> <p>3- Deux réfrigérateurs Solaires sont installés (DPS et Hôpital)</p> <p>4- Le poste de santé de Bérika est équipé d'énergie solaire</p> <p>5- 192 emplois temporaires ont été créés</p>	<p>1- Le fonctionnement correct des postes de santé permettra d'améliorer le taux de vaccination et l'accessibilité des femmes au service de planning familial</p> <p>2- La prise en charge des gardiens et de la maintenance est assurée par les communautés bénéficiaires</p> <p>3- 6 agents de santé sur 8 sont déjà disponibles dont 2 /2 à Kindia</p>

					Grâce à la CCF / Guinée (une ONG)
PREVISIONS			REALISATIONS		OBSERVATIONS
OBJECTIFS IMMEDIATS	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS	RESULTATS	INDICATEURS	
<b>répondre aux besoins des populations déplacées, réfugiées et des communautés hôtes en services sociaux de base</b>	2 – Six écoles primaires de 3 classes et 8 latrines sont construites dans 6 Villages dont 4 villages à Forécariah et 2 villages à Kindia	<b>1-</b> Dix huit (18) emplois sont créés <b>2-</b> Neuf cent (900) enfants ruraux sont scolarisés <b>3-</b> Le taux de scolarisation passe de 68% à 70% <b>4-</b> Amélioration de la parité filles - garçons	<b>1-Six écoles primaires rurales et six latrines sont construites et équipées</b> <b>2- L'école primaire de 4 classes à Mafèrènyadi (Pamelap) réalisée par la FONDIS est équipée par le projet</b>	<b>1-</b> Sept (6) PME locales ont été recrutées <b>2-</b> 22 emplois d'enseignants sont créés <b>3- 810</b> enfants sont scolarisés à l'ouverture <b>4-</b> La parité filles – garçon est améliorée <b>5-</b> Le taux de scolarisation est amélioré	<b>1-</b> Le fonctionnement correct des écoles permet d'améliorer le taux de scolarisation et la parité fille -garçon <b>2-</b> La prise en charge de la maintenance est assurée par les communautés bénéficiaires à travers les APEAE.

PREVISIONS			REALISATIONS		OBSERVATIONS
OBJECTIFS IMMEDIATS	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS	RESULTATS	INDICATEURS	
<b>Répondre aux besoins des populations déplacées, réfugiées et des communautés hôtes en services sociaux de base</b>	3 – Quatre (4) banques de céréales sont construites dans les districts de Gbéréyiré, Mabala, Tonkoyah et Kaback	<b>1-</b> 500 tonnes de céréales sont stockés par banque	<b>1-Quatre (4) banques de céréales sont construites dans les districts cibles</b>	<b>1-</b> Quatre structures de gestion regroupant 40 groupements sont installées <b>2-</b> Quatre (4) PME locales ont été sélectionnées 3 – 55 emplois temporaires et 8 emplois permanents ont été créés	<b>1-</b> Les structures de gestion issues des organisations paysannes sont formées et suivies afin de leur donner la capacité de stocker 500 tonnes de céréales par banque sur la base de la production locale

PREVISIONS			REALISATIONS		OBSERVATIONS
OBJECTIFS IMMEDIATS	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS	RESULTATS	INDICATEURS	
répondre aux besoins des populations déplacées, réfugiées et des communautés hôtes en services sociaux de base	4 – Un (1) centre culturel est construit à Farmoriah considéré comme centre principal de Pamelap	1- Développement des arts et de la culture locale 2- Réduction de l'exode rurale de la population productive	1- Un (1) centre culturel est construit à Farmoriah considéré comme centre principal de Pamelap	1 Une PME locale a été sélectionnée 2- 40 emplois temporaires et 4 emplois permanents ont été créés 3- Trois structures de gestion et d'animation sont installées par le projet	1- Les structures de gestion sont issues des organisations de jeunesse 2- La mise en œuvre de tout le processus a été faite en rapport avec la Direction Préfectorale de la Jeunesse (DPJ) et le conseil communautaire de Farmoriah

PREVISIONS			REALISATIONS		OBSERVATIONS
OBJECTIFS IMMEDIATS	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS	RESULTATS	INDICATEURS	
<p><b>1- répondre aux besoins des populations déplacées, réfugiées et des communautés hôtes en services sociaux de base</b></p>	<p><b>1-5- 59 km de pistes sont réhabilités</b></p>	<p>1- 24 Villages sont désenclavés  2- Le drainages des produits est amélioré  3- 15 comités villageois sont installés pour l'entretien des pistes</p>	<p><b>-16 km sont réhabilités en HIMO</b>  <b>-Les Pistes en travaux mécanisés (43 km) sont exécutées à 90%</b></p>	<p>3 Districts sont désenclavés (Maliguiaforti, Kolayiré et Gbéréyiré) et une dizaine de villages sont desservis</p>	<p>Les pistes en HIMO sont presque terminées (environ 12 km) à Forécariah.  -23 km entièrement reprofilés avec des ouvrages de franchissement  -les ouvrages de franchissement réalisés sur 20 km ;  - Les fonds disponibles ne peuvent pas supporter le coût</p>

PREVISIONS			REALISATIONS		OBSERVATIONS
OBJECTIFS IMMEDIATS	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS	RESULTATS	INDICATEURS	
<p><b>1- répondre aux besoins des populations déplacées, réfugiées et des communautés hôtes en services sociaux de base</b></p>	<p><b>1-6- 15</b> Forages sont installés dans 13 villages</p>	<p>1-Réduction des maladies hydriques de 25% 2-80% des populations ont accès à l'eau potable</p>	<p><b>Non exécuté</b></p>	<p><b>Non exécuté</b></p>	<p>A cause de la dévaluation de la monnaie locale, les fonds disponibles ne peuvent pas supporter le coût</p>



PREVISIONS			REALISATIONS		OBSERVATIONS
OBJECTIFS IMMEDIATS	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS	RESULTATS	INDICATEURS	
<p><b>1- répondre aux besoins des populations déplacées, réfugiées et des communautés hôtes en services sociaux de base</b></p>	<p><b>1-7- Un système de drainage des eaux de pluies est installé à Farmoriah</b></p>	<p>1-Réduction des infections</p> <p>2-Réduction des maladies endémiques (malaria)</p>	<p><b>Non exécuté</b> (Etudes techniques réalisées)</p>	<p><b>Non exécuté</b> (Etudes techniques réalisées)</p>	<p>Les fonds disponibles ne peuvent pas supporter le coût</p>

PREVISIONS			REALISATIONS		OBSERVATIONS
OBJECTIFS IMMEDIATS	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS	RESULTATS	INDICATEURS	
<b>2-Réhabilitation et préservation de l'environnement naturel</b>	<b>2 -1 - 200</b> ha de terre sont reboisés	1-200 jeunes sont initiés à la gestion des pépinières 2- 2000 personnes sont formées à la gestion durable l'environnement	<b>1- Deux cent (200) ha sont reboisés dont 100 ha à Forécariah et 100 ha à Kindia-</b>	1- <b>364</b> jeunes sont initiés à la gestion des pépinières dont 156 à Kindia 2- <b>1627</b> personnes sont formées à la gestion durable de l'environnement dont <b>821</b> à Kindia 3- <b>737</b> femmes sont formées à la fabrication des foyers améliorés dont 402 à Kindia 4- Environ <b>200</b> personnes sont formées au mécanisme d'entretien des plantations dont <b>68</b> à Kindia 5- <b>9</b> plans de gestion sont disponibles	

PREVISIONS			REALISATIONS		OBSERVATIONS
OBJECTIFS IMMEDIATS	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS	RESULTATS	INDICATEURS	
<b>2-Réhabilitation et préservation de l'environnement naturel</b>	2 -3-30 ha de bas-fonds sont aménagés dont 15 à Kindia et 15 à Forécariah.	30% des populations déplacées ont accès à la terre aménagée pour leurs activités agricoles	<b>Non exécuté</b> (DAO réalisé)	<b>Non exécuté</b> (DAO réalisé)	A cause de la dévaluation de la monnaie locale, les fonds disponibles ne peuvent pas supporter les coûts

PREVISIONS			REALISATIONS		OBSERVATIONS
OBJECTIFS IMMEDIATS	RESULTATS ATTENDUS	INDICATEURS	RESULTATS	INDICATEURS	
<b>2-Réhabilitation et préservation de l'environnement naturel</b>	2 -3-50% des populations des zones cibles ont une connaissance des méthodes de prévention des maladies liées à l'environnement.	1- 80% des personnes touchées savent les moyens de prévention des maladies liées à l'environnement	<b>1- Dix huit (18) magazines sont réalisés par la Radio rurale sur la prévention des maladies liées à l'environnement.</b>	1- Environ <b>1500</b> personnes ont participé à la réalisation de ces magazines dans <b>12</b> villages 2- Les diffusions et rediffusions des émissions ont touché environ les <b>80%</b> des populations cibles	Les rediffusions continuent sur les antennes de la Radio Rurale de la Région

**TABLEAU DU NIVEAU D'EXECUTION DES INFRASTRUCTURES**

N°	PME	Lot	Site	Infrastructures	Date implantation	avancement	
						For site	Moyenne
1	Korodou	1	Kolakhouré	schools	04/02/2006	100 %	100 %
2	Korodou	1	Kolakhouré	health centers	04/02/2006	100 %	100 %
3	EKC	2	Simbaraya	health centers	20/12/2005	100 %	100 %
4	EKC	2	Salounfofo	schools	29/12/2005	100 %	100 %
5	ECG	3	Dandaya	health centers	14/12/2005	100 %	100 %
6	ECG	3	Gbéréyiré	schools	14/12/2005	100 %	100 %
7	AFRICOM	4	Modia	schools	30/12/2005	100 %	100 %
8	AFRICOM	4	Herico	health centers	30/12/2005	100 %	100 %
9	YOUL&	5	Gbérika	schools	13/12/2005	100 %	100 %
10	FRERE YOUL& FRERE	5	Dembaya	health centers	13/12/2005	100 %	100 %
11	UCB – GC	6	Pamelap	schools	27/12/2005	100 %	100 %
12	UCB – GC	6	Howouro	health centers	27/12/2005	100 %	100 %
13	RAKA C.	7	Maliguiagbé	health centers	08/12/2005	100 %	100 %
14	RAKA C.	7	Mabala	health centers	22/12/2005	100 %	100 %
15	RAKA C.	8	Farmoriah	cultural center	2006	100%	100%

**2- QUELQUES IMAGES DE TERRAIN REALISEES PENDANT LA MISE EN  
ŒUVRE DU PROJET**

**CEREMONIES DE POSE DE LA 1<sup>ère</sup> PIERRE DU CENTRE CULTUREL DE  
FARMORIAH**



**Le Préfet de Forécariah**



**Les notables de Farmoriah**



**Les femmes de Farmoriah**



**Les jeunes de Farmoriah à l'arrière plan**



**Le préfet procède à la pose de la 1<sup>ère</sup> pierre du centre culturel**



*De gauche à droite, le Préfet de Forécariah, le Directeur de cabinet du Gouvernorat, le DPS de Kindia et Le Coordonnateur lors de la cérémonie*



*Une danse folklorique à la veille de la cérémonie*



*Les femmes de Simbarayah lors de cérémonie*



*Les populations de La Simbarayah Attendent de recevoir la délégation*



*Réunion communautaire de Tonkoyah sur la Banque de céréales*







*Une vue de la séance de mise en place  
Du comité à Mabala.*



*Une vue de  
Mabala sur les  
zones de Production  
céréalière.*



*L'équipe de consultants à gauche,  
les deux Ingénieurs du PRCFK à droite  
et le rapporteur du CCBA au milieu  
pour l'analyse des offres*



*Le comité d'analyse des  
offres au siège du  
PRCFK*



*Implantation de l'école et du poste de santé de Kolakhouré*



*Installation du comité de gestion A Kolakhouré (Kindia)*



*Séance de Diagnostic Participatif (DP) sur la réalisation d'une banque De céréales à Kaback*



**Quelques images de sensibilisation sur le terrain**



**Des séances de travail de l'équipe de projet sur le terrain**



**Les Chargés de Programmes du PNUD accompagnent le projet sur le terrain**



**Le Coordonnateur lors des réceptions définitives des infrastructures**



**Lancement des travaux de la piste  
De Kondéhouré (Forécariah)**



**Une école de trois salles de classe**

**QUELQUES INFRASTRUCTURES REALISEES PAR LE PROJET**



*Latrine et poste de santé de Mabala lors de la réception technique du  
05/04/06*



*Poste de santé de Maliguiagbé*



*Poste de santé de Simbaraya  
(Kindia)*



*Ecole primaire rurale de Saloun Fofu (Kindia)*

Cette image présente l'enthousiasme des populations de Saloun Fofu à recevoir pour la première fois leur école primaire de trois classes.



*Latrines du poste de santé de Simbarayah (Kindia)*



**Le Centre culturel entièrement équipé de mobiliers et de panneaux solaires**

**QUELQUES IMAGES DES CEREMONIES DE REMISE DES INFRASTRUCTURES**



*Mr L'Ambassadeur du Japon en compagnie de Madame le Représentant Résident du PNUD en Guinée, du Préfet de Forécariah et leurs principaux collaborateurs reçus en cours de route dans le*

*District de Modia, CRD Farmoriah (bénéficiaire d'une école de trois classes qui remplace trois paillotes).*



La délégation à leur arrivée à Pamelap pour les cérémonies de remise



Les Hotes dans une salle de classe



La tribune officielle installée pour la circonstance



Mr l'Ambassadeur du Japon et Madame le Représentant du PNUD plantent des arbres symboliques.



*Allocution de bienvenu du Préfet de Forécariah*



*Madame le Représentant du PNUD et Mr l'ambassadeur du Japo*



*Madame la Directrice Nationale Adjointe du SENAH*

*Une inauguration symbolique*
