

# 16/6: Lancement d'un processus de rehabilitation

**16/6**  
**Comité de Pilotage**



Introduction des membres du Comité de Pilotage

Présentation de membres PMU 16/6

Mise à jour sur le progrès, des questions et des risques

Présentation du Champ de Mars et de la révision de certains indicateurs

Accords



...

# 16/6



## Comité de Pilotage

Introduction des membres du Comité de Pilotage

Présentation de membres PMU 16/6

Mise à jour sur le progrès, des questions et des risques

Présentation du Champs de Mars et de la révision de certains indicateurs

Accords



# Comité de Pilotage

## [ Gouv. Local |

- Claire Lydie Parent  
Mairesse de Petion Ville
- Jean Yves Jason  
Maire de Port-au-Prince
- Frantz Theodate  
Maire de Tabarre
- Jean Bernard Chassagne  
Maire Adjoint de Tabarre

Gouv. Nat. |  
Patrick Rouzier  
Conseiller à la  
Presidence

ONU ]  
Nigel Fisher  
Coordonateur Nations Unies

## Observers

- Harry Adam, Directeur Executif UCLBP
- Jessica Faieta, Directrice Principale PNUD
- Brien Treacy, Operations Centre Director UNOPS
- Luca Dall'Oglio, Chief de Mission, IOM
- Antonio Cruciani, Representant BIT
- Dominique Rosetti, Directeur Executif Agence Canadienne de Developpment International
- Jean Christophe Adrian, Representant Pays ONU-HABITAT
- Eduard Tschan : Representant Pays FICR

UCLBP

Batiments  
Publics

Logement

Relogement  
Relocalisation

PMU

Communication  
Gouvernement

Surveillance  
et Gestion de la  
Catastrophe

Camps  
OIM

Reparation  
Reconstruction  
UNOPS

Rehabilitation  
PNUD

Plan de  
Prevention  
de Risques

Planification  
Communautaire

Plateformes  
Communautaires

Investissements  
publics

Activites  
Generatrices  
revenu

Communication  
OIM



u de  
ention  
isques

Planification  
Communautaire


Plateformes  
Communautaires

Investissements  
publics

Activité  
Génératrice  
de revenus

# Zone de intervention

16/6 → 8/4 → 8/5 → 8/6 → 10/7  
78MM 30MM IFRC SAVINGS C&M

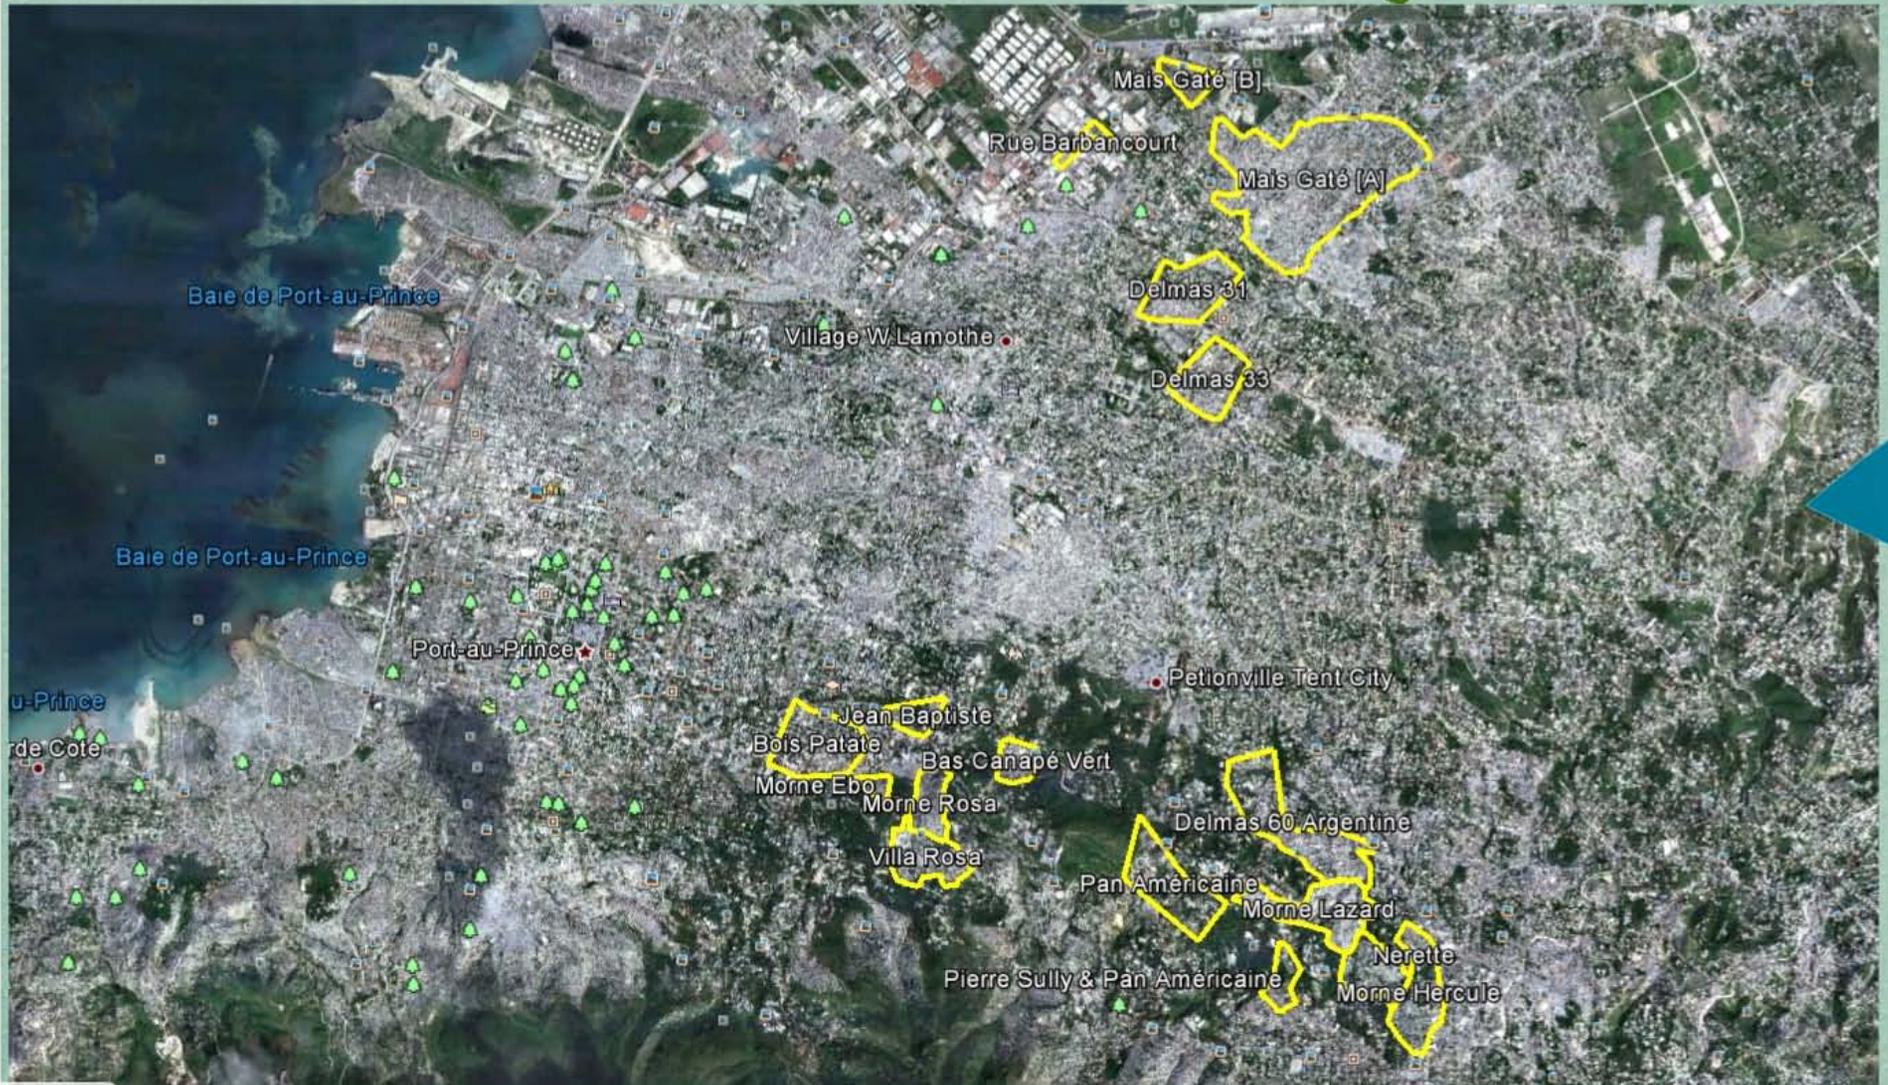




### Enjeux: réflexion finale

- Camps:
  - Gouvernements locaux n'étaient pas là
  - Gouv. locaux après
  - Plateformes communautaires en cours
  - Plan de prévention des risques pas encore !!
  - Investissement pas encore !!
- Gouv. National:
  - Mécanisme de financement pour la reconstruction
  - Quelle institution sera la sous-traitant de PPR?
  - Accord sur des normes minimales?
  - Responsabilité de la propriété foncière?
  - Des camps vers les quartiers
  - Fonds pour la réhabilitation de Main Gate de Primature?



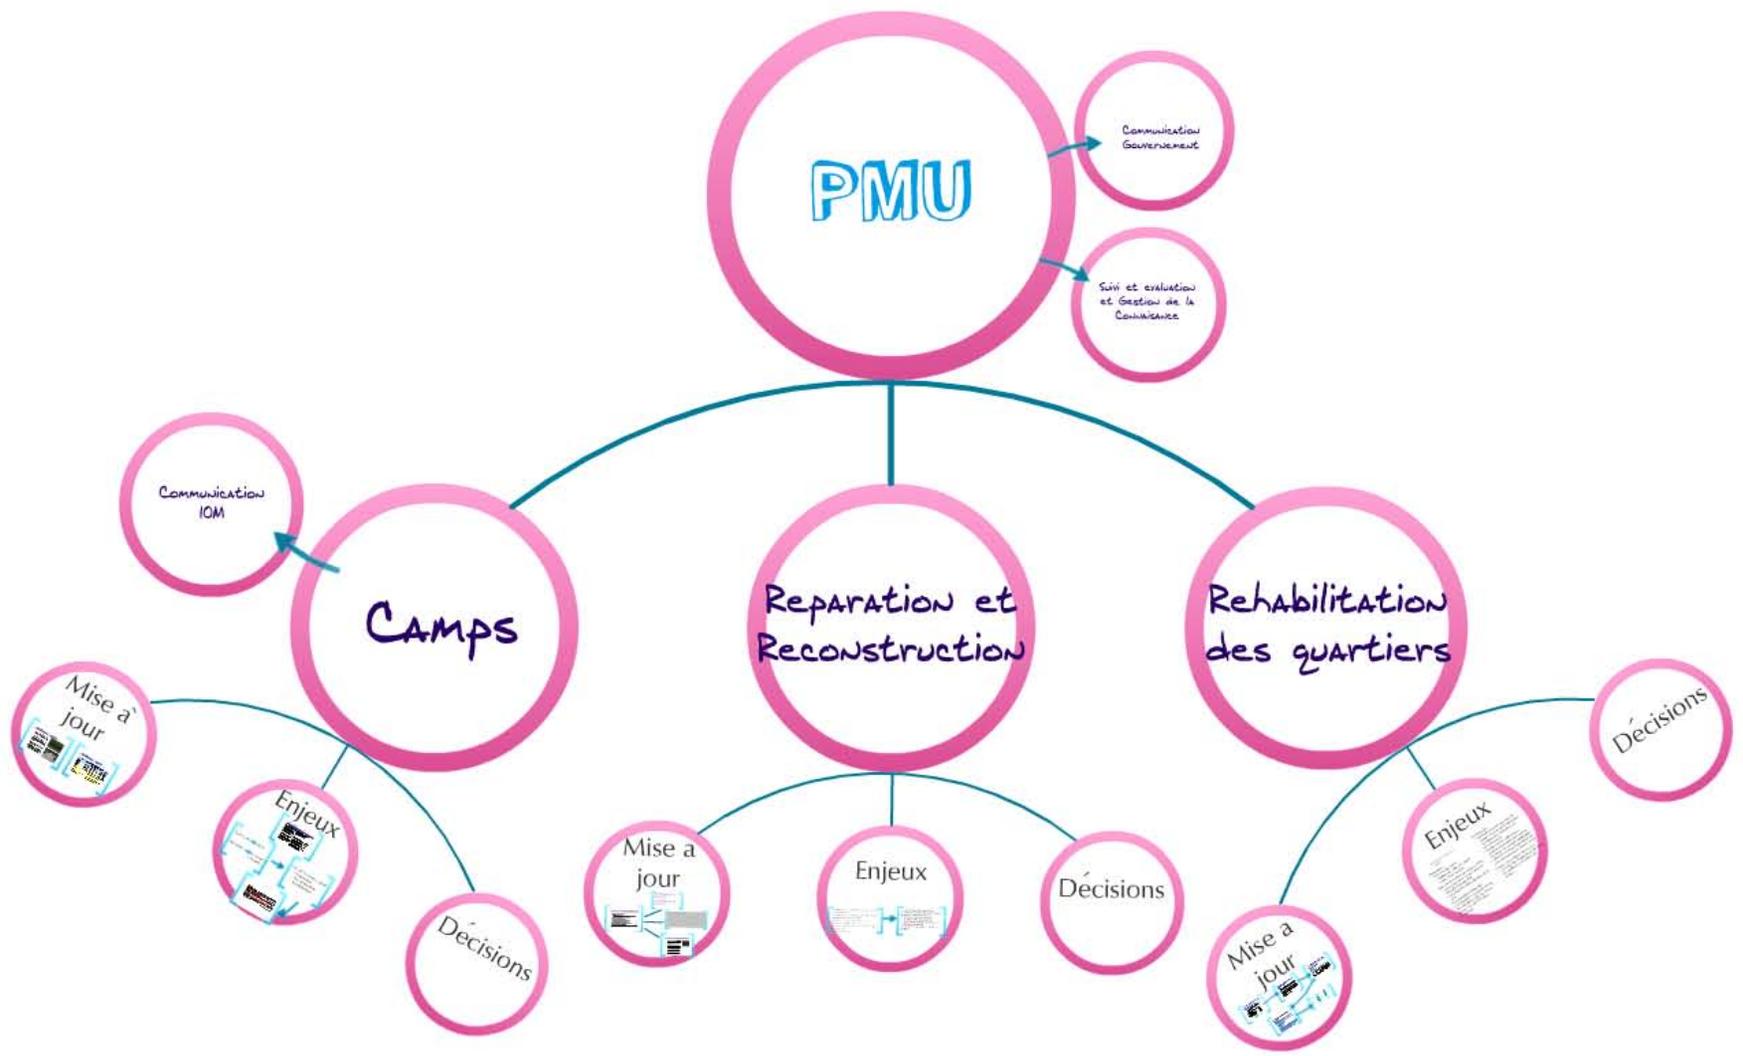

ion

CAMPS



# Composant 1 – Camps

16/6

- Le Projet 16/6 est a 79% complet
- 3 camps sont déjà fermé par OIM
- 2 camps fermera d'ici 2 semaines
- FICR a pris responsabilité pour le camp Mais Gâté avec leur propres fonds
- OIM a identifié les fonds nécessaire pour la Primature
- Développent des méthodologies d'enregistrement; communication; sante; support psychosocial et fermeture des camps en général



Place Saint Pierre – avant et après



# Composant 1 – Camps

Camp	Lead Agency	Commune	Nombre de familles estime dans le proposal	Familles enregistre au debut du program	Familles ayant quitte le camp	Familles restant sur le site	Status	Date de fermeture
PLACE ST PIERRE	IOM	PV	529	588	588	0	100%	DEJA FERME
PLACE BOYER	IOM	PV	750	722	722	0	100%	DEJA FERME
SYLVIO CATOR / EDH	IOM	PAP	499	172	172	0	100%	DEJA FERME
CANAPE VERT	IOM	PAP	370	281	240	41	85%	1 Mars
MAIS GATE 1&2	Croix Rouge	TAB	2442	2039	1986	53	97%	1 Mars
PRIMATURE	IOM	PAP	399	400	0	400	0%	31 Mai
Petits camps	IOM	PAP + PV	1000	1000	353	647	35%	9 camps deja ferme 5 Camps en cours
<b>16/6 TOTAL</b>			<b>5989</b>	<b>5202</b>	<b>4061</b>	<b>1141</b>	<b>78%</b>	

CHAMPS DE MARS	IOM	PAP	5000	4641	610	4031	13%	31 Aout
<b>TOTAL Champs de Mars plus 16/6</b>			<b>10,989</b>	<b>9,843</b>	<b>4,671</b>	<b>5,172</b>	<b>47%</b>	





# Composant 1 – Enjeux

Enjeux	Activités Nécessaires	Responsables
<p>L'expérience faite a Place Boyer et Place Saint Pierre montre que 96% des familles choisissent l'allocation de logement.</p> <p>Seulement un faible nombre de beneficiaires ont choisi les options T-shelter, réparation de maisons jaunes ou reconstruction de maisons rouges. Le risque etait qu'en attendant la mise en oeuvre de ces solutions, un certain nombre de familles ont du rester dans les camps et auraient pu etre confrontees a des problemes de protection ou de securite.</p>	<p>Payez a 100% les residents du camps. Le peu de familles ayant acces a une propriete privee (maison jaune, maison rouge, terrain constructible) sont referees a UNOPS . En attendant une solution permanente, ces familles sont logee dans une maison affermee.</p>	<p>OIM</p>
<p>Primature etait le seul camp sans financement.</p>	<p>Grace aux economies realisees, l'OIM a identifie les fonds necessaires pour fermer la Primature avec la permission du Gouvernement Haitian.</p>	<p>Le Gouvernement d'Haiti avec OIM et FICR</p>
<p>Il y a des familles refusant de quitter le camp apres avoir reçu leur aide financiere pour la location.</p>	<p>La Municipalite de concert avec un Juge de Paix, la DPC, la PNH et l'OIM / IFRC s'entretiennent avec chaque famille pour s'assurer qu'ils quittent le camp.</p>	<p>Les Mairies</p>
<p>Certaines familles ne figurant pas dans nos listes d'enregistrement, viennent s'installer dans le camp et refusent ensuite de partir sans obtenir les benefices du projet.</p>	<p>La Municipalite de concert avec un Juge de Paix, la DPC, la PNH et l'OIM / IFRC s'entretiennent avec chaque famille pour s'assurer qu'ils quittent le camp.</p>	<p>Les Mairies</p>
<p>Des familles s'installent dans le camp apres sa fermeture par le Projet 16/6.</p>	<p>Un fois que les camps sont fermes un document sera signe par l'OIM ou IFRC et la Mairie constatant que le site etait vide et que la responsabilites de la gestion du site est desormais transfere a la Mairie.</p>	<p>Les Mairies</p> 



### **A darker reality**

The second component is to revitalize the neighborhoods the camp residents might return to. The Canadian government is paying to reestablish 500 -informal camp businesses, train 50 entrepreneurs, create 2,000 construction jobs for debris removal, and rebuild and repair damaged houses.

**“If all we do is clear the Champ de Mars, we will have failed,”** said Beverley J. Oda, minister of international cooperation for the government of Canada.

The successful emptying of Champ de Mars over the coming months would be a milestone for post-quake Haiti, a part of the promise that “Haiti is open for business,” and that the international community and nongovernmental organizations have not failed.

But the darker reality is this: The **Haitian government is spending \$30 million to empty six camps.** There are 701 more. The **Champ de Mars project will cost \$20 million for 20,000 people.** There would still be close to half a million displaced persons in camps. No country, no group of donor nations, no NGO is considering donating \$500 million to Haiti to empty the camps.

The math does not work.

*William Booth, Washington Post*



# Reparation et Reconstruction

# Mise a jour

## Composant 2 - Réparation / Reconstruction

### Phase Préparatoire Réparation

- Subvention
- Dépense de terrain de Réparation
- Travaux de planification des travaux (études, devis, permis, etc.)
- Plan de 100 unités de réparation de maisons à réparer (pour 1000 logements)
- Acte de réhabilitation de maisons (pour les permis de construire à réparer)
- Travaux de démolition des bâtiments existants
- Mise au point de la base de données des travaux de réparation
- Le plan de réhabilitation des maisons (dans 1 quartier)
- Travaux de réparation des bâtiments (dans 1000 unités de réparation et en collaboration avec les autres acteurs du quartier)
- Mise au point des permis de construire (dans 1000 unités de réparation)
- Mise au point des permis de construire (dans 1000 unités de réparation)



Total de maisons jaunes dans le 8 quartiers: 130  
(statistiques préliminaires de MPTTC, mais toutes les maisons n'ont pas été évaluées au sol et/ou financées)

Total de maisons qui seront réparées: 1000

Total de maisons rouges dans le 8 quartiers: 1977  
(statistiques préliminaires de MPTTC, mais toutes les maisons n'ont pas été évaluées au sol et/ou financées)

Total de maisons qui seront reconstruites: 1000



## Composante 2 BIT- Activités Reconstruction

- Approuver et valider le **contrat national de reconstruction** (dans le cadre du projet AGO) (dans le cadre du projet AGO) (dans le cadre du projet AGO)
- Planifier de 100 unités de reconstruction (dans le cadre du projet AGO) (dans le cadre du projet AGO) (dans le cadre du projet AGO)
- Planifier de 100 unités de reconstruction (dans le cadre du projet AGO) (dans le cadre du projet AGO) (dans le cadre du projet AGO)
- Planifier de 100 unités de reconstruction (dans le cadre du projet AGO) (dans le cadre du projet AGO) (dans le cadre du projet AGO)
- Planifier de 100 unités de reconstruction (dans le cadre du projet AGO) (dans le cadre du projet AGO) (dans le cadre du projet AGO)



# Composant 2 – Réparation / Reconstruction

---

## Phase Préparatoire Réparation

- ✓ Évaluations:
  - ✓ Rapide de terrain de chaque quartier
  - ✓ Techniques en profondeur sur les quartiers de Morne Hercule, Morne Lazare, et Nérette ;
  - ✓ Plus de 100 évaluations techniques de maisons à réparer avec sketch technique ;
- ✓ Achat et entreposage de matériel pour les premiers 430 maisons à réparer ;
- ✓ Processus de sélection des sous-contractants terminé.
- ✓ Mise sur pied de la base de données qui suivra la progression des chantiers ;
- ✓ Le plan de communication entamé dans les 3 premiers quartiers ;
- ✓ Première rencontre avec la plateforme communautaire pour expliquer le projet de réparation et en attente de la liste des ouvriers du quartiers pour la sélection ;
- ✓ Identification d'une première zone d'interventions (dans Morne Hercule) pour réparer certaines maisons rouges et analyser le potentiel pour autres zones et quartiers ;



Total de MAISONS jeunes dans le 8 quartiers: 1,316  
(chiffres préliminaires de MTPTC, mais toutes les MAISONS n'ont pas été évaluées ou mal étiquetées)

Totale de MAISONS que seront réparés: 1,100

Totale de MAISONS rouges dans le 8 quartiers: 1,977  
(chiffres préliminaires de MTPTC, mais toutes les MAISONS n'ont pas été évaluées ou mal étiquetées)

Totale de MAISONS que seront reconstruis: 1,000

reconstruis:

1,000



### HORAIRE DE REPARATION DES MAISON JAUNES ET ROUGES DANS LES SEPT PREMIERES ZONES DU PROJET 16/6

	FEBRUAR				MARCH				APRIL				MAY				JUNE				JULY			
	<b>Morne Hercullej</b>																							
	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	WEEK 5	WEEK 6	WEEK 7	WEEK 8	WEEK 9	WEEK 10	WEEK 11	WEEK 12	273											
DATE	27-feb-12	05-mar-12	12-mar-12	19-mar-12	26-mar-12	02-avr-12	09-avr-12	16-avr-12	23-avr-12	30-avr-12	07-may-12	14-may-12												
NOMBRE DE MAISON	10	10	15	15	15	20	20	25	35	36	36	36												
	<b>Morne Lazarre</b>																							
	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	WEEK 5	WEEK 6	WEEK 7	WEEK 8	WEEK 9	WEEK 10	WEEK 11	WEEK 12	344											
DATE	26-mar-12	02-avr-12	09-avr-12	16-avr-12	23-avr-12	30-avr-12	07-may-12	14-may-12	21-may-12	28-may-12	04-jun-12	11-jun-12												
NOMBRE DE MAISON	10	10	15	15	15	20	20	25	30	32	35	35												
	<b>Nerette</b>																							
	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	WEEK 5	WEEK 6	WEEK 7	WEEK 8	WEEK 9	WEEK 10	WEEK 11	WEEK 12	144											
DATE	30-avr-12	07-may-12	14-may-12	21-may-12	28-may-12	04-jun-12	11-jun-12	18-jun-12	25-jun-12															
NOMBRE DE MAISON	10	10	15	15	15	15	15	20	20	24														
	<b>Bas Canape Vert</b>																							
	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	WEEK 5	WEEK 6	WEEK 7	WEEK 8	WEEK 9	WEEK 10	WEEK 11	WEEK 12	134											
DATE	21-may-12	28-may-12	04-jun-12	11-jun-12	18-jun-12	25-jun-12	02-jul-12	09-jul-12																
NOMBRE DE MAISON	10	10	15	15	20	20	22	22																
	<b>Bois Patate</b>																							
	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4	WEEK 5	WEEK 6	WEEK 7																	
DATE	11-jun-12	18-jun-12	25-jun-12	02-jul-12	09-jul-12	16-jul-12	23-jul-12																	
NOMBRE DE MAISON	10	10	15	15	17	20	20																	
	<b>Morne Ebo/Mapou</b>																							
	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3																					
DATE	25-jun-12	02-jul-12	09-jul-12																					
NOMBRE DE MAISON	10	15	25																					
	<b>Jean Baptiste</b>																							
	WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4																				
DATE	09-jul-12	16-jul-12	23-jul-12	30-jul-12																				
NOMBRE DE MAISON	10	15	17	17																				
	FEBRUAR				MARCH				APRIL				MAY				JUNE				JULY			
Houses to be repaired per week	10	10	15	15	25	30	35	40	50	66	66	76	55	57	65	80	50	69	52	74	35	37	17	
Cumulative	10	20	35	50	75	105	140	180	230	296	362	438	493	550	615	695	745	814	866	940	975	1012	1029	

## Composante 2 BIT– Activités Reconstruction

- Adaptation et validation de 5 **curricula nationaux de construction chaînée parasismique** (manuels finalisés fin février 2012 en partenariat avec le MTPTC, le MENFP, l'INFP, ONUHABITAT, la coopération suisse, Build Change et des institutions nationales de formation professionnelle)
- Formation de formateurs en construction chaînée parasismique en Avril 2012
- Formation technique **certifié** de 1000 contremaitres et ingénieurs des 16 quartiers à partir de mai-juin 2012 (la formation se fera en priorité sur les premières maisons rouges en construction ou autres infrastructures communautaires structurelles des 16 quartiers)
- Formation en gestion d'entreprise pour les Petites et Moyennes de la construction (Atelier de validation effectué, formation de formateur en avril 2012)
- Information et sensibilisation des habitants à la construction parasismique (finalisation du matériel de sensibilisation en mars 2012)



# Enjeux


1. Maisons endommagées qui se trouvent dans les zones à risque.
2. Réparation des maisons rouges par UNOPS. Mais aussi par les propriétaires.
3. C'est difficile de donner une solution de reconstruction avec \$3,500.
4. Aucun mécanisme de crédit pour les maisons à reconstruire.
5. Statuts fonciers



1. Quel est le plan du Gouvernement? Reconnaissance des investissements faits par les propriétaires? Subvention de \$3,500?
2. Que faire des maisons mal réparées?
3. Exceptions? Murs de soutènement?
4. Création d'une table financière sur l'accès à crédit pour reconstruction.
5. Options? Acte de notoriété? Loi sur la copropriété?

# Rehabilitation des quartiers

# Mise a jour




# Composant 3 – Réhabilitation des quartiers

## Plans de prévention des risques (PPR)

Calendrier

	Livrable	Echéance (en jours après signature du contrat)
1	Délimitation cartographique des zones A, B et C (terminologie définie ci-dessus) pour les 3 quartiers prioritaires.	30 jours
1.1	Délimitation cartographique des zones A	15 jours
1.2	Délimitation cartographique des zones B et C	30 jours
2	Délimitation cartographique des zones A, B et C (terminologie définie ci-dessus) pour les 5 autres quartiers.	60 jours
2.1	Délimitation cartographique des zones A	45 jours
2.2	Délimitation cartographique des zones B et C	60 jours
3	Première proposition de PPR pour les 3 quartiers prioritaires.	120 jours
4	Proposition révisée de PPR pour les 3 quartiers prioritaires.	135 jours
5	PPR final pour les 3 quartiers prioritaires.	150 jours
6	Première proposition de PPR pour les 5 autres quartiers.	180 jours (début à 120 jours)
7	Proposition révisée de PPR pour les 5 autres quartiers.	195 jours
8	PPR final pour les 5 autres quartiers.	210 jours



ATTENTION: la carte "preliminaire" mise à disposition par IMSRN est seulement une carte d'alea "provisoire". L'interaction avec les élus est nécessaire.



# Composant 3 – Réhabilitation des quartiers

---

## Planification Communautaire

### •Petionville :

- La cartographie des zones d'intervention est en cours, en complément du relevé de la trame urbaine et du bâti effectué par IOM dans le cadre du recensement. La création et validation des plateformes communautaires fin janvier permet de débiter les activités de planification.
- Semaine du 13/19 février: 1ere réunion sur la planification communautaire sur Morne Lazard et Morne Hercule pour expliquer la planification et établir un calendrier des focus groupes.

### •Turgeau :

- La création des plateformes communautaires permet de débiter les travaux de planification avec la communauté.
- L'exercice de carte mentale (délimitation des quartiers sur des critères de cohésion sociale) est en cours de finalisation.
- La cartographie des zones d'intervention est en cours, en complément du relevé de la trame urbaine et du bâti effectué par IOM dans le cadre du recensement et sur la base cartographique effectuée par Cordaid et Goal lors de précédents projets.

### •Calendrier:

- Restitution des premiers plans à Pétion-Ville et Turgeau en avril
- Diagnostic en mai.
- Stratégie d'intervention en mai.



# Composant 3 – Réhabilitation des quartiers

## Plateformes Communautaires

- Termes de référence validés

- Calendrier:

	Pétion-Ville			Turgeau			
Quartier	Morne Hercule	Morne Lazard	Nerette	Morne/Villa Rosa	Morne Hebo	Bois Patate	Jean Baptiste
Création	créée	créée	évaluation et update en course				
Validation	28-Janvier	29-Janvier	25-Février	Mars	Mars	Mars	Mars
Renforcement des capacités	en identification	en identification	en identification	en course	en course	en course	en course



## Composant 3 – Réhabilitation des quartiers

### Investissements publics:

- **Phase Préparatoire:**

- **Pétion-Ville:**

- Diagnostic détaillé de l'existant prévue pour fin février pour Morne Hercule, Morne Lazare et Nérette en coordination avec les acteurs de Débris II.*

- **Turgeau:**

- Diagnostic détaillé de l'existant prévue pour fin février en coordination avec les acteurs de CorAid et AFH.*

- **Coordination avec autres partenaires:**

- **Lampadaires Solaires avec OTI et UNFPA:**

- *Nérette: Mars*

- *Morne Hercule: Mars*

- *Morne Lazard et Turgeau: Juan*

- **MINUSTAH – Routes:**

- *Analyse technique conjointement avec la MINUSTAH dans le but de refaire la route Charlemagne Perralte traversant Morne Hercule et passant par Morne Lazard et Nérette ;*

- *Estimations de tous les sentiers d'accès et du drainage en cours pour les 4 quartiers. Travaux envisageables en avril 2012 pour le drainage, les routes et les accès ;*

*Facilitation de la validation, de la priorisation et du processus de planification communautaire par des focus groupes thématiques avec les bénéficiaires à travers les plateformes communautaires*



## Phase Préparatoire:

Accords avec le Ministère de Commerce, Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes, des ONGs et des prestataires de services de développement des affaires. On a 178 entreprises formels dans les 16 quartiers. On commence le mapping des informels.

## Inclusion des femmes:

Ministère de Commerce, Ministère à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes

F&D Fonkoze; Sofonias/Appelle; Goal;  
JPHRO; SHF; IRC; BRAC

800 microentreprises  
JUAN 2012

## Programme de Développement des fournisseurs - PDF

Ministère de Commerce.  
Équipe de coordination: mars.  
Formation de consultants: 3eme semaine de mars. 3 mois.  
Premières chaînes de valeur: juan.

## Formation:

Identification des secteurs économiques porteurs (en cours)

Formation professionnelle pour les compétences-secteurs économiques en demande (en préparation)

Formation en gestion d'entreprise (formation des formateurs effectuée)

## génération de revenu

Développement et mise en place d'un prêt micro finance spécifique au secteur de la construction et mise en place d'une ligne de micro crédit de \$US 200'000 pour le secteur de la construction et autres secteurs porteurs (fonds doublé par le partenaire (\$US 400 000). Opérationnel

Mise en place d'un système de recyclage et transformation des débris en matériaux de construction non structurels. Partenaires actuellement engagés à petion-ville.



# Enjeux

Délimitation cartographique:

- Officiel?

Plateformes:

- Bas Canapé Vert?
- Additionels: Jalousie, Sainte Marie, Haut Turgeau

Plans de prévention des risques (PPR):

- Gouvernements Locaux doivent prendre le leadership.
- Potentiel pour la légalisation de la terre
- Counterpartie National?
- Qui décidera sur grands travaux de mitigations dans les Zones rouges et vertes? Budget insuffisant

Infrastructure:

- Difficulté et confusion dans la marche à suivre pour l'obtention de l'appui des institutions du gouvernement .
- Quelle normes utiliser pour quartier informel lorsque normes existantes ne sont pas applicables.
- MINUSTAH exige la demande du gouvernement pour faire les routes

Activités Génératrices de revenus:

- On a besoin d'appui pour identifier les meilleurs consultants des affaires.



### Enjeux: réflexion finale

- Camps:
  - Gouvernements locaux n'étaient pas là
  - Gouv. locaux après
  - Plateformes communautaires en cours
  - Plan de prévention des risques pas encore !!
  - Investissement pas encore !!
- Gouv. National:
  - Mécanisme de financement pour la reconstruction
  - Quelle institution sera la sous-traitant de PPR?
  - Accord sur des normes minimales?
  - Responsabilité de la propriété foncière?
  - Des camps vers les quartiers
  - Fonds pour la réhabilitation de Main Gate de Primature?



# Enjeux: réflexion finale

Camps:

Gouvernement et les autorités n'étaient pas la B

- Gouv. local: semaines après
  - Plateformes communautaires: ok
  - Planification communautaire: en cours
  - Plans de prévention des risques: pas encore !!!
  - Investissement: pas encore !!!
- Gouv. National:
  - Mécanisme de financement pour la reconstruction
  - Quelle institution sera la contrepartie de PPR?
  - Accord sur des normes minimales?
  - ~~Changement~~ Légalisation de la propriété foncière?
    - Des camps vers les quartiers.
    - Fonds pour la rehabilitation de Mais Gate et Primature?

## JALOUSIE REHABILITATION



Commune : Pétiön-Ville  
District: Jalousie

### Targeted population's fast data:

- ✓ Target Population: 30,000 individuals
- ✓ # of families : 6000
- ✓ # of related camps : 4
- ✓ # of red houses : 100
- ✓ # of yellow houses : 500

**Budget :** USD \$30 million

### Proposed Activities

- ✓ **Community**
  - ❖ Risk Analysis
  - ❖ Mitigation
  - ❖ Sports and Art facilities
- ✓ **Housing solutions**
  - ❖ Repair
  - ❖ Rebuild
  - ❖ Refurbishment
  - ❖ House Improvements
  - ❖ Rental solutions for families living in small camps in and around neighborhoods
- ✓ **Access to**
  - ❖ Drainage
  - ❖ Water and Sanitation
  - ❖ Food security: Community or individual gardens
  - ❖ Waste management
- ✓ **Empowerment**
  - ❖ Community Platform
  - ❖ Participatory Planning
  - ❖ Micro finance
  - ❖ Micro insurance
  - ❖ Vocational training
  - ❖ Land titles
  - ❖ Public Private Partnerships (PPP)

### Project 16 Neighborhood: 16 Camps

The Government of Haiti has identified **Jalousie** as one of its priorities for neighborhood rehabilitation. The program will build on the success of the 16/6 Program to rehabilitate 16 neighborhoods from which people living in the 6 prioritized camps originate; thus far 3 camps have been closed, with two more close to completion. As part of the 16/6 program every displaced family in the targeted camps was able to chose one of 3 housing solutions depending on their individual circumstances: Repair, reconstruction or rental subsidy.

At the same time, a rehabilitation process began in the neighborhoods of origin:

- Micro-Zonal Risk Assessment, which analyzes the level of exposure to hazards and proposes mitigation works to stabilize the area.
- Participatory Urban Planning with community leaders.
- Providing housing through repair, reconstruction, refurbishment and densification.
- Investments in infrastructure and basic services, based on technical analysis, Government plans and community participation.
- Income generation activities: access to employment and investment opportunities.

Within the 16/6 implementation, 13% of families leaving the prioritized camps returned to Jalousie, making it a relevant neighborhood of return.

Considering Jalousie is one of the most densely populated informal settlements in Pétiön-Ville, the Haitian Government is interested in replicating the 16/6 methodology by investing in this area, which has enormous potential to develop and improve given the quality of the soil for building, and its proximity to the commercial centre of Pétiön-Ville.

The Haitian Government is particularly interested in receiving support from the Brazilian Government given the remarkable success in developing and improving the standard of living in its own informal settlements.



# Champs de Mars

## Camp



### Champs de Mars

- Les opérations dans le camp ont commencé le 10 Janvier
- 1196 familles sont déjà inscrites dans le program
- 1025 maisons choisis par les familles pour location ont déjà été visités et évalués
- Plus de 800 familles ont déjà reçu leur paiement (13%)
- 206 familles ont déjà quitté Champs de Mars
- 206 familles qui ont besoin de plus de support ont été identifiés par les équipes de Santé et Support Psychosociaux!
- Fermeture du camp finis en Août



## Quartiers



Révision des indicateurs

# 16/6: Lancement d'un processus de rehabilitation

