

**MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE**

**SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL
NATIONAL POUR L'ENVIRONNEMENT
ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE**

BURKINA FASO

Unité - Progrès - Justice

**RAPPORT D'ACTIVITES 2010
DES PROJETS DU PROGRAMME D'ACTION
NATIONAL D'ADAPTATION (PANA) A LA VARIABILITE ET
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DU BURKINA FASO**

Janvier 2011

SOMMAIRE

	Page
CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DU PROGRAMME D'ACTIONAL D'ADAPTATION (PANA)	3
I. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES PROJETS DU PANA	:
1.1.)- Activités réalisés, période d'exécution, responsables, et source de financement	5
1.2.)- Frais de gestion administrative et financière	7
II. MISE EN ŒUVRE DU PROJET PANA-BKF-PNUD-DANIDA	8
2.1.)- Bilan des activités de formation	8
2.2.)- Acquisition de supports de formation et appui à l'élaboration d'outils de planification	11
III. MISE EN ŒUVRE DU PROJET PANA-BKF-PNUD-JAPON	12
IV. MISE EN ŒUVRE DU PROJET PANA-BKF-PNUD-FEM DANS LES SITES-PILOTES	13
4.1.)- Bilan d'activités 2010 des de la province du Namentenga	13
4.2.)- Bilan d'activités 2010 des villages de la province de l'Oudalan	20
4. 3.)- Bilan d'activités 2010 des villages de la province du Mouhoun	29
V. RECAPITULATIF GENERAL DU BUDGET DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DU PANA	35
Les photos des activités réalisées dans les projets PANA en 2010	36

CONTEXTE DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DU PANA

Le Burkina Faso avec l'appui du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) par l'entremise du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a élaboré son Programme d'Action National d'Adaptation (PANA) à la variabilité et aux changements climatiques. Le PANA a été adopté par décret n°2007-740/PES/PM/MECV/MEF du 19/11/2007. L'analyse du PANA a montré que les régions du Sahel, du Centre-Nord, du Centre-Ouest et du Mouhoun, situées dans les zones climatiques soudano-sahéliennes avec une pluviométrie comprise entre 200 et 750 mm, sont les plus vulnérables à la variabilité et aux changements climatiques et de ce fait, connaissent un fort risque d'insécurité alimentaire et de réduction des ressources en eau, doublé du phénomène de la pauvreté affectant rudement la vie des populations rurales.

Ainsi, le mode d'exploitation des terres et des ressources naturelles à travers entre autres, l'exploitation agricole et le surpâturage aux abords immédiats des principaux cours d'eau (Mouhoun, Béli, Nakambé), a entraîné leur envasement et leur ensablement accélérés, réduisant du coup leur capacité de stockage tout en modifiant négativement leur régime d'écoulement. C'est pour inverser les tendances de dégradation de ces ressources naturelles et développer ses capacités d'adaptation, que le Burkina Faso a mobilisé des financements pour la mise en œuvre combinée de trois (3) des douze (12) projets prioritaires annexés aux documents du PANA. Il s'agit des projets suivants :

- Renforcement des capacités pour l'adaptation et la réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques au Burkina Faso, dénommé PANA-BKF-PNUD-FEM, du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) administré par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), financé à hauteur de 2 Millions 900 Mille \$ US, soit environ 1 Milliard 450 Millions de FCFA ;
- Adaptation aux changements climatiques en vue de l'amélioration de la sécurité humaine du Burkina Faso (PANA-BKF-PNUD-DANIDA), d'un coût de 870 Mille \$ US, soit environ 435 Millions de FCFA du Danemark ;

Renforcement des capacités pour une meilleure prise en compte des préoccupations liées aux adaptations aux changements climatiques lors de la préparation et de la mise en œuvre, des plans, programmes et projets de développement, financé par le Gouvernement japonais pour environ 2 Millions 900 Mille \$ US, soit 1 Milliard 450 Millions. En conformité avec les documents contractuels, et pour une recherche de synergie d'actions, les trois projets du PANA sont chacun sous la supervision d'un Directeur National de Projet nommé par arrêté ministériel.

Un organe de coordination unique (la Coordination Nationale des Projets du PANA) comprenant le Point focal Changements Climatiques et une Cellule Technique d'Appui composée de six (6) Volontaires des Nations Unies, a eu en charge la gestion quotidienne de ces projets, et ce, sous la supervision du SP/CONEDD, structure d'ancrage de ces projets au sein du Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie.

En outre, le PNUD est l'agence d'exécution de ces projets qui partagent les mêmes structures de supervision, de gestion et d'ancrage, les mêmes locaux, le même comité de pilotage, une bonne partie des équipements et de l'assistance technique.

A l'issue des planifications villageoises organisées dans chacun des deux (2) villages des provinces du Namentenga, de l'Oudalan et du Mouhoun, les programmes 2010 des six (6) villages pilotes ont été appréciés par les Comités de Concertation Technique Provinciaux des provinces respectives. Ces programmes, validés par le Comité de pilotage des projets du PANA au cours de sa session du 25 janvier 2010 ont été effectivement mis en œuvre au cours de cette année. Ainsi, le présent rapport fait l'économie de la mise en œuvre des trois projets d'adaptation en quatre (4) parties qui sont :

1. Gestion administrative et financière des trois projets du PANA ;
2. Activités réalisées dans le cadre du projet PANA-BKF-PNUD-DANIDA ;
3. Activités liées à la planification stratégique et à la contribution à la gestion transversale des activités du projet du PANA-BKF-PNUD-JAPON ;
4. Activités réalisées au niveau des sites-pilotes du projet PANA-BKF-PNUD-FEM.

I. GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES TROIS PROJETS DU PANA

1.1.)- Activités réalisés, période d'exécution, responsables, et source de financement

Résultats/Activités prévues	Source de financement	Réalisations	Taux de réalisation physique
L'équipe du projet est mise en place			
Recruter le personnel complémentaire des projets PANA	PANA-JAPON	Le personnel à recruter a été redimensionné en prenant en compte la nécessité d'assurer la coordination effective des projets du PANA et du faible volume des marchés au regard de la durée des projets. Ainsi, le PNUD appuiera le volet Passation des marchés. Pour ce faire, le personnel à recruter dont les TDR ont été validés par le Comité de pilotage sont : <ul style="list-style-type: none"> - Un(e) Coordonnateur des projets du PANA ; - Un(e) spécialiste du suivi-évaluation ; - Un(e) communicateur ; - Un(e) Secrétaire de direction ; - Un(e) chauffeur mécanicien. Une mini-retraite de l'équipe des projets du PANA a été organisée le 23 septembre 2010, en vue d'améliorer son organisation et de planifier les activités du trimestre	50%
Acquérir les équipements et moyens de fonctionnement du projet	PANA-FEM	<ul style="list-style-type: none"> - Un local servant de bureaux loué à la Maitrise d'Ouvrage de Bagré, et refectonné - Deux véhicules ont été reformés et quatre motos acquises ; - Du matériel informatique et des équipements de bureaux acquis 	100%
Acquérir les équipements et moyens de fonctionnement du projet	PANA-JAPON	Un véhicule et des équipements complémentaires de bureau sont livrés Matériel informatique en cours d'acquisition	80%
Organiser l'atelier de lancement du projet PANA-BKF-JAPON	Budget PNUD Régional	Un atelier de formation et de planification du projet a eu lieu les 12 et 13 janvier 2010 à Ouagadougou	100%
Signer des conventions d'appui avec les partenaires du projet PANA-FEM	PANA-FEM	Un protocole unique avec les Communes, le UCP et les Services techniques en charge de l'agriculture, des ressources animales et de l'environnement sont en cours de formalisation.	80%
Un mécanisme de suivi et d'évaluation est mis en place			
Planifier et anticiper les revues triparties	PANA-FEM	-	-
Organiser les missions (supervision) sur le terrain et d'évaluation	PANA-FEM	<ul style="list-style-type: none"> - Mission de supervision effectuée les 21 et 22 octobre 2010 par Mme Mame DIOP du PNUD/FEM Pretoria - Mission de supervision effectuée par l'équipe du projet PANA et les membres du Comité de pilotage du 8 au 12 novembre 2010 	100%

		- Mission de (supervision du Point Focal Opérationnel) du FEM réalisée du 25 au 30 Novembre 2010	
Disposer du rapport sur l'état d'avancement trimestriel, et le rapport financier	PANA-FEM, JPN, DANIDA	Rapport trimestriel réalisé et transmis à la DEP/MECV et aux différents bailleurs de fonds (FEM, JAPON et DANIDA)	100%
Réaliser les audits financiers et comptables	PANA- DANIDA	Un audit interne a été réalisé par les services financiers du PNUD et du Projet le 12 août 2010	100%
Le Comité de pilotage est fonctionnel			
Appuyer la formalisation du Comité de pilotage du PANA	PANA-FEM, JPN, DANIDA	Comité de pilotage élargi au Programme d'Investissement Forestier (PIF) formalisé par arrêté N°2010-159/PRES/MECV du 2 novembre 2010	100%
Organiser des sessions du Comité de pilotage	PANA-FEM	<p><u>Sessions tenues et ordres du jour :</u></p> <p><u>2-3 Novembre 2010</u></p> <p>1. Examen et adoption du rapport de la rencontre du comité de pilotage du 13 Octobre 2010</p> <p>2. Elaboration du plan quinquennal et du programme annuel d'activités du comité de pilotage des projets du PANA</p> <p><u>13 Octobre 2010</u></p> <p>1. Avis sur le projet d'arrêté du Comité de pilotage des projets du PANA ;</p> <p>2. Avis sur les projets de Protocoles ;</p> <p>3. Examen du Planning des activités du 4ième trimestre 2010 du projet PANA-JAPON ;</p> <p>4. Appréciation des TDR du personnel complémentaire à recruter</p> <p><u>25 janvier 2010</u></p> <p>1. Examen et validation du programme d'activités 2010 des projets PANA ;</p> <p>2. Examen et approbation des projets de protocoles d'accord et de partenariat</p> <p>3. Examen et approbation du projet d'arrêté devant régir le fonctionnement du comité de pilotage ;</p> <p>4. Examen et approbation du programme d'activités 2010 du projet «Deuxième note de communication nationale sur les changements climatiques» ;</p> <p><u>12 et 13 janvier 2010</u> Atelier de formation et de planification du projet sur :</p> <p>1. la revue du document du projet notamment son cadre logique ;</p> <p>2. la mise en œuvre de stratégies et des outils du programme pilote africain.</p>	100%

1.2) Frais de gestion financière des projets du PANA

Projet	Activités et Action	BUDGET en FCFA	Montants décaissés	Taux d'exécution
PANA DANIDA	VNU Spécialiste formation	6 000 000	5 203 638	87%
	Transport, Perdiems et Frais de mission Equipe du projet	3 000 000	2 910 000	97%
	Fourniture de services (entretien, Réparation des équipements et des locaux)	10 000 000	9 860 035	99%
	Equipements Techniques et informatiques	3 500 000	3 307 600	95%
	Frais bancaires	150 000	117 791	79%
	s/total DANIDA		22 665 000	21 399 064
PANA FEM	VNU Spécialiste (3)	27 000 000	26 884 500	100%
	Transport, Perdiems et Frais de mission, VNU Terrain, et coordination	15 000 000	12 596 750	84%
	Equipements, Fournitures et Moyen de fonctionnement	20 000 000	19 941 309	100%
	s/total FEM	62 000 000	59 422 559	96%
PANA JAPON	Charges du personnel	7 272 000	6 872 000	94%
	Services contractuels (SONABEL, ONATEL, frais bancaire, installations diverses)	5 000 000	4 879 056	98%
		3 600 000	2 700 000	75%
	Equipements (matériel informatique et mobilier de bureaux)	13 000 000	12 961 000	99%
	Equipement de transport (Véhicule de la coordination)	35 000 000	33 054 000	94%
	Fournitures de bureaux (consommables informatiques et bureautiques)	3 000 000	2 952 000	98%
	s/total JAPON	66 872 000	63 418 056	95%
	GRAND TOTAL		151 537 000	144 239 679

II. MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU PROJET PANA-BKF-PNUD-DANIDA

«Adaptation aux changements climatiques en vue de l'amélioration de la sécurité humaine du Burkina Faso»

2.1.)- Bilan des activités de formation

ACTIVITES	Réalisations des activités	BUDGET (FCFA)	Montants décaissés	Taux d'exécution financiers	Taux de réalisation physique
RESULTAT 1 :					
Les acteurs clés pour le développement durable du Burkina Faso sont sensibilisés sur les défis environnementaux ainsi que sur les effets néfastes des changements climatiques.					
Organisation de 03 ateliers de sensibilisation sur les implications des Changements Climatiques aux niveaux communaux (participants 30 personnes par l'atelier)	Atelier de formation et d'information organisé sur les implications des changements climatiques pour le secteur de l'habitat à l'intention des Leaders d'opinion et des conseillers municipaux de la commune rurale à Ouarkoye, les 23 et 24 novembre 2010 et Dédougou, les 26 et 27 novembre 2010	9000 000	2 706 750	30%	67%
Organisation de 5 ateliers de sensibilisation sur les Changements Climatiques aux niveaux régionaux (participants 60 personnes par l'atelier)	Ateliers sur les implications des changements climatiques dans les secteurs clés de l'économie tenues : - Sahel (Dori, 25 et 26 mars 2010) 65 participants - Boucle du Mouhoun (Dédougou, 30 et 31 mars 2010) 65 participants - Centre Ouest (Koudougou 02 et 03 avril 2010) 60 participants - Plateau Central (Ziniaré 13, 14 et 15 avril 2010) 60 participants - Région du Nord (Ouahigouya 21 et 22 avril 2010) 63 participants Sensibilisations par les medias ; - Sahel (Dori, 25 et 26 Mars 2010) Radio locale et radio rurale - Boucle du Mouhoun (Dédougou, 30 et 31 Mars 2010) radio local et journal Sidwaya - Centre Ouest (Koudougou 02 et 03 avril 2010) radio local et journal Sidwaya	25 000 000	26 963 900	108%	100%

ACTIVITES	Réalisations des activités	BUDGET (FCFA)	Montants décaissés	Taux d'exécution financiers	Taux de réalisation physique
	- Plateau Central (Ziniaré 13, 14 et 15 avril 2010) Sidwaya - Région du Nord (Ouahigouya 20 et 21 avril 2010) Radio locale (deux émissions en direct en deux jours)				
Formation des formateurs des Changements Climatiques au niveau sous régional ainsi que le niveau central	Formation des formateurs sur les changements climatiques pour les Cadres du Ministère de l'environnement et du cadre de vie (MECV), les directeurs régionaux du MECV et les représentants des Mairies des chefs lieux des treize régions 18-19 Février 2010, 47 participants	6 000 000	5 996 000	100%	100%
Renforcer/dynamiser le réseau existants sur les Changements climatiques	Appui à l'organisation et à l'animation de conférences sur les changements climatiques en rapport avec les résultats du projet	3 500 000	309 700	9%	20%
	Education environnementale - Atelier d'information et de cadrage des activités à mener - Atelier de recadrage des contenus complémentaires identifiés sur les changements climatiques - Séminaire d'insertion des contenus identifiés du préscolaire - Séminaire d'insertion des contenus identifiés du primaire - Séminaire d'insertion des contenus identifiés du poste primaire	20 000 000	21 371 925	107%	85%
	Appui au réseau du cercle d'information en changements climatiques (suivi et formation des relais locaux, caravane de presse dans les sites des projets, plan et couverture médiatique, production des émissions thématiques et d'articles de presse, participations à la Conférence des Parties)	10 000 000	5 021 000	50%	60%
Organisation de 8 ateliers de sensibilisation sur les Changements Climatiques aux niveaux régionaux (participants 60 personnes par atelier)	- Région du Centre Nord (29 et 30 avril 2010) 60 participants - Région des Hauts Bassins (Bobo –Dioulasso 23 et 24 juin 2010) 67 participants ciblés pour les Services techniques et administratifs de la région et pour les acteurs de la décentralisation de la région.	40 000 000	39 041 375	98%	100%

ACTIVITES	Réalizations des activités	BUDGET (FCFA)	Montants décaissés	Taux d'exécution financiers	Taux de réalisation physique
	<ul style="list-style-type: none"> - Région de l'Est (08 et 09 juillet 2010) 60 participants (services techniques et administratifs, acteurs de la décentralisation de la Région) - Région du Sud Ouest (13 et 14 juillet 2010) 60 participants (services techniques et administratifs, acteurs de la décentralisation) - Région des Cascades (21 et 22 juillet 2010) 60 participants (services techniques et administratifs, acteurs de la décentralisation) - Région du Centre Sud (03 et 04 août 2010) 60 participants (services techniques et administratifs, acteurs de la décentralisation) - Région du Centre Est (13 et 14 octobre 2010) 60 participants (services techniques et administratifs, acteurs de la décentralisation) - Région du Centre (28 et 29 décembre 2010) 60 (services techniques et administratifs, acteurs de la décentralisation) <p>Sensibilisation par les médias :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Région du Centre Nord (29 et 30 avril 2010) Télévision locale (15000 personnes) - Région des Hauts Bassins (Bobo –Dioulasso 23 et 24 juin 2010) Télévision nationale (25000 personnes) - Région de l'Est (08 et 09 juillet 2010) Sidwaya (10000 personnes) - Région du Sud Ouest (13 et 14 juillet 2010) trois émissions dans une radio locale (25000 personnes) - Région des Cascades (21 et 22 juillet 2010) Radio locale (15000 personnes) - Région du Centre Sud (03 et 04 août 2010) 60 participants, journal Sidwaya (10000) - Région du Centre Est (13 et 14 octobre 2010) participants, Radio locale (10000 personnes) - Région du Centre (28 et 29 décembre 2010) 60 (services techniques et administratifs, acteurs de la décentralisation) Télévision nationale et Journal le Pay (25 000 personnes). 				

ACTIVITES	Réalisations des activités	BUDGET (FCFA)	Montants décaissés	Taux d'exécution financiers	Taux de réalisation physique
TOTAL		189 500 000	126 310 850	67%	76%

2.2.) – Acquisition de supports de formation et appui à l'élaboration d'outils de planification

ACTIVITES	Réalisations des activités	BUDGET/ FCFA	Montants décaissés	Taux d'exécution financiers	Taux de réalisation physique
RESULTAT 1 :					
Les acteurs clés pour le développement durable du Burkina Faso sont sensibilisés sur les défis environnementaux ainsi que sur les effets néfastes des changements climatiques.					
Diffuser les documents simplifiés du PANA au moins 1000 exemplaires et mettre à la disposition au niveau national, régionale, et local	Nombre de PANA simplifiés (activités prévues et non prévues + 45 PANA simplifiés transmis également à l'UICN lors de sa formation sur l'outil cristal en mars 2010)	-	-	-	100%
Traduire les documents du PANA et la version simplifiée du PANA en langue national, (Mooré, Dioula, et Fulfuldé et tamashek)	Les documents du PANA (la version simplifiée) ont été traduits	6 000 000	1 000 000	16%	100%
Mise à la disposition de 3000 versions traduites en langue national à tous les niveaux, au niveau national, régional et local	3 500 exemplaires du PANA simplifiés et diffusés au niveau régional et dans les sites et traduits en langues Mooré, Dioula et Fulfuldé et Tamashek	15 000 000	9 000 000	60%	100%
Multiplier 8000 documents simplifiés du PANA et versions traduites en langues nationales	7 500 EXEMPLAIRES TRADUITS	20 000 000	15 000 000	75%	93%
TOTAL		41 000 000	25 000 000	61%	98%
GRAND TOTAL (2.1. et 2.2)		230 500 000	151 310 850	66%	87%

III. MISE EN ŒUVRE DU PROJET PANA-BKF-PNUD-JAPON

«Renforcer les capacités pour une meilleure prise en compte des préoccupations liées aux adaptations aux changements climatiques lors de la préparation et de la mise en œuvre des plans, programmes et projets de développement»

3.1.) –REALISATION DES ACTIVITES DU PROJETS DU PANA-JAPON

Activités		Réalisation des Activités 2010	Budget 2010 (F CFA)	Montants décaissés	Taux d'exécution financiers	Taux de réalisation physique
Résultat 1 – Le Burkina Faso a mis en place des mécanismes dynamiques de planification à long terme pour gérer les incertitudes inhérentes à la variabilité et au changement climatique.						
Renforcer les mécanismes nationaux de planification à long terme.	Diagnostiquer les mécanismes de planification existants en vue de l'élaboration d'un plan de renforcement des mécanismes de planification à long terme	Lancement de la publication de l'étude sur la prise en compte des thématiques environnementales émergentes dans les PRD, PCD, et PIAV, la date de dépôt de dossier le 26 Novembre 2010;	76 500	76 500	100%	100%
	Développer un plan de travail quinquennal/annuel pour le CP du PANA	Tenue de la session de travail du comité de pilotage des projets du Programme d'Action National d'Adaptation (PANA) pour l'élaboration d'un plan de travail annuel et quinquennal d'activités dudit Comité les 3 et 4 Novembre 2010	2 500 000	1 801 025	72%	100%
	Appuyer le CONASUR pour une planification à long terme prenant en compte les changements climatiques	Tenu d'atelier sensibilisation des CC pour les maires	45 000 000	45 201 825	100%	100%
Résultat 2 – Le BF a renforcé ses capacités de leadership et a mis en place des cadres institutionnels pour gérer les risques et exploiter les opportunités en matière de changements climatiques au niveau national.et local.						
Renforcer les capacités de la Météo pour une meilleure	Identifier les besoins d'informations climatiques nécessaires à la planification de l'ACC	L'installation de socle pour la réception des images satellitaires pour la collecte et la diffusion de données environnementales	5 000 000	5 479 200	100%	100%

Activités		Réalisation des Activités 2010	Budget 2010 (F CFA)	Montants décaissés	Taux d'exécution financiers	Taux de réalisation physique
observation du climat, l'analyse du climat et son impact sur le développement du pays en vue de fournir les données et les informations essentiels a la planification intégrant l'ACC .	2.2.2 Appuyer la Météo à collecter des données et produire/diffuser ces informations en lien avec les organismes régionales et sous-régionales	L'examen du planning de la METEO avec l'appui de l'expert PANA JPN au niveau régional ; Les concertations avec les responsables des structures clés pour l'appui à la collecte, et à la validation et à la diffusion de données et des informations climatiques (METEO, DIVISION DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES DE L'INFORMATION ET DU MONITORING DE L'ENVIRONNEMENT du SP/CONEDD, CONASUR etc) avec l'appui de M. Joseph INSTIFUL pendant sa mission à Ouagadougou du 4 au 6 Novembre.	7 500 000	5 549 200	74%	100%
Résultat 4 - Les mécanismes de mobilisation des ressources financières destinées à l'adaptation sont développés au niveau national et local.						
Développer les capacités d'utilisation des fonds	4.3.1 Analyser le fonctionnement des fonds existants (Fonds de développement de l'électrification etc.)	La tenue de l'atelier de formation des cadres du MECV (DGCN, DRECV, SP/CONEDD, DEP, Point Focal de POPs, DG/DGCV; DRECV/CN, DFC, CNSF, APFNL) en vue d'améliorer leurs capacités en matière de formulation des notes conceptuelles de projet, d'élaboration de projets et de mobilisation des ressources financières en appui aux options d'adaptation aux Changements Climatiques à Ziniaré du 26 au 28 Octobre 2010	35 000 000	16 172 153	46%	100%
GRAND TOTAL			95 076 500	74 279 903	78%	100%

IV. RAPPORTS D'ACTIVITES 2010 DES SITES DU PROJETPANA-BKF-PNUD-FEM

«Renforcement des capacités pour l'adaptation et la réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques»

4.1.) - Rapport d'activités 2010 des villages de la province du Namentenga

4.1.1.Rapport d'activités 2010 du village de Safi

Activités	Qté	Responsable de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de réalisation	Taux de réalisation physique	Observations
AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE								
Application participative des techniques de récupération agricole des terres/glacis dégradés (zaï)	10 ha	Les jeunes	DPAHRH	300,000	411,000	100%	100%	Activité entièrement réalisée
Assistance à la production de fumure organique à l'aide de fosses fumières stabilisées de 9 m ³ chacune pour dix (10) ménages	10 fosses	Les jeunes	DPAHRH	300,000	565,000	100%	100%	Activité entièrement réalisée
<i>Relance du fonctionnement de la banque de céréales du village</i>	1	Hommes+pers. âgées	DPAHRH	725000	725000	100%	100%	Activité achevée
<i>Contrôle des travaux de réalisation de 5 nouveaux forages</i>	1	Hommes+pers. âgées	DPAHRH	198000	198000	100%	100%	Activité achevée
Sous-total Agriculture et sécurité alimentaire				600,000	976,000	100%	100%	Activité achevée
RESSOURCES NATURELLES (Environnement/Foresterie/Faune)								
Technologie de production intensive de feuilles de baobab pour le renforcement de la qualité nutritionnelle et d'adaptation des ménages aux CC	Pm	Les jeunes	DPECV	500,000	-	-	-	Travaux non encore entamés en raison de manque de point d'eau
Création d'une bande de protection de cent (100) m sur les berges (choix raisonné pour des espèces ligneuses améliorées, adaptées et utilitaires) : cordons pierreux + sous solage + reboisements	10 ha	Les jeunes	DPECV	10,000,000	3,789,600	38%	-	Travaux terminés-Reste à mettre à jour le rapport financier
Sous-total Ressources naturelles				10,500,000	3,789,600	36%		Travaux non encore entamés en raison de manque de point d'eau

Activités	Qté	Responsable de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de réalisation	Taux de réalisation physique	Observations
RESSOURCES EN EAU								
Réalisation d'un forage d'eau par quartier : Travaux géophysiques, foration, installation pompes, construction superstructure	3	les femmes	Entreprise privée	24,000,000	20,426,200	85%	-	
Aménagement de points d'eau pastoraux (boulis) pour le bétail	1	les jeunes	Entreprise privée	7,000,000	-	-	-	Etudes de faisabilité à réaliser d'abord
Sous-total Ressources en eau			DPECV/DPRA	31,000,000	20,426,200-	66%	-	Travaux programmés pour 2011 sur 50 ha désormais
RESSOURCES ANIMALES								
Récupération de glaciis à des fins pastorales (charrue delphino)avec restauration du couvert végétal par sous solage	10 ha	Hommes + pers. Agées	DPECV/DPRA	700,000	-	-	-	Activité reportée pour 2011
Appui à la construction d'un magasin avec fonds de roulement pour la diffusion et la vente des SPAI	1	Les jeunes	Entreprise locale/DRRA	2,000,000	-	-	45%	Bergeries+équipes+ovins et production à mettre en place
Délimitation/restauration de zones à vocation pastorale	3 ha	Hommes + pers. Agées	DPRA	150,000	-	-	-	
Embouche ovine et/ou bovine (pour les femmes) en unités de production familiale (Activités Génératrices de Revenus) : formation, réalisation bergerie/étable, appui pour achat des ovins et/ou ovins	5 unités	les femmes	DPRA	2,000,000	-	-	45%	Bergeries+équipes+ovins et production à mettre en place
Sous-total Ressources animales				4,850,000	-	-	-	
INFRASTRUCTURES D'ALPHABETISATION								
Sous-total Infrastructures d'alphabétisation						-	-	
TOTAL				46,950,000	25,191,800	54%	-	

4.1.2. Infrastructures et activités d'aménagement du village de Safi

Activités	Qté	Resp. de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de réalisation	Taux de réalisation physique	Observations
Sensibilisation (Activités d'Information, Education et Communication)								
Sensibilisation et recherche de l'adhésion des communautés et partenaires	1	UCP	UCP+ Services Techniques	400,000	-	-	-	Activité remise en 2011
Suivre, évaluer les activités et rendre compte	1	CVD + communauté village	UCP+ Services Techniques	400,000	-	-	100%	Activité réalisée entièrement
Mise sur pied d'un comité ad hoc et d'un mécanisme de prévention et de gestion des feux de brousse	1	CVD	DEPCV	100,000	-	-	100%	Activité entièrement réalisée
Mise en place d'un comité spécifique de gestion des cours d'eau et de leurs berges	1	CVD	DPAHRH	100,000	-	-	100%	Activité entièrement réalisée
S/Total				1,000,000	-	-		
Formation								
Sensibilisation/information/formation en matière de CC : deux (2) séances destinées à vingt cinq (25) personnes la première année (dont une pour les élus et les responsables coutumiers/religieux)	50 personnes	UCP	UCP	3,000,000	-	-	100%	Activité réalisée
Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production agro-sylvo-pastorale : 4 séances/an	4 séances	Serv. Techn.	Serv. Techn.	6,000,000	-	-	100%	Activité réalisée pour une seule séance
S/Total				9,000,000	-	-		
TOTAL				10,000,000	-	-		

4.1.3. Programme d'activités 2010 du village de Kobouré

Activités	Qté	Respon sable de l'activi té	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de realizati on	Taux de réalisati on physiqu e	Observations
AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE								
Aménagement d'un "Jardin Potager Africain (JPA)" en économie d'eau par irrigation goutte à goutte (unité = 0,25 ha/famille ou ménage) : variante avec jujubier greffé et palmier dattier sur légumes divers (10 familles/an)	2,5 ha	jeunes et femmes	Entreprise privée/DPAHRH	5,000,000	-	-	-	Etude de faisabilité à réaliser d'abord
Construction et mise en service d'une banque de céréales fonctionnelle	1	Jeunes+ Hommes	Entreprise privée/DPAHRH	1,000,000	-	-	-	Spécifications techniques remises à des entreprises pour propositions de prix
Appui en crédits pour l'approvisionnement en intrants de production maraîchère et activités génératrices de revenus (AGR) au rythme de dix (10) crédits par an	10 crédits	les femmes	Projet/DPRA/DP AHRH	2,000,000	-	-	-	Activité reportée pour 2011
Contrôle des travaux de réalisation du nouveau forage d'eau	1	Les jeunes	DPAHRH	60 000	60 000	100%		
Sous-total Agriculture et sécurité alimentaire				7,000,000	-	-	-	
RESSOURCES NATURELLES (Environnement/Foresterie/ Faune)								
Mise en place d'un jardin polyvalent pilote pour les personnes vulnérables (femmes, jeunes, vieux) pour la production de plants destinés au reboisement, aux vergers, à la vente aux projets (lors des campagnes annuelles de plantation) et pour la production maraîchère avec un (1) ha clôturé, un (1) forage, un équipement complet	1	Les jeunes	DPECV/DPAHRH	8,650,000	-	-	-	Activité reportée pour 2011 en raison de manqué de point d'eau
Construction et mise en service d'une banque de céréales fonctionnelle	1	Jeunes, Hommes	Entreprise privée/DPAHRH	1,000,000	-	-	-	

Activités	Qté	Responsible de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de réalisation	Taux de réalisation physique	Observations
Sous-total Ressources naturelles				9,650,000	-	-	-	
RESSOURCES EN EAU								
Réhabilitation de forages (5) et valorisation agricole des environs	5 forages	les jeunes	Entreprise privée+DPAHRH	5,000,000	-	-	-	Travaux de diagnostic des pannes des 5 forages réalisés
Réalisation d'un nouveau forage d'eau	1	Les jeunes	Entreprise privée	6 500 000	6 500 000	100%	100%	
Aménagement de points d'eau pastoraux (boulis) pour le bétail	3	Les jeunes	Entreprise privée/DPRA	21,000,000	19,000,000	19%	-	Etudes de faisabilité à réaliser d'abord courant 2011
Sous-total Ressources en eau				26,000,000	19,000,000	40%		
RESSOURCES ANIMALES/ELEVAGE								
Promotion de trois (3) spéculations de cultures fourragères	3 ha	Hommes+pers. Agées	DPRA	900,000	924,500	23%	100%	Activité entièrement réalisée
Embouche ovine et/ou bovine (pour les femmes) en unités modèles de production familiale	5 unités	les femmes	DPRA	2,000,000	-	-	30%	Activité en cours de réalisation
Appui à l'aviculture villageoise améliorée en unités modèles de production semi intensive	10 unités	Hommes+pers. Agées	DPRA	2,000,000	454,000	103%	40%	Activité en cours de réalisation
Construction d'unités modèles de fenils au profit de groupements sélectionnés	5 unités	Hommes+pers. Agées	DPRA	500,000	-	130%	40%	Activité en cours de réalisation
Sous-total Ressources animaux				5,400,000	1,378,500	110%		
INFRASTRUCTURES D'ALPHABETISATION								
Sous-total Infrastructures d'alphabétisation				-	-	-	-	Aucune activité d'alphabétisation programmée pour ce village

Activités	Qté	Respon sable de l'activit é	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de realizati on	Taux de réalisati on physiqu e	Observations
TOTAL				48,050,000	20,378,500			

4.1.4. Activités de renforcement des capacités (Sensibilisation, Information, Formations) du village de Kobouré

Activités	Qté	Resp. de l'activit é	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de réalisati on	Taux de réalisati on physiqu e	Observations
Sensibilisation (Activités d'Information, Education et Communication)								
Mise sur pied d'un comité ad hoc et d'un mécanisme de prévention et de gestion des feux de brousse : deux (2) concertations par an	1	Les jeunes	DPECV	100,000	-	-	100%	Activité entièrement terminée
Mise sur pied d'un comité de gestion des ouvrages collectifs existants ou à créer : réunions au rythme de deux (2) concertations par an	1	Homme s+pers. Agées	DPAHRH	100,000	-	-	100%	Activité entièrement terminée
Suivre, évaluer les activités et rendre compte	1	CVD	UCP+Services Techniques	400,000	-	-	100%	Activité entièrement terminée
S/Total				600,000	-	-		
Formation								
Formation des producteurs en méthodes de fauche et de conservation de fourrages et de résidus de récoltes (3 séances/an/groupe de 20 producteurs)	3 séances	Populati on	DPRA	600,000	-	-	-	Activité reportée pour 2011
Sensibilisation/information/formation en matière de CC : deux (2) séances destinées à vingt cinq (25) personnes la première année (dont une pour les élus et les responsables coutumiers/religieux)	50 personnes	Homme s+pers. Agées	UCP	3,000,000	-	-	100%	Activité entièrement terminée
Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production agro-sylvo-pastorale à raison de quatre (4) séances par an	4 séances	Homme s+pers. Agées	UCP + Services Techniques	6,000,000	-	-	-	Aucune activité réalisée au titre de cette rubrique financière

Lancement d'un système de warrantage à travers la banque de céréales	1	Comité banque cereals	DPAHRH	2,000,000	-	-	-	Activité en attente de la construction de la banque de céréales
S/Total				11,600,000	-	-	-	
TOTAL				12,200,000	-	-	-	

4.2.)- Programme d'activités 2010 des villages de la province de l'Oudalan

4.2.1. Programme d'activités 2010 du village de Bagawa

Activités	Qté	Responsible de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de réalisation	Taux de réalisation physique	Observations
AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE								
Réfection de la banque de céréales:	1	CVD	DPAHRH	2,600,000	-	-	100%	-Réfection y compris équipement en palettes -Période de réalisation : janvier 2011
Construction de fosses fumières stabilisées	10	Beneficiaries	DPAHRH	300,000	-	-	-	Décalage entre le débloccage des fonds (juin) et la période de réalisation de l'activité (Janvier à Mai 2010)
Sous-total Agriculture et sécurité alimentaire:				2,900,000	-	-	-	
RESSOURCES NATURELLES (Environnement/Foresterie/ Faune)								
<i>Récupération des terres fortement dégradées à des fins de production sylvo-pastorales (50 ha)</i>	50 ha	CVD	DPECV	1,200,000	2,490,000	100%	100%	Labour et plantation de 20 000 pieds d'arbres
Création d'une bande de protection de 100m sur les berges du Gorol et des mares	10 ha	CVD	DPECV	10,000,000	-	-	100%	10 000plants mis en terre

Activités	Qté	Responsible de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de réalisation	Taux de réalisation physique	Observations
								avec un taux de reprise d'environ 80% ; Période de réalisation : Août 2010
Sous-total Ressources naturelles:				11,200,000	2,490,000	22%		
RESSOURCES EN EAU								
Aménagement d'une PEA(Poste d'Eau Autonome) solaire à usage mixte (homme et bétail) :	1	CVD	DPAHRH	30,000,000	-	-	-	Financement direct PNUD : Des TdR ont été élaborés ainsi que les adresses de trois prestataires et transmis au PNUD
Sous-total Ressources en eau:				30,000,000	-	-	-	
RESSOURCES ANIMALES								
Délimitation consensuelle, balisage et mise en défens d'une zone de pâture (100 ha)	100 ha	CVD	DPRA	6,000,000	-	-	-	La zone de pâture prend en compte plus de 25 villages y compris Bagawa Des séances de sensibilisation sont prévues en concertation avec d'autres partenaires (Association Maraobé)
Aménagement de parcelles fourragères individuelles clôturées (ou jardins de l'éleveur) à base de niébé fourrager à	3	Bénéficiaires	DPRA	900,000	550,000	61%	100%	Période de réalisation, juillet

Activités	Qté	Responsible de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de réalisation	Taux de réalisation physique	Observations
double fins , Leuceana et de graminées vivaces (10 jardins)								2010
Appui à l'embouche ovine (facilitation crédit, formation, bergerie et équipement)	10 femmes	Bénéficiaires	DPRA	2,500,000	-	-	100%	Activité réalisée en Décembre 2010
Appui à la construction de fenils individuels (10 femmes) :		Bénéficiaires	DPRA	1,000,000	1,000,000	100%	100%	Période de réalisation: Décembre 2010-Janvier 2011
Appui en matériel de fauche et conservation des fourrages (botteleuse, charrette, faux, fourche, râteau, etc.)	10 femmes	Bénéficiaires	DPRA	2,750,000	3,450,000	100%	100%	Période de réalisation: Octobre-Novembre 2010
Constitution d'un fonds de roulement SPAI	100 Sacs	Bénéficiaires	DPRA	800,000	495,000	62%	100%	Période de réalisation: Octobre-Novembre 2010
Diagnostic et protection sanitaire du bétail contre les maladies liées aux CC		CVD	DPRA	150,000	-	-	100%	Activité réalisée en Septembre 2010
Sous-total Ressources animales:				14,100,000	5,495,000	39%	-	
INFRASTRUCTURES D'ALPHABETISATION								
Construction et équipement du CPAF				4,500,000	37,000	1%	-	Financement direct PNUD : Les adresses de trois prestataires ainsi que le plan ont été transmis au PNUD
Sous-total Infrastructures d'alphabétisation:				4,500,000	37,000	1%	-	-
TOTAL				62,700,000	8,022,000	13%		

4.2.2. Activités de renforcement des capacités (Sensibilisation, Information, Formations) du villages n°1 (BAGAWA)

Activités	Qté	Resp. de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de réalisation	Taux de réalisation physique	Observations
Sensibilisation (Activités d'Information, Education et Communication)								
Sensibilisation et recherche de l'adhésion des communautés et partenaires		UCP	DPECV	400,000		-	100%	Activité réalisée en Décembre 2010
Sensibilisation, formation, information sur les CC	25 personnes	UCP	DPECV	3,000,000	293,650	10%	25%	Période de réalisation: Décembre 2010
S/Total		UCP		3,400,000	293,650	9%		
Formation								
Formation en techniques et bonnes pratiques d'adaptation aux CC	30 personnes	UCP	DPECV	200,000		-	100%	Activité réalisée en Décembre 2010
Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production agricole	30 personnes	CVD	DPAHRH	2,000,000	716,500	36%	100%	Formation sur l'itinéraire technique de l'utilisation des semences améliorées, période de réalisation, Juillet 2010 ; participants : 30 hommes
Formations en gestion et coopérative (structuration et fonctionnement des OP)	10 personnes	CVD	DPAHRH	250,000	255,000	100%	100%	Période de réalisation: juillet 2010 Participants: 13 hommes
Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production sylvicole	25 personnes	CVD	DPECV	2,000,000	319,000	16%	100%	-Formation en RNA, ---Période de réalisation: Juillet 2010 -participants : 30 hommes
Renforcement des capacités en gestion des pâturages naturels et des flux	40 personnes		DPRA	500,000	416,000	83%	100%	-Période de réalisation: Juillet

migratoire								2010 -Participants: 25 hommes
Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production pastorale	25 personnes		DPRA	2,000,000	246,000	12%	100%	-Formation en technique d'emboche: période de réalisation : Octobre – Novembre 2010 - Participants :10 hommes, 6 femmes
Formation en fauche, conservation et gestion des fourrages	20 personnes	CVD		250,000	273,000	100%	100%	-Période de réalisation: Septembre-octobre 2010 -participants : 10 hommes, 06 femmes
S/Total				7,200,000	2,225,500	31%		
TOTAL				10,600,000	2,519,150	24%		

4.2.3. Programme d'activités 2010 du village de Tin Akoff

4.2.4 : Infrastructures et activités d'aménagement du village n°2 (Tin Akoff)

Activités	Qté	Responsable de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de réalisation	Taux de réalisation physique	Observations
AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE								
Mise en service d'une banque de céréales	1	CVD	DPAHRH	4,100,000	-	-	-	La mise en place du fonds de roulement a été reportée en 2011, car le groupement a déjà bénéficié

Activités	Qté	Responsable de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de réalisation	Taux de réalisation physique	Observations
								d'un fond de roulement de 4 000 000 FCFA pour la même banque en 2010 par l'association ATAD
Construction de fosses fumières stabilisées	30	CVD	DPAHRH	450,000	-	-	-	Décalage entre le déblocage des fonds (juin) et la période de réalisation de l'activité (Janvier à Mai)
Sous-total Agriculture et sécurité alimentaire				4,550,000	-	-		
RESSOURCES NATURELLES (Environnement/Foresterie/ Faune)								
Récupération des terres fortement dégradées à des fins de production sylvo-pastorales (50 ha)	50 ha	CVD	DPECV	1,200,000	-	-	-	Aucun terrain ne se prête au labour à la charrue delphino d'après les techniciens de Reach Italia L'activité a été remplacée par la fixation des dunes
Sous-total Ressources naturelles				1,200,000	-	-	-	
RESSOURCES EN EAU								
Aménagement d'une PEA(Poste d'Eau Autonome) solaire à usage mixte (homme et bétail) :	1	CVD	DPAHRH	30,000,000	-	-	-	Coût de réalisation de l'ouvrage élevé (90 000 000 FCFA)par rapport au budget prévu (30 000 000

Activités	Qté	Responsable de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de réalisation	Taux de réalisation physique	Observations
								FCFA)
Sous-total Ressources en eau:				30,000,000	-	-	-	
RESSOURCES ANIMALES								
Appui à l'embouche bovine (facilitation crédit, formation, bergerie et équipement)de dix (10)hommes	10 hommes	CVD	DPRA	5,000,000	-	-	100%	-Période de réalisation: Janvier-Février 2011 ; -20 bovins, déparasités et vaccinés, 20 abreuvoirs, 20 mangeoires,20 blocs à lécher
Appui à la construction de fenils individuels :	10 hommes	CVD	DPRA	1,000,000	-	-	25%	Activité en cours de réalisation
Appui en matériel de fauche et conservation des fourrages (botteleuse, charrette, faux, fourche, râteau, etc.)	10 hommes	CVD	DPRA	2,750,000	6,850,000	100%	100%	-Période de réalisation: Octobre – Novembre 2010
Constitution d'un fonds de roulement SPAI	100 Sacs	CVD	DPRA	750,000	1,650,000	100%	100%	-Période de réalisation: Octobre-Novembre 2010
Appui à l'embouche ovine (facilitation crédit, formation, bergerie et équipement)pour dix (10) femmes	10 femmes			2,500,000		-	100%	Activité réalisée en Janvier 2011
Appui à la construction de fenils individuels (10 femmes)	10 femmes			1,000,000		-	25%	Activité en cours de réalisation
Appui en matériel de fauche et conservation des fourrages (botteleuse, charrette, faux, fourche, râteau, etc.) de dix(10) femmes	10 femmes			2,750,000		-	100%	Activité réalisée en septembre 2010
Constitution d'un fonds de roulement SPAI (100 sacs)				800,000		-	100%	Activité réalisée en septembre 2010

Activités	Qté	Responsable de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de réalisation	Taux de réalisation physique	Observations
Aménagement de parcelles fourragères individuelles clôturées (ou jardins de l'éleveur) à base de niébé fourrager à double fins, Leuceana et de graminées vivaces				3,000,000	650,000	22%	50%	10 parcelles aménagées sur une prévision de 20 parcelles Période de réalisation : Juillet 2010
Diagnostic et protection sanitaire du bétail contre les maladies liées aux CC :				200,000	200,000	100%	100%	Période de réalisation: septembre 2010
Sous-total Ressources animaux				19,750,000	9,350,000	47%		
INFRASTRUCTURES D'ALPHABÉTISATION								
Equiperment du bâtiment du CPAF		CVD	DPECV	1,000,000		-	100%	Activité réalisée en janvier 2011
Sous-total Infrastructures d'alphabétisation				1,000,000	-	-	-	
TOTAL				56,500,000	13,550,000	24%		

4.2.5. Activités de renforcement des capacités (Sensibilisation, Information, Formations) du village n°2 (Tin Akoff)

Activités	Qté	Resp. de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de réalisation	Taux de réalisation physique	Observations
Sensibilisation (Activités d'Information, Education et Communication)								
Sensibilisation et recherche de l'adhésion des communautés et partenaires	PM	UCP	DPECV	400,000	-	-	100%	Activité réalisée en décembre 2010
Sensibilisation, formation, information sur les CC	25 personnes	UCP	DPECV	3,000,000	263,800	9%	25%	Activité réalisée en décembre 2010
S/Total				3,400,000	263,800	8%		
Formation								
Formations en gestion coopérative (structuration et fonctionnement des OP)	10 personnes	CVD	DPAHRH	250,000	-	-	100%	Activité réalisée en juillet 2010

Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production agricole	30 personnes	CVD	DPAHRH	2,000,000	160,100	8%	100%	-Formation sur l'itinéraire technique de l'utilisation des semences améliorées, période de réalisation : Juillet 2010 - Participants : 15 hommes, 01 femme
Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production sylvicole	25 personnes	CVD	DPECV	2,000,000	335,750	17%	100%	-Formation en RNA, période de réalisation, Juillet 2010 -Participants :30 hommes
Formation en fauche, conservation et gestion des fourrages	50 personnes	CVD	DPRA	750,000	278,000	37%	100%	-Période de réalisation: Septembre- Octobre 2010 ; -Participants : 16 hommes
Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production pastorale	25 personnes	CVD	DPRA	2,000,000	795,750	40%	100%	-Formation en technique d'embouche: période de réalisation: Octobre-Novembre 2010, participants : 16 hommes et 10 femmes ; -Formation en gestion des pâturages : période de réalisation : Juillet 2010, participants :12 hommes, 12

								femmes
Formation en techniques et bonnes pratiques d'adaptation aux CC	30 personnes	CVD	PANA	200,000	101,150	51%	100%	Activité réalisée en Décembre 2010
Alphabétisation fonctionnelle		CVD	DPCEV	2,500,000		-	0%	Activité reportée au 1er trimestre 2011
S/Total				9,700,000	1,670,750	17%	-	
TOTAL				13,100,000	1,934,550	15%	-	

4.3.)- Programme d'activités 2010 des villages de la province du Mouhoun

4.3.1. Programme d'activités 2010 du village de Mounkuy

4.3.2. Infrastructures et activités d'aménagement du village n°1 MOUNKUY

Activités	Qté	Resp. de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de réalisation	Taux de réalisation physique	Observations
AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE								
Aménagement de sites en cordons pierreux et végétalisation ligneuse	20 ha	CVD, Conseiller	DPAHRH, Prestataires	4,600,000		-	-	
Confection de fosses fumières stabilisées (9m3)	10 fosses	CVD, Conseiller	DPAHRH,	300,000	-	-	-	
Production de semences améliorées	5 ha	Pdt Gpt Femmes	DPAHRH	1,250,000	-	-	80%	4 ha de champs vitrine + visite commentée avec 150 participants
Sous-total Agriculture et sécurité alimentaire				6,150,000	-	-	-	
RESSOURCES NATURELLES (Environnement/Foresterie/ Faune)								
Reforestation et mise en défens d'une bande de 100 m sur les berges	5 ha	CVD	DPECV	2,500,000	2,500,500	100%	100 %	40% sur les berges et 60% dans la forêt villageoise
Mise sur pied d'1 comité ad'hoc et d'un mécanisme de prévention et de gestion des feux	1 comité	CVD	DPECV	100,000	102,000	100%	100%	Comité mis en place, les membres formés

Activités	Qté	Resp. de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de réalisation	Taux de réalisation physique	Observations
Sous-total Ressources naturelles				2,600,000	2,602,500	100%	-	
RESSOURCES EN EAU								
Aménagement d'un jardin polyvalent: réalisation d'1 puits à grand diamètre en 2010	1 PGD	Pdt Gpt Femmes	DPAHRH, Prestataires	7,000,000	-	-	-	Spécifications et prestataires identifiés
Construction de puits à grand diamètre dans les quartiers	2 PGD	CVD	DPAHRH Prestataires	4,000,000	-	-	-	Idem
Réalisation de puits pastoraux le long des pistes à bétail	1 PGD	CVD	DPAHRH Prestataires	7,000,000	-	-	-	Idem
Etude de faisabilité de l'aménagement de la plaine d'inondation de Mou Faho	1 Etude	CVD, Pdt comité d'irrigants	DPAHRH, Prestataires	4,000,000	-	-	-	Mission de reconnaissance du site et discussion avec les responsables du village
Mise en place d'1 comité spécifique de gestion du cours d'eau, de ses berges et des zones humides attenantes	1 comité	CVD	DPAHRH, DPECV	100,000	100,000	100%	100%	Comité mis en place et les membres formés
Sous-total Ressources en eau				22,100,000	100,000	100%	-	
RESSOURCES ANIMALES								
Lutte contre la trypanosomiase animale et ses vecteurs	4 traitements	CVD	DPRA, PATTEC	1,500,000	-	-	-	Activité assurée par un autre projet: PATTEC
Aménagement des parcours à bétail existants	5 ha	CVD	DPRA, DPECV, DPAHRH	5,000,000	-	-	-	Mission conjointe, administration, services techniques communes et populations effectuée
Amélioration de l'aviculture villageoise par l'introduction de géniteurs (COQ) de races performantes	60 coqs	Pdte Gpt Femmes	DPRA	3,000,000	1,275,000	43%	80%	Choix et formation des bénéficiaires, , construction de

Activités	Qté	Resp. de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de réalisation	Taux de réalisation physique	Observations
								poulaillers, commande et réception des coqs
Embouche ovine par les femmes d'un groupement	20 Femmes 40 Moutons	Pdte Gpt Femmes	DPRA	5,000,000	3,668,000	73%	100%	Entièrement exécuté, au stade de la vente des animaux
Appui à la production fourragère	4 ha	CVD	DPRA	400,000		-	125%	5 ha réalisées
Sous-total Ressources animaux				14,900,000	4,943,000	33%		
TOTAL				45,750,000	7,645,500	17%		

4.3.3. Activités de renforcement des capacités (Sensibilisation, Information, Formations) du village n°1 MOUNKUY

Activités	Qté	Resp. de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de réalisation	Taux de réalisation physique	Observations
Sensibilisation des communautés par le théâtre forum	2 présentations	CVD, Conseiller	DPECV, Troupes théâtrales	1,400,000	427,500	31%	100%	2 Représentations publiques et plus de 400 personnes touchées
Sensibilisation/information/formation en matière de CC pour les leaders d'opinion villageois	2 sessions, 25 personnes	CVD, Conseiller	Projet PANA, DPECV	3,000,000	187,500	6%	100%	En une session l'objectif de 50 personnes a été atteint
S/Total				4,400,000	615,000	14%		
Formation								
Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production ASP	4 Sessions 60 Personnes	CVD	Projet PANA DPECV, DPAHRH, DPRA	6,000,000	6,231,375	104%	500%	Le référentiel des coûts et la méthode de prise en charge des participants ont changé. Plus de 300 personnes ont

								été formées
Renforcement de capacité en suivi et auto-évaluation	1	CVD	CVD, Comités, leaders d'activités	400,000	-	-	100%	1 atelier de bilan-programmation a eu lieu Prévision sous estimée
S/Total				6,400,000	6,231,375	97%		
TOTAL				10,800,000	6,846,375	63%		

4.3.4. Programme d'activités 2010 du village de Souri

Activités	Qté	Responsable de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de réalisation	Taux de réalisation physique	Observations
AGRICULTURE ET SECURITE ALIMENTAIRE								
Aménagement de sites en cordons pierreux et végétalisation ligneuse	30 ha	CVD, Chef de village	DPAHRH, Prestataires	6,900,000		-	-	
Confection de fosses fumières stabilisées (9m3)	30 fosses	CVD, Chef de village	DPAHRH,	900,000		-	-	Idem
Production de semences améliorées	15 ha	Pdt Gpt Femmes	DPAHRH	3,750,000		-	27%	4 ha de semences en démonstration ont été réalisés
Sous-total Agriculture et sécurité alimentaire				11,550,000	-	-	-	
RESSOURCES NATURELLES (Environnement/Foresterie/ Faune)								
Mise sur pied d'1 comité ad'hoc et d'un mécanisme de prévention et de gestion des feux	1comité	CVD	DPECV	100,000		-	100%	Comité mis enplace et membres formés
Sous-total Ressources naturelles				100,000		-	100%	
RESSOURCES EN EAU								
Aménagement d'un jardin polyvalent: réalisation d'1 puits à grand diamètre en 2010	1 PGD	Pdte Gpt Femmes	DPAHRH, Prestataires	7,000,000		-		Procédures de passation de marché en cours

Activités	Qté	Responsable de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de réalisation	Taux de réalisation physique	Observations
Construction de puits à grand diamètre dans les quartiers	2 PGD	Doyé L., Ouédraogo M.	DPAHRH Prestataires	4,000,000		-	-	Idem
Réalisation de puits pastoraux le long des pistes à bétail	1 PGD	CVD	DPAHRH Prestataires	7,000,000		-	-	Idem
Sous-total Ressources en eau				18,000,000	-	-	-	
RESSOURCES ANIMALES								
Lutte contre la trypanosomiase animale et ses vecteurs	4 traitements	Diallo O., Dembélé K., Dira A.	DPRA, PATTEC	1,500,000		-	-	Activité assurée par le projet PATTEC
Aménagement des parcours à bétail existants	5 ha	Coulibaly A., Tall B.	DPRA, DPECV, DPAHRH	5,000,000	222,000	4%	-	Mission conjointe, administration, services techniques communes et populations effectuée
Amélioration de l'aviculture villageoise par l'introduction de géniteurs (COQ) de races performantes	20 coqs	Pdte Gpt Femmes	DPRA	1,000,000	341,500	34%	80%	Choix et formation des bénéficiaires, , construction de poulaillers, commande et réception des coqs réalisés
Embouche ovine par les femmes d'un groupement	20 Femmes 40 Moutons	Pdte Gpt Femmes	DPRA	5,000,000	3,634,000	73%	100%	Au stade du renouvellement des animaux pour le 2 ^{ème} tour
Appui à la production fourragère	6 ha	Zongo A., Barry A.	DPRA	600,000	-	-	100%	1ha de sorgho et 5 ha de niébé réalisés
Appui à la fauche et conservation du fourrage naturel	10 ménages formés et équipés	Doyé T., Barry A., Zoromé D.	DPRA	2,750,000	1,850,000	67%	100%	

Activités	Qté	Responsable de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de réalisation	Taux de réalisation physique	Observations
Sous-total Ressources animaux				15,850,000	6,047,500	38%		
TOTAL				45,500,000	6,047,500	13%		

4.3.5. Activités de renforcement des capacités (Sensibilisation, Information, Formations) du villages n°2 SOURI

Activités	Qté	Resp. de l'activité	Partenaires Techn. Resp.	Budget an1 (FCFA)	Réalisations 2010	Taux de réalisation	Taux de réalisation physique	Observations
Sensibilisation (Activités d'Information, Education et Communication)								
Sensibilisation des communautés par le théâtre forum	2présentation	CVD, Conseiller	DPECV, Troupes théâtrales	1,400,000	324,000	23%	100%	2 Représentations publiques pour plus de 200 personnes.
Sensibilisation/information/formation en matière de CC pour les leaders d'opinion villageois	2 sessions, 25 personnes	CVD, Conseiller	Projet PANA, DPECV	3,000,000	1,380,500	46%	100%	50 personnes ont été formées en une session
S/Total				4,400,000	1,704,500	39%		
Formation								
Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production ASP	4 Sessions 60 Personnes	CVD	Projet PANA DPECV, DPAHRH, DPRA	6,000,000	4,537,900	76%	500%	Le référentiel des coûts et la méthode de prise en charge des participants ont changé. Plus de 300 personnes ont été formées
Renforcement de capacité en suivi et auto-évaluation	1	CVD	CVD, Comités, leaders d'activités	400,000		-	100%	1 atelier de bilan-programmation a eu lieu
S/Total				6,400,000	4,537,900	71%		
TOTAL				10,800,000	6,242,400	58%		

V. RECAPITULATIF GENERAL DU BUDGET GLOBAL DES PROJETS DE MISE EN ŒUVRE DU PANA

STRUCTURE D'EXECUTION DES ACTIVITES	BUDGET 2010 (FCFA)	Montants décaissés	Taux d'exécution
Frais de la gestion administrative et financière des projet du PANA			
- PANA-BKF-PNUD-DANIDA	22 665 000	21 399 064	94%
- PANA-BKF-PNUD-FEM	62 000 000	59 422 559	96%
- PANA-BKF-PNUD-JAPON	66 872 000	63 418 056	95%
MISE EN œuvre DES ACTIVITES du projet PANA-BKF-PNUD-DANIDA			
- Activités de formation	189 500 000	126 310 850	67%
- Acquisition de supports de formation et appui à l'élaboration d'outils de planification	41 000 000	25 000 000	61%
MISE EN ŒUVRE DU PROJET PANA-BKF-PNUD-JAPON			
- Activités 1,2 et 4	95 076 500	74 279 903	78%
PROGRAMMES D'ACTIVITES 2010 DES SITES DU PROJET PANA-BKF-PNUD-FEM			
- Programme d'activités 2010 des de la province du Namentenga	117 200 000	45 570 300	39%
- Programme d'activités 2010 des villages de la province de l'Oudalan	142 900 000	26 025 700	18%
- Programme d'activités 2010 des villages de la province du Mouhoun	112 850 000	26 781 775	24%
GRAND TOTAL	850 063 500	468 208 207	55%

Les photos des activités réalisées dans les projets PANA en 2010

PANA DANIDA :



Les services techniques, les responsables administratifs et les acteurs de la décentralisation étaient mobilisés au cours des formations régionales (cas de la Région du Centre Sud)

Les photos des activités réalisées dans les 2 villages de la province du Namentenga en 2010



4




Champ labouré au tracteur à Kobouré pour la production des cultures fourragères

5



Séance de discussions in situ à Kobouré lors de la visite de Mme DIOP

6

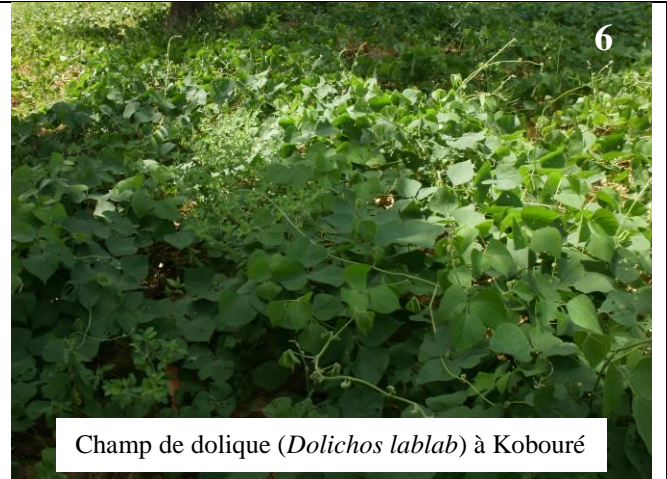


Champ de dolique (*Dolichos lablab*) à Kobouré

7



Plantation d'arbres dans la bande de protection de 10 ha des berges du cours d'eau de Safi

8

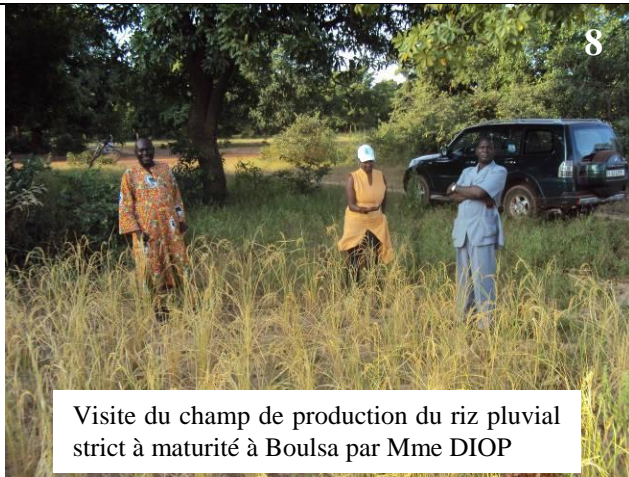

Visite du champ de production du riz pluvial strict à maturité à Boulsa par Mme DIOP

9




Visite de la bande de 10 ha de plants pour la protection des berges du cours d'eau de Safi par Mme DIOP



10 Champ de Sorgho fourrager à maturité à Kobouré



11 Séance de formation de 30 producteurs de Kobouré à la production avicole semi-intensive

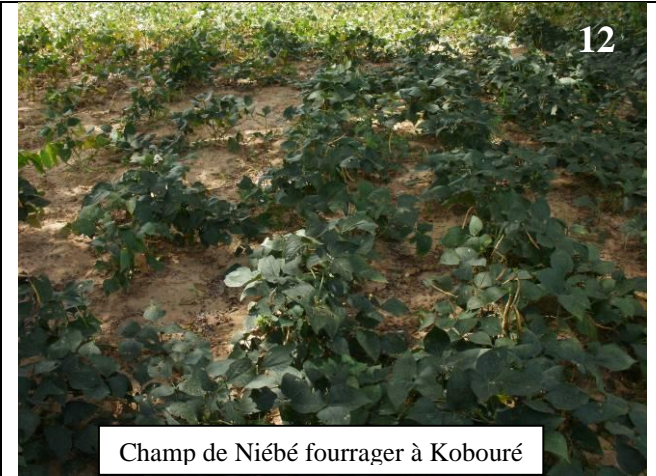

12 Champ de Niébé fourrager à Kobouré

Les photos des activités réalisées dans les 2 villages de la province de la Boucoule de Mouhoun en 2010



13



14



15

13. Les membres du comité de pilotage accompagnés des services techniques et des productrices visitent les champs de niébé fourrager des femmes de Sourï qui pratiquent l'embouche ovine. Photo: A. E. KIGA

14. Les membres du comité de pilotage échangent avec les responsables des femmes de Sourï. On voit les bottes de fourrage confectionnées à l'aide des botteuses offertes par le projet. Photo: A. E. KIGA

15. Le projet a contribué à réduire les difficultés de transport en octroyant dix charrettes et dix ânes aux paysans de Sourï. En bas, à droite: une botteuse métallique. Photo: A. E. KIGA

Les photos des activités réalisées dans les 2 villages de la province de Sahel en 2010

