



Projet : CIV 10-00103170 - Renforcement de l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans la planification du développement en Côte d'Ivoire"

Projet CIV10-00112399 - NDC Support Programme en Côte d'Ivoire

Projet CIV10-00103171 - Amélioration du Système de Transparence pour une Action Climatique Renforcée en Côte d'Ivoire

RAPPORT FINAL


PREMIERE REUNION DU COMITE DE PILOTAGE CONJOINT DES PROJETS NAP-GCF, CBIT-FEM ET NDC-SP DE LA SESSION 2020



Mercredi 05 Août 2020, Hôtel La Rose Blanche, sis à Cocody-Angré

Pour le Comité de Pilotage

Pour le PNUD



Joseph Ezoua

Chef du Département Développement Durable Inclusif

Pour le MINEDD



Parfait Kouadio

Directeur de Cabinet Adjoint

AR



INTRODUCTION

Le mercredi 05 Août 2020 de 09h00 à 14h00, s'est tenue la **première réunion de la session 2020 du Comité de Pilotage Conjoint des projets, NAP-FVC, CBIT-FEM et NDC-SP** à l'**Hôtel La Rose Blanche, Cocody-Angré, 22^{ème} Arrondissement.**

Cette première réunion présidée par **Monsieur KOUADIO Parfait, Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre de l'Environnement et du Développement Durable, et Président du Comité de Pilotage Conjoint**, avait pour objectif de présenter aux membres du Comité de Pilotage conjoint l'état d'avancement des projets NAP-FVC, CBIT-FEM et NDC-SP. Spécifiquement, la réunion a permis de : (i) faire le point d'étapes des activités des projets ; (ii) présenter les nouvelles activités introduites dans les projets ; et (iii) faire des recommandations pour les prochaines étapes.

La réunion a enregistré la participation plus des trois quart (3/4) des membres du Comité de Pilotage Conjoint. La réunion a été subdivisée en cinq (05) étapes majeures :

- **Mot de bienvenue du Président du Comité de pilotage ;**
- **Présentations sur les projets ;**
- **Résolutions du COPIL ;**
- **Recommandations du COPIL ;**
- **Mot de fin du Président du Comité de pilotage.**

1. MOT DU PRESIDENT DU COMITE DE PILOTAGE

M. KOUADIO Parfait, Directeur de Cabinet Adjoint, Président du Comité de Pilotage conjoint, dans son allocution, a tenu à saluer et à féliciter le PNUD et tous les autres membres du comité issues de l'Administration publique et du secteur privé pour leur engagement à prendre part à la réunion en dépit des contraintes imposées par leurs agendas et de rappeler le caractère technique de la réunion avant de déclarer l'ouverture des travaux. La réunion a été coprésidée par le PNUD, représenté par Dr. Joseph EZOUA, Responsable du Département Développement Durable Inclusif (DDI).

2. PRESENTATIONS SUR LES PROJETS

Cette étape de la réunion a été marquée par deux (02) interventions : la présentation du Coordinateur des projets NAP-GCF, et les présentations du Coordinateur des projets CBIT-FEM et NDC-SP.

Dans leurs interventions, **MM. Jean Douglas ANAMAN (Coordonnateur du Projet NAP-GCF) et Richemond Agré ASSIE (Coordinateur des projets CBIT-FEM et NDC-SP)**, ont successivement fait le rappel des objectifs des projets, présenté les principaux acquis (études réalisées et en cours, ateliers, etc.), les défis et les solutions adoptées pour surmonter ces difficultés (télétravail, comité de lecture des rapports d'études, etc.). Enfin, ils ont évoqué les prochaines étapes et présenté les points de discussion pour lesquels les orientations stratégiques du Comité de Pilotage sont requises. Ce sont :

Points de discussion		
Projet NAP-GCF	Projet CBIT-FEM	Projet NDC-SP
<ul style="list-style-type: none"> - La mise en place de la Task force thématique ; - La question des bourses de formations ; - La question des bourses de recherche ; - Les missions de terrains ; - Les nouvelles activités à introduire dans le PTA. 	<ul style="list-style-type: none"> - La mise en place d'un groupe d'experts national sur l'évolution du climat (GENEC) ; - L'élaborer une loi sur les changements climatiques en Côte d'Ivoire - Les bourses de recherche post-doctorat ; - La reprogrammation des activités de l'années 2020 non encore exécutés et de leurs budgets à l'année 2021. 	<ul style="list-style-type: none"> - L'appui la révision des NDC au niveau du secteur des Déchets et la conception et le design du document final NDC ; - Le recrutement un expert genre pour accompagner la compilation du document NDC ; - La construction d'un pipeline de projets climatiques d'investissements pour la levée des fonds dans le cadre des Green Bonds ; - L'analyse des risques à l'investissement dans les énergies renouvelables (Solaires photovoltaïques) et proposition de mesures d'atténuation des risques ; - La proposition d'avenant au document projet de mis en place d'un système national de "green bonds" de la part du Ministère de l'Economie et des Finances ; - La proposition de prolongation de la fin du projet initialement prévu le 31 juillet 2020 au 31 juillet 2021.

3. RESOLUTIONS DU COPIL

Lors des échanges, le COPIL a fait les recommandations ci-dessous pour l'ensemble des trois (03) projets :

- L'adoption de tous les documents de travail proposés par les coordinateurs des projets, sous réserve du constat fait de l'absence du rapport financier à mi-parcours de mise en œuvre des projets ;
- L'adoption du principe de la prolongation de la période de mise en œuvre des projets en raison de la crise sanitaire mondiale de la Covid19 ;
- L'adoption du principe d'introduction et de programmation de nouvelles activités dans les PTA des projets ;

- L'adoption du principe de reprogrammation des activités des projets et non encore effectuées.

De façon spécifiques, les résolutions et recommandation issues des membres du COPIL sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

Résolutions spécifiques		
Projet NAP-GCF	Projet CBIT-FEM	Projet NDC-SP
<ul style="list-style-type: none"> - Endosse la prolongation du projet de six (06) mois proposer par le Fond Vert pour le Climat ; - Autorise la transformation des voyages prévus dans les composantes 1 et 2 du projet en mission de terrain pour évaluer les options d'adaptations et les bonnes pratiques. 	<ul style="list-style-type: none"> - Autorise la mise en place d'un groupe d'experts national sur l'évolution du climat (GENEC) ; - Autorise la reprogrammation des activités de l'années 2020 non encore exécutés et de leurs budgets à l'année 2021. 	<ul style="list-style-type: none"> - Entérine la proposition d'avenant au document projet de mis en place d'un système national de "green bonds" de la part du Ministère de l'Economie et des Finances ; - Entérine la proposition de prolongation de la fin du projet initialement prévu le 31 juillet 2020 au 31 juillet 2021.

4. RECOMMANDATIONS DU COPIL

A l'endroit des deux (02) coordinateurs des trois (03) projets, le Comité de Pilotage a recommandé :

- La préparation d'un kit de présentation sommaire des projets pour les membres du COPIL pour la prochaine réunion ;
- La préparation du rapport financier à mi-parcours de mise en œuvre des projets pour la prochaine réunion ;
- La transmission de tous les documents de travail des prochaines réunions avec les courriers d'invitation ;
- La synergie d'actions entre les trois projets et les autres initiatives de lutte contre les Changements Climatiques ;
- La clarification de l'appui politique dont les coordinateurs des projets ont besoin afin de mettre en place un cadre de synergie avec le PND du Ministère du Plan et du Développement ;
- L'implication plus renforcée des collectivités locales dans la mise en œuvre des projets.

Recommandations spécifiques		
Projet NAP-GCF	Projet CBIT-FEM	Projet NDC-SP
<ul style="list-style-type: none"> - L'alignement du Plan National d'Adaptation (PNA) au 	<ul style="list-style-type: none"> - L'évaluation de l'enveloppe budgétaire des différentes activités de l'années 2020 	<ul style="list-style-type: none"> - La pérennisation et l'actualisation quotidienne des

<p>processus de planification du PND ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une cohérente programmation des nouvelles activités du projet ; - L'octroi d'une bourse d'étude à chaque secteur prioritaire et au MINEDD ; - La préparation dans un délai d'un mois et demi avec le Groupe de Travail Adaptation (GTA) un rapport faisant mention de la composition du jury pour la sélection de la bourse, des critères de sélections et de fidélisation des bénéficiaires avec la prise en compte des risques subséquents et les calendriers. - L'augmentation du nombre de bourse à octroyer si le budget du projet le permet ; - La prise en compte du secteur privé lors des missions de terrain. 	<p>non encore exécutés et reprogrammés pour l'année 2021 ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le réaménagement du budget afin de le cadrer avec les nouvelles activités reprogrammées ; - La prise en compte du calendrier parlementaire dans la mise en œuvre de de l'activité visant à l'élaboration d'une loi sur les changements climatiques en Côte d'Ivoire ; - La visibilité du logo du FEM sur les supports de communication ; - Des propositions pour la question d'octroi de bourse post-doctorat ; - Des propositions pour l'acquisition d'équipement d'inventaire de GES. - L'implication effective de l'INS. 	<p>informations du site web en cours de mise en œuvre ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - La révision du choix de l'énergie renouvelable dans le cadre de l'investissement dans les énergies renouvelables en tenant compte de celle génératrice de revenu ; - Recruter un Expert Climat en vue d'assister le Coordonnateur du projet dans le suivi des missions des nombreux consultants et des nombreux livrables des études réalisées dans la mise en œuvre du projet.
--	---	--

5. MOT DE FIN DU PRESIDENT DE COPIL

Le président du COPIL a félicité les coordinateur et leurs équipes pour le travail abattu malgré la COVID19. Il les a exhortés à maintenir ce cap afin de parvenir aux résultats attendus à le pays à l'issue de ces projets. Après avoir rappelé les principales recommandations pour le prochain COPIL il a déclaré clos la **première réunion de la session 2020 du Comité de Pilotage Conjoint des projets, NAP-FVC, CBIT-FEM et NDC-SP.**


CONCLUSION

Au terme de la **première réunion de la session 2020 du Comité de Pilotage Conjoint des projets, NAP-FVC, CBIT-FEM et NDC-SP**, notons que l'état d'avancement des projets a été présenté au COPIL. Les nouvelles activités des projets et la reprogrammation des activités existantes ont été **approuvées et validées à l'unanimité**. Toutefois, des recommandations ont été faites pour une meilleure mise en œuvre des trois (03) projets.

ANNEXE 1 : Etat financier des projets

ANNEXE 2 : Note technique sur les projets

ANNEXE 3 : Photographie de la réunion

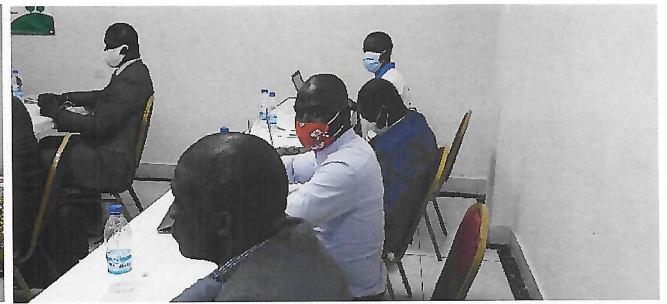



AR 

ANNEXE 4 : Liste de présence de la réunion



PREMIERE REUNION DU COMITE DE PILOTAGE CONJOINT DES PROJETS NAP-GCF, CBIT-FEM ET NDC-SP DE LA SESSION 2020

Date : Mercredi 05 Août 2020
 Lieu : Hôtel La Rose Blanche, Abidjan
 Heure : 08h30-13h35

LISTE D'EMERGEMENT

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	FONCTION	CONTACT ET E-MAIL	PROVENANCE	EMERGEMENT
1	KOUADIO Perfect	MINEED	D.CA	022543 80 alkouadiop@nkead.fr	Abidjan	A.
2	EZOUA JOSEPH	PNUD	Spécialiste Programme	jozeph.ezenab@unep.org 07074618	Abidjan	[Signature]
3	ASSIE Agnès Richemond	PNCC / PNUD	Coordonnateur NDC x CBIT	richemond.agnès@unep.org 02 39 20 65	Abidjan	[Signature]
4	Jean Douglas ANASTASIAN	UNDP	Coordinateur NAP-GCF	douglas.anastasia@undp.org	Abidjan	[Signature]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
 Programme National Changements Climatiques - Cocody Riviera Palmerale, Cité du Bonheur
 Angle Rue 1119 et Rue 1132, Ilot n°12, Lot n°200, Villa n°43 - non loin de la SODECI - Tél : 22 49 60 50 / 22 54 17 40

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	FONCTION	CONTACT ET E-MAIL	PROVENANCE	EMERGEMENT
5	AKOUSSI K. JACOB	Min Pehole Energie et des EnR	CT Energie Membre	akoussijacob@yahoo.fr 20222517/49889551	Plateau	[Signature]
6	KONE TITAN	DCF	Contrôleur Financier	07418306 koro3moy@fr	-	[Signature]
7	KONE B. Alimata	CNFEH PR/FEH CI	Secrétaire Ressources	07027535 alimata3@yahoo.fr	Abidjan	[Signature]
8	MAGUIRIAGA BARADY	CCI Côte d'Ivoire	V. Pdt.	thelena@caiso.ci	ABJ	[Signature]
9	KOUTOUA Claude	CGECI	Président Commission E-Phase	kamouclaud@hotmail.fr	Abj	[Signature]
10	SANOGO Mohamed	MINEED PNCC	Coordinateur	08008146 msanogo24@gmail.com	Abj	[Signature]
11	YAO Serge Alain	UVICOCI	Directeur DPCDL	48 30 66 45 sergealain.yao@yahoofr	Abj	[Signature]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
 Programme National Changements Climatiques - Cocody Riviera Palmerale, Cité du Bonheur
 Angle Rue 1119 et Rue 1132, Ilot n°12, Lot n°200, Villa n°43 - non loin de la SODECI - Tél : 22 49 60 50 / 22 54 17 40

AK [Signature]

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	FONCTION	CONTACT ET E-MAIL	PROVENANCE	EMARGEMENT
12	Kourouye Bénié Bria	Ministère des Eaux & Forêts Cabinet	Chargé d'Etude	bbkourouye84@gmail.com	Abidjan	
13	SOW MASSIRE	MIN. HYDRAULI	S/D ETUDES HYDROLOGIE	sow-mass@yahoo.fr	Abidjan	
14	AGBRI Lako	PNUD	Expert Climat	lako.agbri@undp.org 0544 4223	Abidjan	
15	YAN N'NA WAGUE SOW ERIC	PNCC	A-T	ericwagued@gmail.com	Abidjan	
16	Guiraud Pacôme Erneste	PNUD	Expert Genre NAP-GCF	57476745 pacome.guiraud@undp.org +225 07 25 25 07	Abidjan	
17	Houdou Kouadio Emanuel	MINEP PNCC	Chef de Cellule	houkouadio@gmail.com	Abidjan	
18	ZAKA GATE TRENKIC	MINEP DLCC	S/D	0713 7984 zakagate@gmail.com	Abidjan	

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Programme National Changements Climatiques – Cocody Riviera Palmerie, Cité du Bonheur
Angle Rue 1119 et Rue 1132, Ilot n°12, Lot n°200, Villa n°43 – non loin de la SODECI – Tél : 22 49 60 50 / 22 54 17 40

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE	FONCTION	CONTACT ET E-MAIL	PROVENANCE	EMARGEMENT
19	AKA SEPTIME	DGSD HATED	Conseiller technique	akaseptime@yahoo.fr	Abidjan	
20	KONE Tiangoua	MINEP DLCC	Point Focal Fonds vert pour le Climat	tiangoua.kone@yahoo.fr 07267701	Abidjan	
21	Petiérmini Elisabeth	NAP GCF	A. A. F	26.40.70.76 elisebeth.bazile@undp.org	Abidjan	
22	Kouan André Jean-Yves	PNCC NDC-SP	Coordinateur Belgique	0713 5574 andjykoan@yahoo.fr	Abidjan	
23	ASSOGBA DJAMBE LOUES	PNCC MINEP	R.A.F	09 46 49 86 djambeloues@yahoo.fr	Abidjan	
24	JAPI LIONEL LEROY	PNCC	Assistant Technique	09 14 77 00 japileroy@gmail.com	Abidjan	
25						

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Programme National Changements Climatiques – Cocody Riviera Palmerie, Cité du Bonheur
Angle Rue 1119 et Rue 1132, Ilot n°12, Lot n°200, Villa n°43 – non loin de la SODECI – Tél : 22 49 60 50 / 22 54 17 40

AP

ANNEXE 5 : Fiche de discussions du Projet NAP-GCF

Composantes	Activité dans le projet	Modifications à apporter	Recommandations du COPIL
Projet de renforcement de l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques dans la planification du développement en Côte d'Ivoire (NAP-GCF)			
<p>RÉSULTAT 1 : LE CADRE INSTITUTIONNEL POUR L'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LES CAPACITÉS NATIONALES POUR DÉVELOPPER UNE BASE DE CONNAISSANCES SUR L'ACC SONT RENFORCÉS.</p>	<p>1.1.2.5. Offrir deux (02) bourses pour des formations continues au profit du personnel issu du MINEDD et des autres ministères afin de promouvoir l'intégration de l'ACC dans le développement (02 personnes/an)</p>	<p>Bourses de formation : Désignation par Ministères Mise en place d'un jury pour la sélection Identifier 3 ou 4 personnes du COPIL</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Octroyer un poste à chaque secteur ; - Proposition de Critères pertinents pour bénéficiaire des formations ; - Identifier les points critiques, les gaps à combler avant la sélection ; - Mettre les infos sur les critères à la disposition du COPIL ; - Travailler sur la base des risques dans la sélection ; - Augmenter le nombre de bourse si les ressources sont adéquates - Groupe de travail technique adaptation pour les réflexions dans un délai de 1.5 mois.
	<p>1.2.3.2. Octroyer 10 bourses (subventions) à des étudiants de niveau Master, Doctorat ou Post-Doctorat pour des activités de</p>	<p>Bourses de recherche : Sous forme de Consultant National Validation de méthodologie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Appel à candidature pour sélection ; - Travailler sur la base des risques dans la sélection ;

	terrain sur l'ACC en lien avec l'utilisation et l'application de différents outils (Télédétection, SIG, cartographie des écosystèmes, Economie, Finances, etc.) pour soutenir le processus PNA et l'ACC		<ul style="list-style-type: none"> - Augmenter le nombre de bourse si les ressources les ressources sont adéquates ; - Groupe de travail technique adaptation pour les réflexions dans un délai de 1.5 mois
RÉSULTAT 2 : LES PRIORITÉS D'ADAPTATION POUR LES CINQ SECTEURS LES PLUS VULNÉRABLES SONT IDENTIFIÉES DANS LE DOCUMENT CADRE DU PNA, ET L'INTÉGRATION DANS LA PLANIFICATION NATIONALE ET SECTORIELLE DU DÉVELOPPEMENT EST AMÉLIORÉE.	Voyage dans les composantes 1 et 2	Transformer une partie en mission de terrain pour évaluer les options d'adaptations et les bonnes pratiques	Ok
Prolongation	Prolongation	Le Fonds Vert pour le Climat a prolongé de Six mois le projet (Prolongation pas systématique/Endossement du COPIL)	Ok
Reprogrammation de certaines activités prévues cette années	Nouvelles activités	-Appui à la stratégie nationale de lutte contre la	Ok

		sécheresse et les projets associés - Appui au cadre national des Services Climatiques (Consultance et ateliers)	
--	--	---	--

AR

ANNEXE 4 : Fiche de discussions du Projet CBIT-FEM

Composantes	Activité dans le projet	Modifications à apporter	Recommandations du COPIL
Projet d'amélioration du système de transparence pour une action climatique renforcée en Côte d'Ivoire (CBIT-FEM)			
<p>Produit 1 : Les arrangements institutionnels pour la transparence climatique sont en place et efficaces</p>	<p>Établir un mécanisme de coordination interministériel ou un comité national avec toutes les parties prenantes (publique, secteur privé, société civile, université, etc.), en mettant l'accent sur une participation active des femmes</p>	<p>Mise en place d'un groupe d'experts national sur l'évolution du climat (GENEC)</p>	<p>Ok</p>
<p>Produit 2 : La fourniture d'outils, de formation et d'assistance pour répondre aux dispositions en matière de transparence établies dans l'Accord de Paris est assurée</p>	<p>Développer des facteurs d'émission et données d'activités spécifiques au pays avec focus sur les secteurs de l'énergie et AFOLU</p>	<p>Bourses de recherche post-doctorat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Acquérir (louer ou acheter) le matériel complet nécessaire à la formation ; - Développer des partenariats avec les universités et Centres de recherche ; - Impliquer l'INS devenu l'ANS.
<p>Reprogrammation de certaines activités prévues cette année</p>	<p>Certaines activités prévues cette année ne peuvent pas être exécutées, dues à certains événements survenus au cours de l'année et à un décalage de certains agendas nationaux</p>	<p>Reprogrammer ces activités et leurs budgets à l'année prochaine</p>	<p>Ok</p>

AR



	(révision des NDC, processus green bonds, etc.)		
--	---	--	--

ANNEXE 5 : Fiche de discussions du Projet NDC-SP

Composantes	Activité dans le projet	Modifications à apporter	Recommandations du COPIL
UNDP NDC Support Programme en Côte d'Ivoire (NDC-SP)			
<p>Produit 3 : L'état de mise en œuvre des NDC est évalué afin de rehausser l'ambition des NDC de la Côte d'Ivoire</p>	<p>3.2.1. Explorer les différentes options pour rehausser l'ambition des NDC au niveau des 4 secteurs clés de l'atténuation (Énergie, Agriculture, Foresterie et Déchets) au regard de l'évolution des nouveaux documents stratégiques de chaque secteur et des potentialités d'investissements approuvés.</p> <p>3.2.2. Intégrer chacune des options dans un modèle de scénario d'atténuation afin d'établir les bases de la mise à jour des NDC.</p> <p>3.2.3. Élaborer un document de plaidoyer à l'attention des décideurs sur les options sectorielles à mettre en œuvre pour accroître le développement bas-carbone du pays.</p>	<p>3.2.1. Appuyer la révision des NDC au niveau du secteur des Déchets, au regard de l'évolution des nouveaux documents stratégiques du secteur et des potentialités d'investissements approuvés (scenarios de projections, options pour rehausser l'ambition, plaidoyer à l'endroit des décideurs, etc.)</p> <p>3.2.2. Recruter un expert genre pour accompagner la compilation du document NDC.</p> <p>3.2.3. Appuyer la conception et le design du document final NDC.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Indiquer le type d'appui (technique, politique etc.); - Envisager les webmasters pour avoir un site qui informe de façon régulière; - Se rapprocher de la CGECL pour ce qui est des formations technologiques à l'endroit du secteur privé

<p>Produit 4 : Le secteur privé est davantage outillé pour mieux s'impliquer dans la mise en œuvre des NDC</p>	<p>4.1.4. Sélectionner un nombre de projets (2 ou 3) portés par le secteur privé pour une faisabilité technique et financière et pour la mise en relation "match-making" avec des investisseurs potentiels.</p>	<p>4.1.4. Construire un pipeline de projets climatiques d'investissements pour la levée des fonds dans le cadre des Green Bonds</p>	<p>Accompagner les acteurs pour être éligible</p>
	<p>4.2.1. Concevoir un dispositif de « derisking » pour les investissements dans le secteur des énergies renouvelables, ainsi que les textes réglementaires y afférents.</p>	<p>4.2.1. Mener une analyse sur les risques à l'investissement dans les énergies renouvelables (Solaire photovoltaïque) et proposer des mesures d'atténuation appropriées à ces risques.</p>	<p>Faire un diagnostic des Energies renouvelables en Côte d'Ivoire ; Faire un approfondissement des Energies renouvelables existants</p>
<p>4.3 Mettre en place un système national de "green bonds"</p>	<p>Proposition d'avenant au document projet de la part du MEF : cette activité est proposée pour être mise sous le Lead de la Direction de la Dette Publique et des Dons (DDPD) qui travaillera en collaboration avec le MINEDD.</p>	<p>Ok</p>	
<p>Prolongation de la durée du projet</p>	<p>Initialement prévue pour prendre fin le 31 décembre 2020</p>	<p>Prolongation proposée : 31 juillet 2021, car le projet est prévu pour 02 ans et a démarré en août 2019 au lieu de janvier 2019.</p>	<p>Ok</p>
