



INFORME SEMESTRAL DE ANÁLISIS DEL PROGRESO DEL PROYECTO NDC - SP

Semestre: Julio – diciembre 2019



Fecha de elaboración del informe: 27 de febrero de 2020

I. AVANCE ACUMULATIVO

(contiene un resumen porcentual del avance programático y financiero, no detalles de procesos)

En este período se alcanzó un avance programático promedio de **86% según detalle del Gráfico No. 1**. Como se puede apreciar la actividad codificada A3 R3 no ha sido ejecutada, debido a que no fue posible realizar la formalización de dicha actividad con el Ministerio de Economía y Finanzas y no se tuvo las condiciones habilitantes estratégicas necesarias. Sin embargo, esta actividad será considerada como prioritaria en la fase dos del NDC – SP que tendrá hasta 2021 para avanzar en esta temática, en vista de que el MEF es una entidad clave en el proceso de ejecución de ésta. La ejecución financiera alcanza un cumplimiento del **99.10%**, según detalle de los gráficos No. 2 y 3. Respecto al remanente del **0.90%** se están realizando las indagaciones al interior de PNUD para ver la factibilidad de que este saldo sea trasladado a la nueva fase del proyecto para cubrir en parte los gastos previstos en la nueva fase del proyecto.

Gráfico No. 1

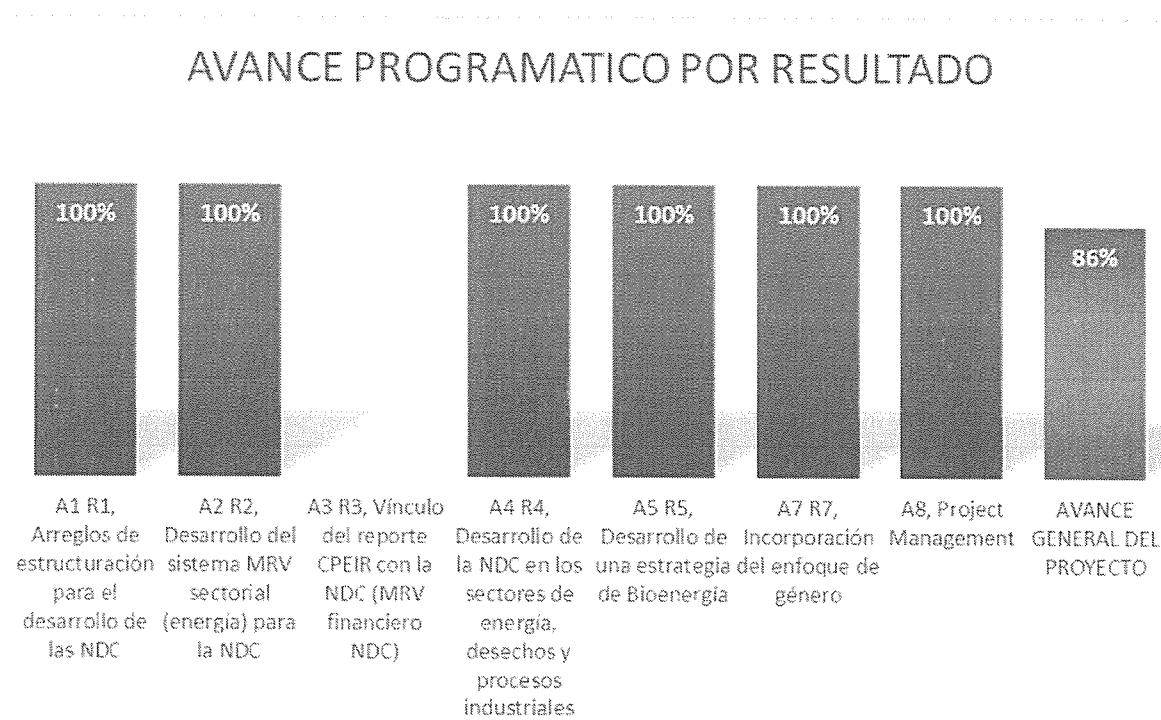




Gráfico No. 2

RESUMEN FINANCIERO
Diciembre 2019
1%

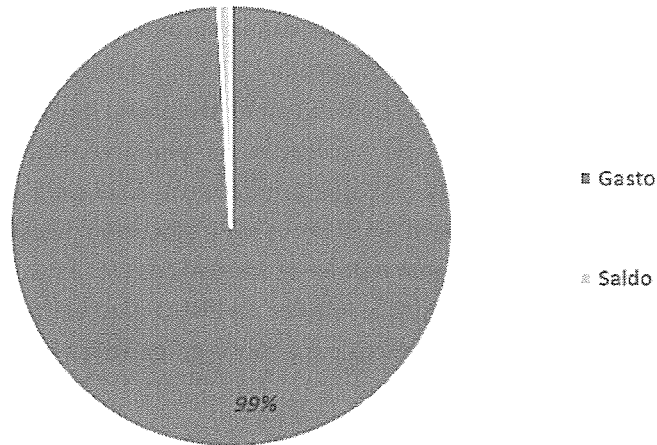


Gráfico No. 3

Proyecto 0105178

2019

ACTIVIDADES	Presupuesto 2019	Gasto Dic 31, 2019	Compromiso	Total	Saldo por Ejecutar	Porcentaje ejecutado
ACTIVIDAD 1	\$ 134,58	\$ 134,58	\$ -	\$ 134,58	\$ -	100
ACTIVIDAD 2	\$ 39.015,70	\$ 39.218,91	\$ -	\$ 39.218,91	\$ (203,21)	101
ACTIVIDAD 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0
ACTIVIDAD 4	\$ 42.902,71	\$ 42.627,58	\$ -	\$ 42.627,58	\$ 275,13	99
ACTIVIDAD 5	\$ 4.838,98	\$ 4.839,12	\$ -	\$ 4.839,12	\$ (0,14)	100
ACTIVIDAD 7	\$ 159.980,92	\$ 158.509,97	\$ -	\$ 158.509,97	\$ 1.470,95	99
ACTIVIDAD 8	\$ 229.861,97	\$ 227.129,72	\$ -	\$ 227.129,72	\$ 2.732,25	99
Total Proyecto 0105178	\$ 476.734,86	\$ 472.459,88	\$ -	\$ 472.459,88	\$ 4.274,98	99
Total Funds	\$ 476.734,86	\$ 472.459,88	\$ -	\$ 472.459,88	\$ 4.274,98	99
Output 105178 Funds 28310 Donor 12711	\$ 476.734,86	\$ 472.459,88	\$ -	\$ 472.459,88	\$ 4.274,98	99



IN CONTRIBUTION TO THE
NDC PARTNERSHIP
ACCELERATING GROWTH AND DEVELOPMENT ACTION

Supported by
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety
Based on a decision of the German Bundestag



Federal Ministry for Economic Cooperation and Development




5



II. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

(Contiene información sobre el progreso del proyecto en función de la matriz de marco lógico y sus indicadores. Presentar datos desagregados por sexo, cuando sea aplicable y siempre que el indicador respectivo sea género sensible. Además, se recomienda usar lenguaje inclusivo a lo largo de todo el documento).



- Actividad pausada
- Actividad en proceso
- Actividad cumplida
- Actividad no iniciada

RESULTADOS		R1:	Arreglos de estructuración para el desarrollo de las NDC	
INDICADOR SEGÚN PRODOC	PRODUCTOS	AVANCE (color)	AVANCE SEMESTRAL (narrativo de forma concreta que muestran avances en función de resultados)	LINKS (Links a documentos de productos terminados o publicaciones que dan soporte al cumplimiento de dicho resultado)
Number of new institutional frameworks for NDC implementation established	Producto 1.1 Climate Change Interinstitutional Committee established for NDC delivering implementation, monitored and its operation enhanced attending issues observed during 2018-2019		<ul style="list-style-type: none"> • En el marco del MoU entre el MAE y ONU Mujeres se ha cumplido con la entrega de la propuesta metodológica para la integración del enfoque de género en la estructura, funcionamiento y toma de decisiones del Comité Interinstitucional de Cambio Climático (Ver en medio de verificación del producto 4.1.) • Presentación de la Primera NDC del Ecuador 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Producto CICC</u> • <u>Folleto de la NDC</u>
Number of gender responsive	Producto 1.2 National Gender Methodology for		<ul style="list-style-type: none"> • En el marco del MoU entre el MAE y ONU Mujeres se ha cumplido con la entrega de los productos que 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Plan de Trabajo CICC</u> • <u>Plan de Trabajo NDC</u>




IN CONTRIBUTION TO THE
NDC PARTNERSHIP
ACCELERATING CLIMATE ACTION THROUGH PARTNERSHIP

Supported by:
 Ministry of the Environment, Water and Fisheries
Based on a decision of the German Bundestag



Ministry for Economic Cooperation and Development



5




<p>approaches integrated into institutional frameworks developed in output 1.1</p>	<p>Climate Change integrated into the NDC implementation plan.</p>	<p>corresponden a las metodologías de género para el CICC, NDC y MRV, mismos que están bajo revisión final del MAE. Se prevé contar con los productos finales aprobados por el MAE en enero 2020. El componente de finanzas climáticas con enfoque de género no pudo ser finiquitado en 2019 por falta de acceso a la información. El día 16 de enero de 2020 se ha mantenido una reunión con la Subsecretaría de Cambio Climático para definir el alcance y directriz del producto faltante y se espera que este culminado el I trimestre de 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se finalizó con el primer proceso de fortalecimiento de capacidades para la Subsecretaría de Cambio Climático, proyectos relacionados y actores claves sobre género y cambio climático. El primer taller de inducción se llevó a cabo el 23 de noviembre de 2018 y septiembre del 2019, se contó con el apoyo del Proyecto <i>Readiness</i> y la facilitación de la Fundación Futuro Latinoamericano FFLA-CDKN (desarrollo metodológico y herramientas pedagógicas). Este proceso aporta en la formación de capacidades para fortalecer los procesos de gobernabilidad y respuestas técnicas en la gestión del cambio climático. Se desarrollaron siete (7) talleres con alrededor de 70 participantes. Una caja de herramientas se desarrollará para extender el proceso a otras instituciones públicas durante el primer semestre de 2020. Se han desarrollado cinco (5) mesas técnicas de género y cambio climático en la que participan
<ul style="list-style-type: none"> Plan de Trabajo MRV Systematization of gender and climate change capacities and statistics (March), Reinforcing knowledge on gender and climate change (April), Experiences of work in gender and climate change (May), Communication and gender-sensitive language (July), Limits in gender incorporation (July), Gender in climate change (July); Components of integral gender and climate change (September) Technical reports: I. technical, II technical, III technical, IV technical 		



Supported by:
 Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
 German Development Cooperation (GIZ)
 Based on a decision of the German Bundestag



9



<p>Gender analysis conducted (y/h)</p>	<p>Producto 1.3 Base line in "gender and climate change" of the institutional structures.</p>	<p>cooperación y academia bajo el liderazgo de MAE, CNIG, Coordinación de NDC SP para la mejora permanente de la política pública.</p> <ul style="list-style-type: none"> En el marco del MoU entre el MAE y ONU Mujeres se cuenta con la versión final de la línea base e indicadores de género para el MRV entregada. Se espera la aprobación por el MAE y CNIG hasta enero 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> <u>Producto Monitoreo Reporte y Verificación MRV</u>
<p>RESULTADOS</p> <p>R2: Desarrollo del sistema MRV sectorial (energía) para la NDC.</p>			
<p>INDICADOR SEGÚN PRODOC</p> <p>Number of MRV and transparency systems enhanced for NDC implementation</p>	<p>PRODUCTOS</p> <p>Producto 2.1 Comprehensive MRV system designed and piloted for the energy sector.</p>	<p>AVANCE (color)</p> <p>AVANCE SEMESTRAL (narrativo de forma concreta que muestran avances en función de resultados)</p> <ul style="list-style-type: none"> Se contrató un equipo consultor para el Diseño e implementación de un sistema MRV piloto para el sector de energía. En el marco del MoU con ONUM, se cuenta con la línea base e indicadores de género para el MRV y el respectivo pilotaje en el sector Energía, subsector Transporte. Producto entregado, se espera aprobación del MAE y CNIG en enero 2020. 	<p>LINKS (Links a documentos de productos terminados o publicaciones que dan soporte al cumplimiento de dicho resultado)</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Términos de Referencia para el diseño e implementación de un Sistema MRV en el sector eléctrico del sector energía (Revisión).</u> <u>Documentos Piloto transversalización de género en sector transporte</u>
<p>Gender equality indicators and data system established to track and report on gender responsive mitigation measures</p>	<p>Producto 2.2 MRV for energy sector that includes gender-sensitive indicators.</p>	<p>Productos entregados: P1 (norma técnica), P2 (conceptualización), P3 (MRVs nacionales) y P4 (propuesta de marco metodológico) de la consultoría: <i>Propuesta de marco conceptual y estructura del sistema de MRV doméstico del Ecuador.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> En el marco del MoU con ONUM se desarrolló la metodología de género para el Sistema de 	<ul style="list-style-type: none"> <u>Productos final Enfoque de género MRV</u> <u>Producto 03: Análisis técnico de los Sistemas MRV nacionales y regionales</u> <u>Producto 04: Propuesta de marco conceptual y estructura del sistema de MRV doméstico del Ecuador</u>



IN CONTRIBUTION TO THE
NDC PARTNERSHIP
PARTNERSHIP
FOR THE
NATIONAL
DETERMINED CONTRIBUTION
AND THE
NATIONAL
ADAPTATION
PROGRAMME OF ACTION


Supported by:
Spain **Ministry for Ecological Transition and Demographic Challenge**
Spain **Ministry for Ecological Transition and Demographic Challenge**
Spain **Ministry for Ecological Transition and Demographic Challenge**
Spain **Ministry for Ecological Transition and Demographic Challenge**



Ecuador's Ministry for Economic Cooperation and Development



5



			<p>Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV). Se cuenta con la versión final entregada por ONUM que está bajo la revisión del Comité de Género del Ministerio del Ambiente y se espera su aprobación en enero 2020 (Fuente de verificación producto 1.3)</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó el diseño e implementación de un sistema MRV eléctrico para el sector eléctrico, que considere las iniciativas de la NDC (Generación con Centrales Hidroeléctricas, OGE&EE y PEC). Esta plataforma cuenta con manuales de usuarios y administradores para su rápida actualización desde la fuente (ARCONEL) 	<p>Diseño y elaboración de un sistema MRV piloto para el sector eléctrico</p>
R3: Vínculo del reporte CPEIR con la NDC (MRV financiero NDC).				
RESULTADOS				
Number of new budget processes strengthened to deliver NDC commitments and incorporate climate change expenditures in NDC programing	Producto 2.3. MRV pilot in energy			<ul style="list-style-type: none"> Producto 2: Propuesta de marco conceptual y estructura del Sistema MRV Doméstico
Roadmap developed to enhance the expenditure and classification tool, including gender-	Producto 3.1 protocols for the institutionalization of the climate budget tracking into the national financial structure in agreement with SENPLADES (National Planning Secretariat)		<ul style="list-style-type: none"> Contrato adjudicado para la Elaboración de un marco metodológico para Medición, Reporte y Verificación (MRV) para medidas y acciones de mitigación del cambio climático, donde se aborda el MRV financiero. 	
	Producto 3.2 road map with recommendations to mainstream gender into the climate budget tracking		<ul style="list-style-type: none"> En el marco del MoU entre el MAE y ONU Mujeres, ONU Mujeres entregó el documento: finanzas climáticas con enfoque de género a la Comisión de Género de la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente. El documento se encuentra en revisión del Comité de Género del Ministerio del 	<p>Borrador de propuesta para la incorporación de género en las finanzas climáticas.</p>

MINISTERIO DEL AMBIENTE



sensitive indicators (Y/N)	Ambiente. Las autoridades nacionales han solicitado un replanteamiento del producto en base a la situación político/técnica actual.	
RESULTADOS	R4: Desarrollo de la NDC en los sectores de energía, residuos y procesos industriales.	
Number of NDC sectors including gender-sensitive analysis	Producto 4.1 NDC sectors including gender-sensitive analysis	<ul style="list-style-type: none"> Se llevó a cabo los días 10 y 11 de abril el primer Encuentro de Mujeres y Cambio Climático en el que participaron 70 mujeres de organizaciones de todo el país. Este encuentro se llevó a cabo con la coordinación del MAE, NDC-SP, ONU Mujeres, ProAmazonía y MAG. Se desarrolló el proceso de análisis de género sectorial y lineamientos para la incorporación de medidas para la igualdad en las iniciativas priorizadas en la NDC. En el marco del MoU entre el MAE y ONU Mujeres, los productos desarrollados han sido entregados para la aprobación final del Comité de Género de la SCC del Ministerio del Ambiente.
Number of sectors where mitigation targets and measures have been defined and disaggregated	Producto 4.2 Targets and measures defined for energy, waste and industrial processes sectors, integrated into one NDC country document	<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron tres talleres en el marco de la elaboración del plan para la implementación de la NDC. Se desarrolló la tabla de contenidos del informe del plan para la implementación de la NDC, sectores: energía, procesos industriales y residuos (escenarios incondicional y condicional). Se finalizó la elaboración de la estrategia de sostenibilidad para las iniciativas bajo el escenario
		<p><u>Video del I Encuentro Mujeres frente al Cambio Climático.</u></p> <p><u>Sistematización del Encuentro</u></p> <p><u>Producto MRV</u></p> <p><u>Producto CICC</u></p> <p><u>Producto para la implementación enfoque de género NDC</u></p> <p><u>Borrador incorporación de enfoque de género en las finanzas climáticas</u></p>
		<p><u>Sistematización taller de presentación metodología (agosto)</u></p> <p><u>Sistematización taller de presentación de avances (septiembre)</u></p> <p><u>Presentación taller presentación del plan para la implementación (octubre)</u></p> <p><u>Tabla de contenidos del informe correspondiente al plan para la implementación de la NDC.</u></p>



IN CONTRIBUTION TO THE
NDC PARTNERSHIP
FOR THE
2015-2025
PERIOD

Supported by:
Ministry for the Environment, Natural Resources and Fisheries
and **Ministry for Economic Development and Innovation**



Federal Ministry for Economic Cooperation and Development



9



			<p>incondicional de la NDC. El documento será validado por el MAE.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se finalizó la elaboración de la Estrategia de operatividad de las iniciativas del escenario condicional de la NDC. El documento será validado por el MAE. Se finalizó con la consultoría de Valoración económica inicial de las iniciativas condicionales establecidas en la NDC. 	<p>Escenario Incondicional (Propuesta técnica de la Estrategia de Sostenibilidad para los sectores de Energía, residuos y Procesos Industriales)</p> <p>Escenario Condicional (Propuesta técnica de un Plan de Operatividad de medidas condicionales)</p> <p>Metodología valoración económica</p> <p>Resultados valoración económica</p>
<p>RESULTADOS</p> <p>RS: Desarrollo de una estrategia de Bioenergía.</p>				
<p>Feasibility analysis for a bioenergy LED</p>	<p>Producto 5.1 concept of Bio-Energy (NAMA) to be linked to next version of the Ecuadorian NDC has been developed</p>		<ul style="list-style-type: none"> Entregado el primer y segundo producto de la consultoría "Diseño del marco teórico, diagnóstico y estructura de una Estrategia Nacional de Bioenergía". El contenido de la Estrategia nacional de Bioenergía está aprobado. 	<ul style="list-style-type: none"> Primer producto de la consultoría de bioenergía – Aprobado Segundo producto de la consultoría de bioenergía Bioenergía Contenido y Hoja de ruta de una estrategia nacional de bioenergía.
<p>Number of LEDs/NAMA that include a gender approach</p>	<p>Producto 5.2 Sensitivity analysis and strategies developed to mainstream a gender approach for mitigation scenarios included in the</p>		<ul style="list-style-type: none"> En el marco del MoU con ONU Mujeres se construyó una Metodología y herramientas de género para la NDC, así como el plan para la implementación y se desarrolló un pilotaje en el sector de Energía, subsector Transporte. Adicionalmente, se entregó un cuadro técnico de recomendaciones sobre Acciones correctivas de género para consideración de las autoridades nacionales. 	<ul style="list-style-type: none"> Documentos Piloto transversalización de género en sector transporte Documentos de oficialización de la mesa de bioenergía. Propuesta de la Estructura del Programa Nacional de Bioenergía



UK CONTRIBUTION TO THE
NDC PARTNERSHIP
RECOGNISING GERMANY'S
AND THE COOPERATION

Supported by:
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety
Based on: Declaration of the German Bundestag



Federal Ministry for Economic Cooperation and Development




Handwritten signature.


MINISTERIO DEL AMBIENTE



	<p>bioenergy LEDS (NAMA) to MIPRO of (Ministry of industries and productivity)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oficialización de la Mesa Interinstitucional de Bioenergía para el Desarrollo del Plan Nacional de Bioenergía. • Se desarrolló una propuesta de contenido de la Estructura del Programa Nacional de Bioenergía. 	
--	--	--	--

NOTA: Aumentar filas según el número de resultados y productos





III. APORTES A:

Describir los aportes que ha generado el proyecto, en el período de reporte, con relación a:

- a) Iniciativas de Cooperación Sur-Sur y/o Triangular: (no se considera dentro de esta categoría los intercambios entre Oficinas de País o Proyectos)
 - o *Peer Learning* Ecuador, Perú y Chile sobre la transversalización de género en las NDCs, con el apoyo de la Fundación Futuro Latinoamericano y el financiamiento de la CDKN (Agenda Intercambio Perú, Chile, Ecuador). Esta actividad se la desarrolló en Santiago de Chile. En ésta se intercambiaron experiencias con la inclusión del enfoque de género en la formulación de la NDC de Ecuador y su implementación.
 - o Cooperación con países de la región: Perú, Colombia y Chile para compartir experiencias para la implementación del MRV (Nota de prensa). Esta actividad se la desarrolló de forma virtual y se compartieron los enfoques abordados en la formulación de los MRV en cada uno de los países que participaron.
 - o Webinar Experiencia de Ecuador en la integración de género en la NDC con Guatemala (Grabación webinar)

- b) Innovación y desarrollo de capacidades nacionales: (enfoques, metodologías, procesos innovadores)
 - o Con el objetivo de concientizar a la ciudadanía en general sobre cambio climático y la formulación de la NDC se continuó con la campaña #CompromisoClimático en conmemoración del Día del Reciclaje (17 de mayo) en conjunto con el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos (monitoreo de medios).
 - o Desarrollo del proceso de capacitación en género y cambio climático para la Subsecretaría de Cambio Climático, proyectos de cooperación y actores clave.
 - o Apoyo en la organización del Primer Seminario de Economía Circular, realizado el 13 y 14 de junio en el auditorio mayor de la PUCE.
 - o Colaboración en la gestión de obtención de cooperación técnica de CTCN, en el marco de la elaboración de una línea base de la temática de economía circular.
 - o Generación de estrategia de comunicación del compromiso climático del Ecuador integrado a la Estrategia del Ministerio del Ambiente en el marco de la estrategia de comunicación y gestión del conocimiento del Programa de Apoyo a la NDC (borrador en proceso de aprobación).
 - o Tras analizar la brecha de información y comprensión que tienen los medios nacionales en torno a la NDC y su relevancia a nivel nacional e internacional, el Programa de Apoyo a la NDC realizó un desayuno con 10 medios nacionales para presentar el compromiso climático del país y dialogar en torno a las mejores alternativas para comunicarlo a la ciudadanía (agenda y PPT adjunta).




- Se realizó en conjunto con GIZ, un taller de capacitación en cambio climático para especialistas en género, noviembre del 2019 ([Agenda](#))
 - Se realizó en conjunto con la GIZ un Café Diálogo sobre Género y Cambio Climático ([Nota de prensa](#))
 - En coordinación con la oficina de comunicaciones de PNUD se logró la publicación de un artículo sobre cambio climático en la publicación ([Actores sostenibles 2019 Capt 4](#))
 - Participación en el Taller de Estrategias a Largo Plazo, organizado por la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC) en Madrid ([Conclusiones](#))
 - Reunión técnica para aplicación del modelo M3E en el sector residuos y visita de campo a proyectos de mitigación en los alrededores de Madrid ([Presentación](#))
 - Cooperación entre AFD, PNUD para el diseño e implementación del Piloto MRV del sector eléctrico ([Boletín](#))
 - Participación en la COP25, Evento paralelo organizado por Perú, Euroclima y la FFLA-CDKN: Incorporando los enfoques de género, intercultural e intergeneracional en la acción climática ([Agenda](#))
- c) Avances en la promoción de la igualdad de género:

Se continúa con el proceso de formación en género y cambio climático para el Ministerio del Ambiente, proyectos de cooperación y socios claves. Debido a los buenos resultados alcanzados, la Fundación Futuro Latinoamericano FFLA y CDKN han ofrecido su apoyo financiero y técnico para compilar las experiencias en una caja de herramientas y continuar con el proceso para el segundo semestre de 2019 ([drive fotos](#))

La Mesa técnica de género y cambio climático está aportando por un lado en el proceso de fortalecimiento de los mecanismos de gobernabilidad de cambio climático, así como de los mecanismos de género; pero también en la generación de recomendaciones técnicas para el mejoramiento de la política pública de cambio climático, género y su integración. Esto se espera ver reflejado en el Plan para la implementación de la NDC. Debido a los buenos resultados alcanzados, la Fundación Futuro Latinoamericano FFLA y CDKN han ofrecido su apoyo financiero y técnico para continuar con el proceso de consolidación de la mesa que se ha planteado funcione hasta el 2025 como paraguas de la NDC ([sistematizaciones](#)).

- d) Inclusión de sectores tradicionalmente excluidos (indígenas, campesinos, mujeres solteras cabezas de hogar, ancianos, jóvenes, etc.)
- Se llevó a cabo los días 10 y 11 de abril el Primer Encuentro de mujeres y cambio climático en el que participaron 70 mujeres de organizaciones de todo el país. Este encuentro se llevó a cabo con la coordinación del MAE, NDC-SP, ONU Mujeres, ProAmazonía y MAG. ([boletín de prensa](#))
 - Informes de cada taller de capacitación a funcionarios de la SCC y proyectos aliados: ([sistematizaciones](#))

NOTA: Para cada tema reportado, se deberá incluir un link con la evidencia que lo sustente.





IV. CUELLOS DE BOTELLA/TEMAS CRÍTICOS

(Identificar los principales cuellos de botella o temas críticos que se han superado en el período de reporte, las barreras en materia de promoción de la igualdad de género, las acciones implementadas para superarlos y las tareas pendientes o que no han podido ser atendidas, explicando las razones para aquello. requieren acción inmediata, definiendo de quien, dentro del Ministerio, PNUD o socio implementador, se requiere apoyo)

- Por temas coyunturales y de coordinación con otros programas y proyectos, actualmente los planes de implementación se encuentran en revisión por parte del Ministerio del Ambiente, para su posterior validación sectorial.
- Frente a la problemática identificada en un inicio con relación al desconocimiento para abordar género con el personal técnico de cambio climático, se generaron estrategias de diálogo bilateral y un mejoramiento de las herramientas pedagógicas, lo que ha resultado en mejoras parciales.
- Se realizó la planificación del evento de presentación pública de la NDC del Ecuador, evento que se suspendió. Para el mismo se generó una estrategia comunicacional conjunta con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que incluyó una campaña en redes sociales, un video explicativo, un video loop para eventos y material impreso de difusión que incluye carpeta y folleto explicativo de la NDC del Ecuador.
- Cambios institucionales de las entidades responsables de las iniciativas de la NDC, ha producido que los puntos focales se deban ratificar o actualizar. Esta situación incluye los cambios en la Subsecretaría de Cambio Climático.
- La cooperación de la Oficina Española de Cambio Climático para la aplicación del modelo M3E en el sector residuos no ha sido fluida, complicándose por la indisponibilidad de tiempo de parte de los funcionarios de dicha entidad por la organización de la COP.
- Frente a la barrera identificada de falta de información en género y cambio climático, el Programa de Apoyo a la NDC con el apoyo técnico del Consejo Nacional de Igualdad de Género, ha diseñado una nota de concepto y la hoja de ruta para el desarrollo del Plan de Acción de Género y Cambio Climático del Ecuador. El plan de acción contará con lineamientos de política con el objetivo de incidir en la toma de decisiones de cambio climático de tal forma que, las cuestiones de género sean un eje transversal dentro de la política pública del país. Actualmente se cuenta con la cooperación de CARE Internacional, FFLA-CDKN, UICN, GIZ y se espera el apoyo de AECID, WWF y AFD.
- Dentro del Plan de Acción de Género y Cambio Climático se prevé la construcción de un geoportal de información que combine datos oficiales tanto de cambio climático como de género. El diseño de este sistema de información está a cargo de un grupo específico de la Mesa Técnica de Género y Cambio Climático conformado por Grupo Faro, el Consejo Nacional de la Igualdad de Género, la Universidad Andina Simón Bolívar y el Ministerio del Ambiente, a través del Programa de Apoyo a la NDC. Actualmente se cuenta con el apoyo del Climate Help Desk (LEDS LAC) y las Unidades de Género y Estadísticas de la CEPAL para la conceptualización, programación y plan de información estratégica 2020-2025.

g



V. EVENTOS Y/O ACCIONES CLAVE A DESARROLLARSE EN EL SIGUIENTE PERIODO

(Contiene eventos relevantes externos como conversatorios, congresos, webinars, capacitaciones formales.)

- Aprobación de los TdRs de especialistas: financieros (2), economista y USCUS para la siguiente fase del proyecto; y contratación de los profesionales seleccionados.
- Contratación del asistente de género.
- Incorporación del nuevo coordinador del programa.
- Seguimiento al proceso de formulación del Libro Blanco de Economía Circular.
- Finalización de la propuesta de Estrategia Nacional de Bioenergía.
- Divulgación de resultados de participación en COP y taller RIOCC.
- Proceso de licitación, producción y campaña de video de realidad inmersiva
- Desarrollo del Plan de Acción de Género y Cambio Climático mediante un diálogo nacional con diferentes organizaciones de mujeres y personas LGBTI.
- Diseño y construcción del Sistema de Información de Género y Cambio Climático
- Fase 2 de fortalecimiento de capacidades en género y cambio climático
- Desarrollo de la hoja de ruta de implementación de metodologías de trazabilidad de gasto climático.
- Incorporación de las correcciones realizadas por el MAE a los Planes de Implementación desarrollados en la fase I del NDC-SP y acompañamiento técnico al MAE para la presentación de los productos finales, considerando que el equipo técnico se encuentra ya cumpliendo actividades correspondientes a la fase II del proyecto.


VI. RESUMEN DE ADQUISICIONES PENDIENTES EN EL SIGUIENTE PERIODO *(según Plan de Adquisiciones):*

Actividad	Atlas Budget Description	Breve Descripción de Bienes o Servicios	Costo TOTAL Estimado USD	Tipo de Adquisición	Estado

VII. ASPECTOS RELEVANTES DE GESTIÓN DEL SEMESTRE QUE DEBAN SER DESTACADOS
(max. 500 palabras)

Durante el segundo semestre de gestión se puede resaltar lo siguiente:

- Se llevaron a cabo los tres talleres para la elaboración del Plan para la Implementación de la NDC
- Participación en *NDC Global Conference* (Berlín, julio 2019)
- Intercambio de experiencias Chile, Perú y Ecuador (Chile, julio 2019)





- Desarrollo del Webinar Ecuador-Guatemala (Julio, 2019)
- Expositor en el proceso de fortalecimiento de capacidades en financiamiento climático desarrollado por el proyecto GCF Readiness con la sesión: Fortalecimiento de Procesos para la Gestión del Cambio Climático en Ecuador. Modulo 6: Salvaguardias Ambientales y sociales (Agosto 2, 2019)
- Se acogió la Misión Regional de UNDP en relación al estudio de 8 países sobre la integración de la temática de género en las agendas nacionales de cambio climático (28, 29 y 30 de octubre de 2019).
- Participación en la Reunión Anual de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC) en Madrid y Andorra (4 al 8 de noviembre de 2019) con la presentación: “Integración de la temática de género en las estrategias de largo plazo, consideraciones para economías bajas en carbono”.
- Se participó como co-organizador y expositor en el “Café Diálogo” organizado por la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) sobre Género y Cambio Climático (15 de noviembre).
- Expositor en el proceso de fortalecimiento de capacidades de la plataforma LEDES LAC, en el Webinar 13, en la sesión Políticas Climáticas y Adaptación sensible al género LEDES LAC Euroclima (21 de noviembre).
- Participación en Taller: Estrategias a Largo Plazo, organizado en Madrid, por la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC).
- Participación en reunión técnica con funcionarios de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) para la aplicación del modelo M3E en el sector residuos y visita de campo a proyectos de mitigación.
- Participación en la COP25: Evento paralelo organizado por Perú, Euroclima y la FFLA-CDKN: Incorporando los enfoques de género, intercultural e intergeneracional en la acción climática.

VIII. RESUMEN DE RESPUESTAS GERENCIALES A RIESGOS Y PROBLEMAS


(Resume y actualiza lo más relevante respecto al avance o cambios en lo planteado en la matriz de riesgos original del ProDoc)

Existen constantes **cambios con las autoridades** en los diferentes ministerios lo que podría ocasionar demoras en la ejecución de las actividades

RG: El proyecto mantiene una coordinación permanente a nivel técnico con las diferentes instituciones para asegurar continuidad de actividades en caso de cambio de autoridades, manteniendo el contacto con los funcionarios que han participado en las actividades organizadas por el proyecto.

Los procesos operacionales de la oficina país pueden causar demoras importantes en el avance del proyecto. Los **procesos de aprobación** de productos dentro del MAE pueden causar importantes demoras en la ejecución presupuestaria del proyecto

RG: El proyecto está anticipando sus actividades en relación a lo programado en el POA, con el objetivo



g



desde el MAE.

El trabajo conjunto con ONU Mujeres ha tenido algunos desafíos, en especial en lo referente con el control de calidad de los productos presentados por consultores a su cargo, así como el incumplimiento de plazos y acuerdos.

RG: Se están organizando reuniones de coordinación para identificar los problemas y plantear soluciones conjuntas entre el NDC-SP, ONU Mujeres y la OP. Los productos han sido entregados por ONU Mujeres y se encuentran en fase de revisión final por parte del Comité de Género de la SCC. Se ha solicitado una evaluación interagencial.

La cooperación de la Oficina Española de Cambio Climático para la aplicación del modelo M3E en el sector residuos no ha sido fluida, complicándose por la indisponibilidad de tiempo de parte de los funcionarios de dicha entidad por la organización de la COP.

RG: Se ha informado del particular a la Oficina Regional de PNUD a fin de que esté al tanto del retraso, esperando se tenga una respuesta favorable de la OECC, una vez que finalice la COP y los eventos paralelos.

En la nueva fase del proyecto, la participación y el rol del Ministerio de Economía y Finanzas es fundamental. Una participación poco activa puede complicar el desarrollo normal del proyecto.

RG: Se mantendrán reuniones periódicas con el Ministerio de Economía y Finanzas. Incluso, se ha integrado a esta institución en el Comité Directivo del proyecto.

Aprobado por

Steven Petersen
Subsecretario de Cambio Climático
MAE

Carlos Montenegro
Oficial de Programa Ambiente y Energía (E)
PNUD

Responsable

Christian López Rodas
Coordinador proyecto NDC SP
PNUD - MAE

Anexos:

- a. Excel de matriz de riesgos

