

Anexo I
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México
Documento de Proyecto



*Al servicio
de las personas
y las naciones*

Nombre del Proyecto:

Cuarta Fase: Apoyo a las y los jóvenes del tipo medio superior para el desarrollo de su proyecto de vida y la prevención de conductas de riesgo, Programa Construye T.

Área(s) de Cooperación del UNDAF a los que contribuye el Proyecto:

I: Igualdad, Equidad e Inclusión Social.

Resultado del Programa de País (CPD):

El Estado mexicano habrá implementado una estrategia de desarrollo social integral que garantice el cumplimiento de los derechos humanos mediante la articulación de políticas que contribuyan a la disminución de la pobreza, la mejora de la calidad de vida y la disminución de las desigualdades de género, edad, etnia, económica, de localización geográfica y condición de discapacidad, sustentada en esquemas de diálogo político y participación social inclusiva. Indicador Efecto: 1.3 Índice de Desarrollo Humano e Índice de Desarrollo Relativo al Género. Áreas prioritarias Plan Estratégico: Igualdad, equidad e inclusión social.

Asociado en la implementación: Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Breve Descripción del Proyecto

El Programa¹ Construye T tiene por objetivo fortalecer las capacidades de la escuela para desarrollar habilidades socioemocionales en las y los estudiantes, y así mejorar el ambiente escolar en los planteles del nivel medio superior participantes. Para el alcance de sus metas el Programa implementa dos grandes estrategias: formación de habilidades socioemocionales para la comunidad escolar y el fortalecimiento de una gestión escolar participativa. De esta manera, el Programa busca incidir directamente en el desarrollo integral de los estudiantes del nivel medio superior y de manera indirecta en la prevención de conductas de riesgo que puedan truncar su trayectoria educativa tales como violencia, adicciones o embarazo adolescente.

Para los ciclos escolares 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018, el modelo de operación de Construye T se fortalecerá a través de la implementación de una capacitación en línea sobre habilidades socioemocionales para docentes y directivos y la creación de comunidades de aprendizaje en los planteles. Para apoyar este proceso, se elaborarán materiales prácticos para que estudiantes, docentes y directivos puedan realizar ejercicios para desarrollar las habilidades socioemocionales del Programa. Asimismo, para fomentar una sana convivencia escolar se desarrollarán guías y manuales para realizar actividades de gestión del ambiente escolar con base en las mejores prácticas a nivel internacional; también se fortalecerá el sistema de monitoreo de resultados y se continuará con la evaluación de impacto del Programa iniciada en 2014.

¹ A lo largo del documento se usa el término Programa para referirse a Construye T, no obstante, bajo la normatividad y organización del PNUD, este constituye un Proyecto.



Hasta 2018, este Programa formó parte de la estrategia de largo plazo del Gobierno Federal en función del Programa Sectorial de Educación (PROSEDU) 2013-2018, el cual estableció la realización de acciones para fomentar una educación integral que promueve la salud física y mental, la prevención de conductas de riesgo y la creación de ambientes escolares libres de violencia, acoso y abuso sexual.

Para el ciclo escolar 2019-2020, Construye T promoverá el desarrollo de habilidades socioemocionales de los estudiantes de la educación media superior, bajo un enfoque integral de aprendizaje socioemocional dentro y fuera del aula, es decir, en diversos espacios escolares y comunitarios, en los que se tendrán como componentes estratégicos: i) la responsabilidad social; ii) la educación sexual; iii) el deporte y iv) las artes. Para ello, Construye T desarrollará materiales didácticos; capacitará a los docentes sobre aspectos técnicos y prácticos de desarrollo integral y habilidades socioemocionales; proporcionará acompañamiento técnico a los planteles; realizará acciones de difusión y posicionamiento del programa a nivel nacional e internacional, construirá alianzas y generará acciones de vinculación interinstitucional que potencien el impacto del programa.

Además, desarrollará modelos alternativos que se pondrán en práctica con planteles cuyas necesidades requieran de una intervención estratégica. La inclusión de estos cuatro nuevos componentes contribuirá positivamente en el aprendizaje socioemocional de los estudiantes y brindará a los planteles mayor flexibilidad para poner en práctica el programa. De acuerdo con las condiciones de cada escuela, ésta definirá la estrategia de operación compatible para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales entre el estudiantado, de esta forma, Construye T continuará adaptándose a los diversos contextos de los subsistemas de educación media superior.

En diciembre de 2017, el convenio de colaboración se amplió hasta marzo de 2019. Sin embargo, es necesario continuar con los trabajos de colaboración que permitan, con base en las acciones ya ejecutadas, el diseño e implementación de estrategias que contribuyan a la formación de jóvenes con un sentido de responsabilidad social a través del fortalecimiento de sus habilidades socio emocionales, por lo que se ha acordado extender la vigencia del convenio hasta marzo de 2020.

Periodo del Programa País	2014 – 2019	Presupuesto original	USD \$4,275,534.44 ²
Área Clave de Resultado	1	Presupuesto adicional	USD \$ 4,852,013.59
		Presupuesto Total ³	USD \$9,127,548.03

² Esta cantidad equivale a los \$72,000,000 MXN comprometidos en el Acuerdo firmado con SEP con fecha del 21 de agosto de 2015 y que fueron ingresados al proyecto empleando el tipo de cambio de Naciones Unidas del mes de septiembre de 2015 equivalente a 16.84. En el Anexo I del Acuerdo firmado en agosto de 2015, se reportó la cantidad de \$4,392,922.51 USD que equivalía a los mismos 72,000,000 MXN con un tipo de cambio de Naciones Unidas de 16.39 del mes de agosto, tal como consta en la nota al pie de dicho documento en su apartado de carátula.

³ El presupuesto adicional consideró una ministración de \$100,000,0000 MXN el cual se estimó en el PRODOC en

(Plan Estratégico del PNUD 2018 -2021)			
Código del Proyecto (Atlas Award ID)	00089091		
Fecha de inicio del Proyecto en ATLAS:	08/2015		
Fecha de Fin: ⁴	03/2020	Donante	
Fecha del PAC:	29/07/2015	- Gobierno	USD \$9,127,548.03
Modalidad de Gestión:	NIM		

\$5,263,157.89 USD con un tipo de cambio para el mes de octubre de 2016 de 19 pesos por dólar. Considerando que la ministración de recursos sucedió hasta diciembre de 2016 a un tipo de cambio de 20.61 pesos por dólar, se ajustó el monto en el presente documento para registrar la cantidad de recursos que efectivamente ingresó al PNUD.


⁴ Se refiere al cierre sustantivo. De acuerdo con la normativa del PNUD los proyectos requieren de un trimestre adicional posterior al cierre sustantivo para realizar el cierre financiero.



Aceptado por


Nombre y título

Asociado en la Implementación
Subsecretaría de Educación Media Superior


Subsecretario de Educación Media Superior

Dr. Juan Pablo Arroyo

Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la AMEXCID
Dirección General de Cooperación Técnica y Científica


Director General de Cooperación Técnica y Científica

Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo


Sr. Lorenzo Jiménez de Luis
Representante Residente PNUD México

Sr. Lorenzo Jiménez de Luis



I. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Antecedentes

Durante 2007, la Secretaría de Educación Pública (SEP) puso en marcha la estrategia de intervención “Programa de Prevención de Riesgos en la Educación Media Superior (PPREMS)”, para hacer frente al problema del abandono escolar y disminuir las situaciones de riesgo a las que se enfrentaban los estudiantes de este nivel.

En 2008, la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), solicitó la colaboración del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y, posteriormente, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología (UNESCO) para poner en marcha el Programa Construye T. Dicha colaboración implicó brindar soporte técnico y operativo al PPREMS y al proceso de Reforma Integral de la Educación Media Superior.

El Programa Construye T tenía por objetivo la creación de comunidades educativas para que los jóvenes permanecieran en la escuela, enfrentaran de mejor manera las situaciones de riesgo y construyeran su proyecto de vida. Con dicho propósito, se realizaban actividades de grupo, juveniles y proyectos que involucraban a distintos actores de la comunidad escolar.

En 2014 Construye T inició una nueva etapa, retomando buenas prácticas y hallazgos de investigaciones académicas y empíricas recientes, proponiendo un nuevo enfoque que tiene como objetivo el desarrollo de habilidades socioemocionales en estudiantes, docentes y directivos para contribuir a la mejora de la convivencia escolar en los planteles.

Justificación y sustento teórico

Diagnóstico de problema: vulnerabilidad del adolescente y ambiente escolar adverso

Como consecuencia de los cambios físicos y emocionales que ocurren de forma simultánea entre los 15 y los 19 años, los adolescentes están expuestos a desarrollar conductas de riesgo independientemente del contexto en el que se desenvuelven. Por ejemplo, se estima que 20 por ciento de los adolescentes tienen problemas de adaptación, sufren conflictos familiares y académicos, o incurren en conductas que pueden ser factores detonantes de desórdenes psicológicos graves posteriores.⁵


De hecho, la evidencia internacional muestra que es fundamental apoyar e invertir en el aprendizaje socioemocional y el desarrollo integral de los adolescentes, considerando que se encuentran en una edad crítica en la que comienzan a definir y desarrollar su identidad y a tomar decisiones cruciales para el resto de su vida, sin necesariamente contar con las herramientas adecuadas. Por ejemplo, diversas investigaciones señalan que las intervenciones que se enfocan en desarrollar habilidades socioemocionales en la adolescencia arrojan resultados prometedores.⁶

De acuerdo a CASEL,⁷ el aprendizaje socioemocional se refiere específicamente al proceso mediante el cual los niños, adolescentes y adultos adquieren y aplican de manera efectiva

⁵ Cardozo y Alderete, 2009.

⁶ Heckman y Kautz, 2013.

⁷ CASEL es una organización que promueve el Aprendizaje Socioemocional y Académico en los EEUU.



conocimientos y habilidades para identificar, entender y manejar las emociones propias; sentir empatía por los demás; establecer y alcanzar metas positivas; desarrollar y mantener relaciones positivas; y, tomar decisiones responsables.

Por esta razón, es importante que los planteles educativos proporcionen un ambiente escolar favorable, no sólo para el desarrollo académico de las y los jóvenes, sino también para su desarrollo social y emocional. En ese sentido, un ambiente escolar favorable para el desarrollo integral de los estudiantes implica una convivencia entre los integrantes del plantel educativo basada en el respeto y la colaboración, una comunicación efectiva entre éstos mismos; un mayor nivel de motivación y satisfacción de todos los integrantes del plantel; un mayor sentido de identidad y pertenencia a la institución; y, un clima de seguridad y confianza, y espacios para la participación y la expresión de la diversidad.

Según el estudio de Rosenholz (1989), los docentes de escuelas con ambientes de colaboración entre pares identifican el liderazgo con la capacidad de motivar y ayudar a otros docentes, además de que la manera en que se relacionan con los estudiantes y otros docentes constituye un ejemplo a seguir para sus alumnos. Adicionalmente, el estudio de Rosenholz encuentra una relación entre el ambiente de colaboración docente en las escuelas y el desempeño cognitivo de los estudiantes. Otros estudios señalan la importancia del trabajo cooperativo entre docentes en la medida en que éste constituye un ejemplo de interacción social para los alumnos.⁸

No obstante lo anterior, algunos datos de la Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en Educación Media Superior (ENEIVEMS) de 2013 muestran que, en la práctica, la escuela no siempre representa lo que idealmente debería ser: un espacio seguro y confiable, participativo e incluyente, motivador y satisfactorio, para el desarrollo académico y socioemocional de los estudiantes, que les aporte las habilidades necesarias para la construcción de proyectos de vida positivos. Por ejemplo, entre las y los estudiantes encuestados, 37% ha sufrido algún tipo de violencia en los planteles, 55% se siente triste y 28% considera que su vida es un fracaso. Adicionalmente, se identifica que sólo 2% de las y los estudiantes considera a su escuela como un centro de apoyo, mientras que 38% la considera peligrosa.


Además, estos mismos datos evidencian que las conductas de riesgo pueden truncar la trayectoria educativa de los estudiantes, y limitar sus opciones de vida. Por ejemplo, en México, el embarazo adolescente se asocia con una pérdida de 1 a 1.2 años de escolaridad en el largo plazo para las mujeres.⁹ Asimismo, los datos sugieren que la prevalencia de conductas de riesgo entre los 19 y 24 años es mayor en jóvenes que abandonaron sus estudios de educación media superior (EMS) entre los 15 y 18 años.¹⁰

Así, factores como un nivel de aprendizaje socioemocional limitado y un ambiente escolar adverso, sumado a la condición de vulnerabilidad propia de la adolescencia, pueden limitar la capacidad de los jóvenes para manejar sus emociones, enfrentar los retos de la vida, desarrollar una relación positiva con sus compañeros, tomar decisiones de manera asertiva, o construir proyectos de vida positivos. En este sentido, la escuela constituye un espacio idóneo para desarrollar habilidades socioemocionales en los estudiantes tomando en cuenta que representa el primer lugar de socialización de los jóvenes inmediatamente después del hogar.

⁸ Smith y Scott, 1990; Waldron y McLenskey, 2010; West y Idol, 1993.

⁹ Arceo-Gómez y Campos-Vázquez, 2014.

¹⁰ Bentaouet y Székely (2013).



Definición e importancia de las habilidades socioemocionales

El *aprendizaje socioemocional* es el proceso mediante el cual las personas adquieren y aplican de manera efectiva los conocimientos, las actitudes y habilidades necesarias para entender y manejar sus emociones, establecer y alcanzar metas positivas, sentir y mostrar empatía hacia los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas y tomar decisiones responsables.¹¹

Las *emociones*, por su parte, son reacciones que están relacionadas con lo que nos ocurre y con lo que percibimos y están presentes en menor o mayor medida en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana.¹² Identificar y entender la importancia y el efecto de las emociones es fundamental en el ámbito educativo dado que el aprendizaje socioemocional se relaciona directamente con el académico: los estudiantes no aprenden solos, sino con el apoyo de sus maestros y sus padres.¹³

En ese sentido, las *habilidades socioemocionales* son aquellas herramientas que nos permiten conocernos mejor como personas, manejar nuestras emociones, comunicarnos efectivamente, resolver conflictos, plantearnos y alcanzar metas, levantarnos de los tropiezos, manejar el estrés y tomar decisiones reflexivas. Estas habilidades conforman la inteligencia emocional que, según la literatura, es igual de importante y necesaria que la cognitiva.¹⁴

En términos generales, y según la evidencia disponible, desarrollar habilidades socioemocionales representa una apuesta necesaria e incluso rentable porque se asocia con un mayor nivel de éxito en el ámbito académico, personal y laboral. Específicamente, estas habilidades:

- ❖ *Ayudan a fortalecer la identidad y autoestima de los jóvenes:* la literatura señala que los programas que promueven el aprendizaje socioemocional en las y los jóvenes contribuyen a definir su identidad y mejorar su autoestima y confianza social porque fortalecen su capacidad para ejercer un mayor autocontrol, comunicarse, resolver conflictos, manejar su ansiedad y decidir asertivamente. Estos programas son necesarios precisamente porque la adolescencia conlleva múltiples cambios físicos y emocionales, incluyendo la búsqueda de identidad y la transformación de las relaciones de los jóvenes con los demás.¹⁵

En síntesis, los adolescentes que son emocional y socialmente competentes pueden relacionarse mejor con los demás y cooperar, comunicarse de manera efectiva, negociar y resolver problemas, buscar ayuda eficazmente, decir que no y contribuir de manera positiva en sus familias y comunidades.¹⁶

Las transformaciones en el ámbito de la familia hacen necesario que las escuelas constituyan estructuras que apoyen y complementen la educación que los jóvenes reciben en el hogar, para potenciar su desarrollo integral, particularmente en cuestiones emocionales y socioafectivas.¹⁷

¹¹ Definición de CASEL. Disponible en <http://www.casel.org/social-and-emotional-learning/>

¹² Milicic et al (2014).

¹³ Milicic et al (2014).

¹⁴ Heckman y Kautz (2013).

¹⁵ Hair et al (2012) y Payton et al (2008) en CASEL.

¹⁶ Milicic et al (2014).

¹⁷ OCDE (2013).



- ❖ *Contribuyen a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje:* los distintos enfoques en la literatura especializada coinciden en que los aspectos emocionales tienen un efecto evidente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta que los estudiantes no aprenden solos sino con el apoyo de sus profesores.¹⁸
- ❖ *Mejoran el desempeño académico:* las investigaciones muestran que las habilidades socioemocionales permiten incrementar el desempeño académico de los estudiantes, posicionándose frecuentemente como aquellos factores que ejercen la mayor influencia relativa sobre este rendimiento, no sólo porque mejoran la asistencia a clases y motivan el aprendizaje, sino porque reducen las actitudes negativas y ayudan a manejar el estrés,¹⁹ incluso, algunos estudios concluyen que los programas que promueven el desarrollo de habilidades socioemocionales se asocian con una ganancia educativa de 11 a 17 puntos porcentuales en las pruebas de desempeño académico.²⁰
- ❖ *Permiten prevenir conductas de riesgo:* las mejores prácticas internacionales establecen que la manera más eficaz para prevenir conductas de riesgo en los adolescentes consiste en el desarrollo de un portafolio integral de intervención que promueva el desarrollo de habilidades socioemocionales, ya que estas habilidades, más allá de ofrecer información como las intervenciones comunes, fortalecen la capacidad de los jóvenes para tomar decisiones reflexivas y asertivas, sobre todo en aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.²¹ Específicamente, las habilidades socioemocionales, sobre todo cuando se gestan en edades tempranas, se asocian por ejemplo con menores índices de embarazo adolescente.²²
- ❖ *Permiten reducir las desigualdades educativas y sociales:* una de las consecuencias más graves de la desigualdad social es la desigualdad educativa, la cual contribuye a su vez a generar una trampa de habilidades. En este sentido, la literatura señala que las habilidades socioemocionales no sólo contribuyen a incrementar la productividad y el ingreso de las personas, sino que también, en el caso de los adolescentes en situación de vulnerabilidad, suelen ser muy efectivas para promover el desarrollo de los jóvenes.²³

Experiencias internacionales: el rol del docente en el proceso de aprendizaje cognitivo y no cognitivo

Los enfoques contemporáneos de enseñanza reconocen que el papel de los docentes se ha transformado significativamente a través del tiempo. Hoy en día, el rol del maestro es enseñar a los estudiantes a buscar, analizar y utilizar eficazmente la información, así como también ayudarlos a ser mejores ciudadanos y desarrollar competencias para la vida, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, etc. Lo anterior, se traduce en planes de estudio que favorecen el desarrollo de competencias y habilidades para la vida.

¹⁸ Milicic et al (2014).

¹⁹ Hawkins, Smith y Catalano (2013) en Milicic et al (2014).

²⁰ Payton et al (2008) en CASEL.

²¹ Cunningham et al (2008).

²² Heckman (2012).

²³ Heckman y Cunha (2010).



En México, el marco curricular común del bachillerato establece que los egresados del nivel medio superior deben haber desarrollado, durante su paso por este nivel educativo, 11 competencias genéricas que les permitan comprender el mundo e influir en él; que les capaciten para continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus vidas, y les permitan desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean, así como participar eficazmente en los ámbitos social, profesional y político.²⁴ De igual forma, el análisis del perfil del egresado refleja que, al presente, la misión de los docentes del nivel medio superior es la formación integral de los estudiantes, la cual incluye tanto el aprendizaje cognitivo como el desarrollo de competencias para la vida, y éstas últimas están estrechamente vinculadas al desarrollo de algunas habilidades socioemocionales como la autoconciencia, la autorregulación, el manejo de estrés, el pensamiento crítico, etc.

La formación de habilidades socioemocionales para los docentes es necesaria desde la perspectiva del bienestar de los propios docentes, pero además es importante para incrementar la efectividad del proceso enseñanza-aprendizaje en el aula, así como el desarrollo socioemocional de sus estudiantes. Los estudios sobre aprendizaje socioemocional llevados a cabo por el programa *Every Child Matters*, de Gran Bretaña, resaltan la importancia de la formación docente en habilidades socioemocionales bajo la consideración de que no se puede enseñar una competencia o habilidad que no se tiene, y que no es posible enseñar con calidad si no existe bienestar personal.²⁵ En ese mismo sentido, el estudio realizado por Weary y Grey (2003), citado en Brackett, Fernández-Berrocal y Palomera (2008), recomienda desarrollar competencias socioemocionales no sólo en las escuelas, sino también en las instituciones encargadas de la formación de los docentes.

Otra evidencia relevante relacionada con el rol y la formación del docente en el aprendizaje cognitivo y socioemocional de los estudiantes, es proporcionada por los resultados de la evaluación de impacto del programa Enseña Chile.²⁶ Específicamente, se encontró que en comparación a un grupo de control, los estudiantes que toman clase con docentes participantes en dicho programa tienen puntajes mayores y estadísticamente significativos en escalas de medición de autoestima y habilidades sociales así como en pruebas de lenguaje y matemáticas. Este programa se caracteriza por seleccionar rigurosamente a profesionales y/o docentes que tengan habilidades de liderazgo, además de proporcionarles una rigurosa e intensiva formación inicial para adquirir habilidades y conocimientos para desempeñarse en el aula de clases; posteriormente el programa brinda un acompañamiento y formación continua a los docentes a lo largo de los dos años de participación en el programa.

Si bien el contexto familiar sigue siendo el principal factor predictivo de los resultados del aprendizaje, investigaciones recientes señalan que, en el contexto escolar, la calidad de los docentes es el recurso educativo más importante para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Resultados recientes muestran que la eficacia de los docentes es crucial para el proceso de aprendizaje; los estudiantes que no tienen un buen profesor aprenden menos del 50% del programa de estudios de ese grado, mientras que los alumnos que tienen un buen profesor aprenden lo equivalente a un año escolar, y aquellos que tienen un profesor excelente aprenden lo equivalente a más de un año escolar.²⁷

²⁴ SEP, Acuerdo 444.

²⁵ Brackett, Fernández-Berrocal y Palomera, 2008.

²⁶ Alfonso et al (2010).

²⁷ Hanushek y Rivkin, 2010; Rockoff, 2004; Bruns y Luque, 2014.



En ese mismo sentido, la literatura sobre la formación de los docentes evidencia que los sistemas educativos de alto desempeño impulsan el crecimiento profesional continuo de los profesores y promueven la interacción constante y la colaboración entre colegas. En Finlandia, el sistema permite que los profesores cuenten con tiempo específico para trabajar colectivamente en la preparación de contenidos de los planes de estudio, materiales didácticos y formas de evaluación. En Ontario, Canadá, el desarrollo profesional de los docentes se realiza en equipo a nivel de las escuelas, respaldado por expertos externos y sin ningún incentivo económico adicional.²⁸

Más aún, la evidencia nos dice que para que una propuesta de formación docente se traduzca en cambios a nivel de escuela, es necesario que el impulso y la coordinación de los esfuerzos provengan del interior del centro educativo y la comunidad educativa asuma dicho cambio.²⁹

En conclusión, con base en la evidencia académica y las prácticas de otros sistemas educativos, la inversión en la eficacia y el desarrollo profesional de los docentes bajo esquemas colaborativos representa un medio con alto potencial para fortalecer la capacidad institucional de la escuela y mejorar el aprendizaje académico y socioemocional de los estudiantes.

Propósito del Proyecto

El objetivo principal o propósito del Programa Construye T es fortalecer las capacidades de la escuela para desarrollar habilidades socioemocionales en las y los estudiantes, y así mejorar el ambiente escolar en los planteles públicos de educación media superior que participan en el Programa.

Objetivos específicos del Proyecto

Para el periodo 2015-2018 los objetivos específicos del programa fueron los siguientes:

1. Formar a docentes y directivos en habilidades socioemocionales (HSE) conforme a las tres dimensiones del Programa.
 - a. Desarrollar HSE en los docentes y directivos para la mejora de su gestión personal e interpersonal y su capacidad para implementar clases con enfoque socioemocional.
 - b. Fortalecer el liderazgo de los directivos para realizar acciones que contribuyan al desarrollo de HSE en la comunidad escolar y mejorar la gestión del ambiente escolar.
 - c. Formar a un Tutor Construye T en cada plantel como experto formador en HSE.
 - d. Crear una comunidad de aprendizaje en cada plantel compuesta por un Tutor Construye T y al menos cinco docentes para la formación de HSE en el resto de los y al menos cinco docentes
 - e. A través de las comunidades de aprendizaje, fortalecer la capacidad de los docentes para desarrollar e implementar clases con enfoque de HSE.
 - f. Poner a disposición de los docentes del tipo medio superior las mejores prácticas para el desarrollo de HSE generadas en las comunidades de aprendizaje del Programa Construye T.

²⁸ Bruns y Luque, 2014.

²⁹ UNESCO, 2006.




- g. Poner a disposición de estudiantes, docentes y directivos, materiales prácticos para realizar ejercicios que contribuyan a desarrollar HSE en el aula, el plantel y/o el ámbito personal.
2. Fortalecer en los planteles la adopción de prácticas de gestión participativa para la mejora del ambiente escolar.
 - a. Proporcionar herramientas prácticas y materiales de capacitación a directivos y docentes para realizar acciones de gestión escolar participativa que contribuyan a la mejora del ambiente escolar
 - b. Fortalecer la integración de un comité escolar, el establecimiento de acuerdos de convivencia y la realización de un diagnóstico de necesidades en cada plantel con base en mecanismos participativos y aplicables a todos los integrantes de la comunidad escolar.
 - c. A través de los comités escolares y las comunidades de aprendizaje socioemocional de docentes, fomentar el desarrollo de acciones de convivencia a nivel de aula³⁰ que favorezcan las relaciones interpersonales y la solución de conflictos mediante la reflexión, el diálogo, la participación y la corresponsabilidad.

Para el ciclo escolar 2019-2020 los objetivos específicos del programa son:

3. Diseñar los contenidos, así como la estrategia de implementación de cuatro nuevos componentes del programa para la enseñanza de las habilidades socioemocionales en espacios escolares y comunitarios: 1) responsabilidad social, 2) educación sexual, 3) deportes y 4) artes.
4. Establecer alianzas y acciones de vinculación interinstitucional con otros actores o dependencias de gobierno, en coordinación con SEMS, que permitan potenciar la eficacia y la eficiencia en el desarrollo de habilidades socioemocionales para los componentes de responsabilidad social, educación sexual, deporte y artes.
5. Elaborar materiales pedagógicos, estrategias de capacitación y acompañamiento dirigidas a docentes y directivos que faciliten la implementación de los diversos componentes del programa.
6. Diseñar e implementar modelos alternativos de aprendizaje socioemocional, dirigidos a poblaciones en desventaja o a modalidades educativas cuyas necesidades requieran de una intervención distinta al modelo nacional.
7. Realizar acciones de difusión y promoción de los materiales del modelo de aprendizaje socioemocional en el aula (desarrollado entre 2017-2018) en espacios extracurriculares.

³⁰ Con base en los resultados de las visitas de monitoreo del programa a los planteles en el ciclo escolar 2015-2016, se identificó que la creación de consejos de convivencia a nivel de aula representaría una actividad que requiere un mayor tiempo de gestión de clase para los docentes, lo cual va en detrimento del tiempo dedicado a actividades académicas. Por esta razón el Equipo Técnico del Programa decidió sustituir esta estrategia por la promoción de acciones de convivencia en el aula, las cuales serán promovidas con el apoyo de los Comité Escolar y las comunidades de aprendizaje socioemocional de docentes de cada plantel.



Cobertura y focalización del Proyecto

En 2014 se seleccionaron 2,500 planteles públicos, tanto federales como estatales, de educación media superior para participar en el Programa Construye T. La selección fue realizada con base en un índice de prelación construido a partir de los siguientes indicadores:

- Los subsistemas de educación media superior con mayor número de alumnos en cada estado seleccionado.
- La tasa de muertes violentas en el grupo de edad de 15 a 29 del municipio en donde se ubica el plantel.
- El promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 15 a 19 años del municipio en donde se ubica el plantel.
- La tasa de abandono del plantel
- El tamaño de la matrícula del plantel para maximizar la cobertura.

El objetivo del índice fue focalizar las intervenciones en aquellos planteles en los que existe mayor incidencia de situaciones de riesgo para los jóvenes, de tal suerte que sean estos jóvenes los que reciban de forma prioritaria herramientas adecuadas para enfrentarlos.

Para el ciclo escolar 2015-2016 se incluirán 1,500 planteles adicionales, con lo cual se alcanzará una cobertura de 4,000 planteles públicos del tipo medio superior, con una matrícula aproximada de 2.8 millones de alumnos.


Para el ciclo escolar 2016-2017 se incluirán 3,000 planteles, con lo cual se alcanzará una cobertura de 7,000 planteles públicos del tipo medio superior, con una matrícula aproximada de 3.1 millones de alumnos.

La inclusión y/o sustitución de planteles para cada ciclo escolar será realizada con base en lineamientos que permitan incorporar a los planteles con mayor necesidad del Programa, los cuales serán definidos de manera conjunta por la SEP y el PNUD.

Para el ciclo escolar 2019-2020 el alcance de las estrategias de capacitación, acompañamiento y modelos alternativos de aprendizaje socioemocional se definirá en función del presupuesto disponible del proyecto. Los materiales digitales que se realicen durante este periodo, así como las estrategias de difusión estarán dirigidos a **todos** los planteles públicos del tipo medio superior.

Vinculación del Programa con estrategias gubernamentales y marco de desarrollo

El Programa pretende tener un efecto directo sobre el aprendizaje socioemocional de los estudiantes y la capacidad institucional de los planteles, para fortalecer la convivencia escolar. En un nivel superior de objetivos de desarrollo, Construye T permitirá generar externalidades positivas, tanto a nivel individual como escolar, contribuyendo a lograr una sociedad más incluyente, con mayor participación de los jóvenes y una mejora de la percepción de su propio bienestar (Ver Apéndice IV). En este sentido, el Programa se vincula con la estrategia del Gobierno Federal en el sector educativo y se ubica dentro del marco de desarrollo propuesto por Naciones Unidas.



El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 estableció la necesidad de tratar los problemas de política pública educativa desde un enfoque social y de generación de capacidades. En ese sentido, el eje *México con Educación de Calidad*, propuso acciones encaminadas a la construcción de ambientes escolares seguros y de sana convivencia; así como al fortalecimiento de las capacidades de la planta docente, a partir de programas de formación pertinentes a las necesidades de las y los jóvenes y que contribuyan a la mejora de la calidad educativa, entre otras.

Asimismo, el Programa Sectorial de Educación (PROSEDU) 2013-2018 del Gobierno Federal estableció la necesidad de impulsar la calidad e inclusión educativa en el tipo medio superior a partir de acciones que fomenten una educación integral que promueva la salud física y mental, prevengan conductas de riesgo que eventualmente desemboquen en el truncamiento de la trayectoria educativa de las y los estudiantes; y, propicien ambientes escolares libres de violencia, acoso y abuso sexual.

La actual administración federal (2018-2024) ha establecido un importante compromiso con la inclusión educativa, económica y social de los jóvenes. Por esta razón, la EMS enfocará sus esfuerzos en formar ciudadanos integrales con la capacidad de aprender a aprender a lo largo de la vida y que puedan desarrollar competencias esenciales para desempeñarse con éxito en el mundo actual, tales como la adaptabilidad, el trabajo en equipo, la capacidad de establecer relaciones interpersonales positivas, entre otras (SEMS, 2019). Tomando en cuenta esta visión y las coincidencias con el objetivo de esta fase del proyecto y las metas establecidas en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 en materia educativa, la SEMS y el PNUD extenderán la vigencia del programa Construye T para seguir impulsando la formación de habilidades socioemocionales en los estudiantes de educación media superior a lo largo del ciclo escolar 2019-2020.

En ese sentido, Construye T se posiciona actualmente como una intervención necesaria y estratégica en el tipo medio superior tomando en cuenta el entorno al que se enfrentan los jóvenes en nuestro país, así como los resultados de investigaciones y programas similares en otros países.

El Programa Construye T responde al Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México 2014-2019, contribuyendo a las siguientes áreas de cooperación y efectos del UNDAF (por sus siglas en inglés):

Área de cooperación I: Igualdad, equidad e inclusión social.

Áreas prioritarias Plan Estratégico: Igualdad, equidad e inclusión social.

Efecto Directo 1. El Estado mexicano habrá implementado una estrategia de desarrollo social integral que garantice el cumplimiento de los derechos humanos mediante la articulación de políticas que contribuyan a la disminución de la pobreza, la mejora de la calidad de vida y la disminución de las desigualdades de género, edad, etnia, económica, de localización geográfica y condición de discapacidad, sustentada en esquemas de diálogo político y participación social inclusiva.

Indicador Efecto: 1.3 Índice de Desarrollo Humano e Índice de Desarrollo Relativo al Género.



El Programa busca primordialmente la creación de espacios escolares que promueven el desarrollo integral de las personas y fortalecen los factores que previenen conductas de riesgo en las y los jóvenes de educación media superior.

A través de la implementación de Construye T, México avanza sustantivamente para ofrecer una educación de calidad a las y los jóvenes del nivel medio superior, contribuyendo así al logro del objetivo 4 educación de calidad, establecido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Específicamente, a través de la formación de HSE en los estudiantes se promueve la adopción de estilos de vida sostenibles, el respeto y ejercicio de los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural.



II. ESTRATEGIAS

Propuesta de intervención 2015-2018

A partir de los objetivos planteados en el apartado anterior y de la revisión de la literatura y mejores prácticas internacionales, para el periodo 2015-2018 el Programa Construye T planteó dos grandes estrategias:

1. Formación de HSE para los actores de la comunidad escolar.
2. Gestión escolar participativa para mejorar el ambiente escolar en el aula y en la escuela.

A partir del ciclo escolar 2015-2016 y durante el ciclo 2016-2017 se fortaleció el Programa, mediante el modelo operativo que se describe más adelante, con el propósito de que docentes y escuelas se apropiasen del Programa, es decir, que las actividades propuestas sean adaptadas a los esquemas operativos y organizacionales de cada escuela. Asimismo, para potenciar las estrategias del Programa, se generaron mecanismos de apoyo que facilitaron y/o aceleraron la adopción del modelo propuesto por parte de todos los actores de la comunidad educativa, particularmente por parte de los docentes y directivos.

Para 2019-2020 Construye T fortalecerá el aprendizaje socioemocional de los jóvenes a través de la enseñanza de habilidades socioemocionales que contribuyan al desarrollo de actividades escolares y comunitarias bajo el enfoque formativo integral que se implementará desde la Subsecretaría de Educación Media Superior y que se organizan en **cuatro nuevos componentes**. Estos se describen en la subsección 4 de este apartado.

Retomando múltiples definiciones respecto al concepto de ambiente o clima escolar que se encuentran en la literatura especializada, el Programa Construye T considera que el ambiente de una escuela está determinado por las formas de interacción y cultura de convivencia en la comunidad escolar, los mecanismos de participación y expresión existentes, el aprovechamiento de los espacios y de los recursos físicos, así como las aspiraciones y expectativas de sus integrantes, entre otros factores. Sin embargo, considerando la naturaleza de su intervención, *se espera que Construye T incida principalmente en la calidad de las interacciones sociales y la convivencia entre los integrantes de los planteles.*³¹

Es importante señalar que Construye T es un programa sin precedentes ya que busca generar, a gran escala, un cambio en las prácticas de los integrantes de la comunidad escolar a través del desarrollo de HSE en el contexto del tipo medio superior. Esto lo convierte en uno de los pocos programas a nivel internacional que atiende a jóvenes de dicho nivel educativo. Asimismo, Construye T destaca por la magnitud de su cobertura la cual lo posiciona como uno de los programas de desarrollo de HSE más grandes a nivel internacional.

El Apéndice I presenta la Teoría de Cambio del Programa 2015-2018 y 2019-2020, en las cuales se presentan los mecanismos y canales que muestran cómo se asocian las estrategias de Construye T con la mejora del aprendizaje socioemocional y el bienestar de los jóvenes y el ambiente escolar.

³¹ Arón y Milicic, 1999.



El Apéndice II muestra el tipo y el nivel de participación de los actores involucrados en el Programa, tanto beneficiarios como implementadores, con la finalidad de desarrollar HSE en la comunidad escolar y construir un ambiente de convivencia escolar favorable. Igualmente muestra los resultados o cambios esperados en cada uno de ellos.

A continuación, se describen detalladamente los componentes de las dos estrategias que se realizaron en el marco del Programa Construye T para 2015-2018 y, en la subsección 4, se presenta la estrategia para el ciclo escolar 2019-2020.

1. Formación de habilidades socioemocionales para la comunidad escolar

La literatura especializada señala al docente como el recurso educativo más relevante para mejorar la formación integral de los estudiantes y al director como el líder pedagógico que propicia la transformación de las prácticas en los planteles; en este sentido el Programa enfocó la estrategia de formación en los docentes y directivos, quienes son el medio idóneo para desarrollar el aprendizaje socioemocional de los estudiantes. Concretamente, Construye T proporcionó a los maestros los conocimientos y herramientas para desarrollarse personal y profesionalmente e incorporar el enfoque de desarrollo de HSE en sus clases, asimismo proporcionó a los directivos herramientas de liderazgo para el desarrollo de HSE en la comunidad escolar y la mejora del ambiente escolar.

Por ello, para los ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017 se implementó una estrategia de capacitación en HSE conforme a las tres dimensiones del Programa y que fue dirigida a docentes y directivos de los planteles participantes.

Por otro lado, en 2016 la SEP anunció que el modelo educativo de la educación básica y la educación media superior tendrían transformaciones sustantivas, entre las cuales destaca la integración de la educación socioemocional como parte del currículo oficial de dichos niveles educativos. En este contexto, el Programa Construye T se convirtió en la experiencia de implementación más relevante a nivel nacional que aportó conocimientos, metodologías, y lecciones aprendidas para el diseño e implementación de futuras estrategias de capacitación asociadas a la reforma curricular.


A continuación, se puntualizan cada uno de los elementos que integraron la estrategia de capacitación en habilidades socioemocionales del Programa.

1.1 Marco conceptual para la enseñanza de habilidades socioemocionales y sus tres dimensiones

Tomando en cuenta las necesidades y los intereses de los jóvenes, como el manejo del estrés en una edad tan compleja como la adolescencia, o la importancia de entablar amistades, así como las distintas presiones a las que se enfrentan, como el consumo de sustancias, o el ejercicio de la sexualidad sin protección, Construye T se enfocó en 3 dimensiones que a su vez se dividieron en seis habilidades generales y 18 habilidades específicas.

Las seis habilidades generales y 18 habilidades específicas que conformaron el marco conceptual de habilidades del Programa Construye T corresponden a las del programa Escuela Amiga de Perú.³² Sin embargo, la propuesta de denominación de las tres dimensiones

³² Programa implementado por el Banco Mundial y el Ministerio de Educación del Perú.



fue realizada por el Equipo Técnico del Programa Construye T. El Cuadro 1 muestra la agrupación de las 18 habilidades socioemocionales en las seis habilidades generales, y tres dimensiones definidas por el Programa.

Cuadro 1. Habilidades Socioemocionales a desarrollar por el Programa Construye T


Dimensión	Habilidades Generales	Habilidades Específicas
Conoce T	Autoconciencia	1. Auto percepción
		2. Autoeficacia
		3. Reconocimiento de emociones
	Autorregulación	4. Manejo de emociones
		5. Postergación de la gratificación
		6. Tolerancia a la frustración
	Determinación	7. Motivación de logro
		8. Perseverancia
		9. Manejo del estrés
Relaciona T	Conciencia social	10. Empatía
		11. Escucha activa
	Relación con los demás	12. Toma de perspectiva
		13. Asertividad
		14. Manejo de conflictos interpersonales
Elige T	Toma responsable de decisiones	15. Comportamiento prosocial
		16. Generación de opciones y consideración de consecuencias
		17. Pensamiento crítico
		18. Análisis de consecuencias

Fuente: Versión adaptada del esquema de habilidades del Programa Escuela Amiga de Perú, Banco Mundial y el Ministerio de Educación del Perú.

La dimensión Conoce T se concentra en aquellas habilidades que tienen que ver con la identificación, el entendimiento y el manejo de las emociones propias. Esta dimensión es particularmente relevante por dos razones: la primera tiene que ver con el afluyente de emociones que viven los adolescentes durante esta etapa de su vida, particularmente aquellas que contribuyen a definir su identidad; la segunda se relaciona con el manejo de estrés para poder lograr sus metas. Se trata pues de una dimensión intrapersonal.

La dimensión Relaciona T abarca aquellas habilidades que permiten relacionarse mejor con los demás, tales como la empatía, la escucha activa o la resolución de conflictos interpersonales. Durante la adolescencia, esta dimensión es fundamental considerando que los jóvenes desarrollan relaciones de amistad y de noviazgo. Esta esfera es de índole interpersonal.

Por último, la dimensión Elige T aborda las habilidades que permiten una toma de decisiones reflexiva y responsable, tales como la generación de alternativas, el análisis de las consecuencias que derivan de las diferentes opciones, y el pensamiento crítico. Considerando los distintos factores de riesgo a los que se enfrentan los jóvenes, particularmente la presión de sus pares, la dimensión Elige T se posiciona como un elemento central en la formación de los jóvenes, sobre todo tomando en cuenta que, durante la educación media superior, tomarán decisiones que marcarán su trayectoria de vida.



El marco conceptual de HSE del Programa se desarrolló en el año 2014, basado en las dimensiones de Construye T plasmadas en el esquema presentado en el Cuadro 1. Este marco fue integrado en un documento que proporciona una exhaustiva revisión de la literatura relevante y presenta las principales definiciones de las habilidades y su relación con el actual currículo de la educación media superior en México.³³

Con base en dicho marco conceptual del Programa y los planteamientos generales del modelo educativo 2017 para la educación media superior, se diseñaron los contenidos, materiales y evaluaciones para el curso de capacitación en línea (ver sección 1.2) para docentes y directivos. No obstante, el curso para docentes fue fortalecido con herramientas prácticas y conocimientos puntuales de cómo aplicar el enfoque socioemocional a una clase de cualquier asignatura y grado.

En 2017, el programa revisó y simplificó su marco teórico conceptual y ajustó sus estrategias de acuerdo a los hallazgos de investigaciones científicas más recientes de los campos de la educación, la psicología y las neurociencias en materia de educación socioemocional y aprendizaje. A manera de resumen, el programa se enfocó en promover el desarrollo de seis habilidades socioemocionales de las cuales hay evidencia sólida de que son medibles, maleables y tienen impactos significativos en la vida de las personas, estas habilidades son: autoconocimiento, autorregulación, conciencia social, colaboración, toma responsable de decisiones y perseverancia.

1.2 Curso de capacitación en línea para *docentes* y creación de comunidades de aprendizaje en HSE

Para fortalecer el proceso de formación de los docentes en HSE, durante los ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017 se implementó una estrategia de capacitación en línea, respaldada por el asesoramiento de expertos en desarrollo socioemocional de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y/o instituciones académicas (ver numeral 1.3 del apartado II Estrategias) y que fue expandida a más docentes a través de la creación de comunidades de aprendizaje sobre HSE en los planteles participantes.

Específicamente, se capacitó a un docente por cada plantel participante a través de un curso en línea de carácter interactivo (4,000 en el ciclo escolar 2015-2016 y 3,000 en el ciclo escolar 2016-2017) y con una duración aproximada de entre cuatro y cinco meses aproximadamente. El inicio del curso se realizó a través de una jornada de inducción presencial, realizada por *asesores expertos* (ver sección 1.3) en sedes a nivel estatal, asimismo se contempló que dichos asesores realizaran una visita de seguimiento a cada plantel participante durante la vigencia del curso.

Adicionalmente, en el ciclo escolar 2016-2017 se capacitó en promedio, a cinco docentes por cada plantel participante a través de modalidad con acompañamiento en línea en la que los asesores dieron retroalimentación únicamente a través de la plataforma de Construye T.

El desarrollo de los contenidos técnicos y materiales del curso fueron realizados por un conjunto de especialistas en el desarrollo de HSE de una institución especializada en el tema. Para la revisión de la calidad técnica de los contenidos se contempló la participación de expertos de las áreas académicas de la SEMS (Coordinación Sectorial de Desarrollo

³³ Fundamentación Teórica: Desarrollo de Habilidades Socioemocionales en el Tipo Medio Superior. Programa Construye T, documento interno.

Académico) y/u otras organizaciones especializadas externas, o del Sistema de Naciones Unidas. Lo anterior fue realizado considerando la Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de Educación Básica y Media Superior, lanzada a nivel nacional el 7 de marzo de 2016.

Para los ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017, se capacitó a través del curso en línea a un docente por plantel³⁴ al cual se le denominó Tutor Construye T. Se contempló que el Tutor Construye T fuera un líder comprometido con la mejora de su comunidad escolar y tuviera habilidades efectivas para el trabajo en equipo y el uso de las TIC. Como se mencionó previamente, la participación en el curso implicó trabajar en una comunidad de aprendizaje socioemocional de entre cuatro y seis docentes del plantel, para trabajar en el diseño e implementación de clases con enfoque socioemocional. Para el primer semestre del ciclo escolar 2017-2018, el Programa expandió la cobertura de sus cursos para incorporar al menos 5 docentes por plantel, es decir a 35,000 docentes adicionales.

Por otro lado, para facilitar la apropiación del Programa a nivel estatal, en el curso de docentes, Construye T ofreció espacios de capacitación a Autoridades Educativas y/o Asesores Técnicos Pedagógicos, para que pudieran acompañar y reforzar las prácticas en materia de educación socioemocional de docentes y directivos de los distintos subsistemas del nivel medio superior.

La selección del Tutor Construye T y de los docentes participantes en el curso en línea fue realizada por cada Director de plantel con el apoyo de su comunidad docente. Para facilitar esta tarea, previo al inicio del curso en línea, se elaboró un perfil del Tutor Construye T el cual fue enviado a los planteles Construye T para realizar la selección.


A continuación se presenta un cuadro resumen con las principales características del curso de HSE para docentes que fue realizado en 2015-2016:

Cuadro 2. Características del curso en línea de HSE para docentes

Modalidad	<ul style="list-style-type: none"> • En línea a través de una plataforma web. • Inducción al curso de forma presencial. • Con acompañamiento de un asesor experto a través de plataforma web
Duración	<ul style="list-style-type: none"> • Entre 4 y 5 meses, aproximadamente 60 horas en un período de hasta 12 semanas.
Cobertura	<p>Cobertura 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4,000 docentes (es decir, un docente por plantel al cual se le denomina Tutor Construye T). <p>Cobertura 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1^{er} trimestre 2017: 3,000 docentes y 500 autoridades educativas con acompañamiento mixto (presencial y en línea) • 2^o trimestre 2017: 35,000 docentes y 1,000 autoridades educativas con acompañamiento en línea <p>Cobertura total durante la fase: 43,500 participantes.</p>

³⁴ En aquellos planteles que por su tamaño en términos de matrícula o de su planta docente se encuentren en el último decil de la distribución de planteles, se podrá abrir el acceso al curso de capacitación en línea a otro docente, siempre y cuando el plantel lo solicite al Equipo Técnico, vía los canales de comunicación institucionales y se presente justificación que demuestre el compromiso del plantel con el Programa y el logro de resultados. En el curso de capacitación en línea también podrá participar personal del plantel encargado de realizar actividades académicas (jefes de materia, coordinadores académicos, etc.) y que cuenten con amplia experiencia docente en alguna asignatura disciplinar.

Características de la plataforma web	<ul style="list-style-type: none"> • Interactivo y de fácil manejo para los docentes. • Evaluaciones en línea. • Herramientas de comunicación en línea. • Plataforma para compartir actividades y materiales para impartir clases con enfoque de HSE. • Permitir la comunicación e interacción entre el docente y el asesor experto.
Asesores expertos	<ul style="list-style-type: none"> • Asesorar puntualmente a los docentes y evaluar el avance. • Alimentar los temas de los foros de discusión. • Evaluar la calidad técnica de los contenidos compartidos por los docentes. • Visitar una vez al semestre cada uno de los planteles participantes para ver el avance de las comunidades de aprendizaje (4,000 en 2016-2017 y 3,000 en 2017-2016).
Objetivos del curso	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar HSE en los docentes para la mejora de su gestión personal e interpersonal. • Desarrollar la capacidad de los docentes para impartir clases con enfoque de HSE. • Formar a los docentes participantes como expertos en HSE de su plantel. • Enseñar a los participantes a conformar y guiar una comunidad de aprendizaje de docentes sobre HSE en su plantel.
Contenidos	<p>Los principales temas que se trataron en el curso fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las emociones y los fundamentos de la inteligencia emocional. • Marco conceptual del Programa Construye T conforme a las tres dimensiones del Programa. • El desarrollo emocional del adolescente. • La importancia de las HSE. • La importancia de las HSE en el contexto escolar. • Lenguaje socioemocional. • Estrategias de gestión de clase con enfoque de HSE conforme a las tres dimensiones del Programa. • Planeación y desarrollo de clases con enfoque de HSE conforme a las tres dimensiones del Programa. • Planeación e integración de comunidades de aprendizaje en HSE. • Trabajo colaborativo entre docentes para el desarrollo de clases con enfoque de HSE.
Comunidades de aprendizaje en cada plantel	<ul style="list-style-type: none"> • La conformación de una comunidad de aprendizaje de docentes en cada plantel es un requisito fundamental del curso en línea. • Son conformadas y lideradas por el Tutor Construye T (docente que participa en el curso en línea). • Son conformadas aproximadamente un mes posterior al inicio del curso en línea. • Tienen el objetivo de compartir y transmitir los conocimientos y habilidades adquiridas por el Tutor Construye T a más docentes del plantel. • Están integradas por el Tutor Construye T y un máximo de 5 docentes del plantel, para garantizar la calidad de la capacitación.



Considerando las buenas prácticas internacionales, es crucial que las comunidades escolares trabajen colaborativamente para su transformación y mejora, por ello, la estrategia de formación fue expandida y fortalecida, en los planteles, a través del trabajo colaborativo entre docentes en los planteles. Es decir, cada docente participante en el curso o Tutor Construye T tuvo como requisito indispensable conformar una comunidad de aprendizaje con otros profesores para el desarrollo de HSE en sus escuelas y así desarrollar un círculo de aprendizaje entre pares.

Específicamente la comunidad de aprendizaje es un espacio de trabajo colaborativo entre docentes, en el cual el Tutor Construye T comparte los conocimientos adquiridos en el curso en línea con otros docentes del plantel y promueve la enseñanza de las HSE en el aula.

Una vez desarrolladas y modeladas las clases con enfoque socioemocional, los docentes que participan en la comunidad de aprendizaje utilizaron dichas clases y las técnicas aprendidas para fortalecer el aprendizaje socioemocional de sus estudiantes en sus horas de clase. Dado que el modelo de comunidades de aprendizaje en HSE es nuevo para los planteles del tipo medio superior, se recomendó a los docentes participantes que al menos durante un semestre trabajaran en la comunidad de aprendizaje inicial (iniciada y guiada por el Tutor Construye T) y que a partir del segundo semestre del ciclo escolar dichos docentes iniciaran una comunidad de aprendizaje con otros docentes del plantel.

En la plataforma de capacitación se creó una comunidad de aprendizaje virtual en la cual los Tutores Construye T pudieron compartir planeaciones de clase, buenas prácticas³⁵ y/o videos de clases con enfoque socioemocional desarrollados por ellos, sus tutorados y por la comunidad de aprendizaje del plantel, así como las capacitaciones impartidas a sus colegas. A la comunidad de práctica virtual accedieron los docentes participantes en las comunidades de aprendizaje Construye T.

Con la plataforma en línea fue posible llevar la misma calidad de contenidos a todos los docentes participantes y ofrecer flexibilidad en horario para su avance. No obstante, se mantuvo el reto de llegar a las escuelas en donde no hay acceso a Internet en el plantel ni los docentes participantes tienen acceso a una computadora con Internet desde su hogar. Los datos disponibles nos indican que en el 53.3% de los planteles públicos de educación media superior hay al menos una computadora para uso educativo con acceso a Internet³⁶. En los planteles que participaron en Construye T durante el ciclo escolar 2014-2015 se reporta que 70% de los planteles cuentan con al menos una computadora con acceso a Internet en el plantel para uso de los docentes³⁷. Finalmente, algunas estimaciones indican que aproximadamente 8 de cada 10 docentes de escuelas públicas del tipo medio superior cuentan con acceso a Internet en su casa³⁸.

En este sentido, para los docentes que no disponen de acceso a Internet se buscaron estrategias y mecanismos alternos como el envío a las escuelas de los contenidos del curso en dispositivos de almacenamiento como CD o USB.

³⁵ En la jerga educativa a la planeación de una clase se le denomina secuencia didáctica.

³⁶ Fuente: Formato 911 inicio de cursos 2013-2014, Anexo de tecnologías de la información.

³⁷ Estimaciones propias con base en la encuesta de características de los planteles Construye T, junio 2014.

³⁸ Estimaciones propias con base en la encuesta de condiciones de la oferta educativa en su módulo de media superior, cuestionario de docentes 2009, INEE. Disponible en: <http://www.inee.edu.mx/index.php/bases-de-datos/bases-de-datos-condiciones-de-la-oferta-educativa/media-superior-2009>.



1.3 Asesores expertos

Para dar acompañamiento a los docentes a través de la plataforma en línea se contrataron *asesores expertos* en desarrollo socioemocional. Estos asesores fueron capacitados en el dominio de los contenidos de la plataforma en línea. También recibieron capacitación técnica en el uso de la plataforma en línea para dar seguimiento a los avances de los docentes/directivos. Particularmente, estos expertos dieron retroalimentación, evaluaron el progreso y calificaron las evidencias y trabajos que los docentes subieron a la plataforma en línea.

Para fines de coordinación y selección de los *asesores expertos*, se contó con el apoyo de OSC y/o instituciones académicas especializadas en el desarrollo de HSE. A su vez, estas instituciones dieron a los asesores un respaldo institucional y los capacitaron en relación con los contextos y regiones de los planteles participantes.

1.4 Curso en línea para *directivos* de plantel

La plataforma de capacitación en línea contó con un curso sobre liderazgo y acciones para el desarrollo socioemocional a nivel institucional, el cual estuvo dirigido a directivos de plantel. A través de esta capacitación se proporcionaron herramientas a los directivos para potenciar la formación de sus docentes en HSE a través de la creación de comunidades de aprendizaje y estrategias que fomenten el desarrollo de HSE en todos los integrantes de la comunidad educativa y mejoren el ambiente escolar.

En el curso de directivos también se ofrecieron espacios de capacitación para Autoridades Educativas y Asesores Técnicos Pedagógicos de los distintos subsistemas del nivel medio superior.

Por la naturaleza de la gestión directiva, el curso fue de carácter ejecutivo y con una duración aproximada de 10 horas. En el Cuadro 3 se resumen las principales características del curso de capacitación en línea para directivos de plantel que fue realizado en 2015-2016.

Cuadro 3. Características del curso en línea de HSE para directivos

Modalidad	<ul style="list-style-type: none">• En línea a través de una plataforma web
Duración	<ul style="list-style-type: none">• Aproximadamente 10 horas durante un período de hasta 5 semanas.
Cobertura	Cobertura 2015-2016: <ul style="list-style-type: none">• 4,000 directivos Cobertura 2017: <ul style="list-style-type: none">• 1^{er} trimestre: 3,000 directivos y 500 autoridades educativas con acompañamiento mixto (presencial y en línea)• 2^o trimestre: 7,000 directivos y 1,000 autoridades educativas con acompañamiento en línea Cobertura total durante la fase: 15,500 participantes.
Características de la plataforma web	<ul style="list-style-type: none">• Interactivo y de fácil manejo para los directivos.• Evaluaciones en línea.• Herramientas de comunicación en línea.• Plataforma para compartir experiencias y actividades de desarrollo de HSE y de mejora del ambiente escolar a nivel plantel.

Objetivos del curso	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar HSE en los directivos para la mejora de su gestión personal e interpersonal. • Desarrollar la capacidad de los directivos para fomentar el desarrollo de HSE en estudiantes, docentes y personal de apoyo de plantel. • Proporcionar herramientas y estrategias para la mejora del ambiente escolar. • Aprender la importancia del trabajo colaborativo entre docentes y la conformación de comunidades de aprendizaje en HSE.
Contenidos	<p>Los temas que se abordaron en el curso son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las emociones y los fundamentos de la inteligencia emocional. • Marco conceptual del Programa Construye T conforme a las tres dimensiones del Programa. • La importancia de las HSE. • La importancia de las HSE en el contexto escolar. • Alfabetización socioemocional. • Estrategias para el desarrollo socioemocional de los integrantes de la comunidad escolar. • Estrategias de gestión para la mejora del ambiente escolar. • Qué son las comunidades de aprendizaje en HSE y como potenciarlas en el plantel.

1.5 Actividades complementarias de HSE en horarios de tutoría de estudiantes

Como resultado de las visitas de supervisión a planteles del tipo medio superior, se identificó que un tutor de clase en los planteles de EMS es frecuentemente un docente u orientador que atiende a los estudiantes de un grupo a su cargo mediante la observación de su desempeño académico y socio afectivo, dándoles seguimiento y orientación para su desarrollo integral. También comunica y coordina sus acciones con las de otros docentes, y en caso necesario, con otras áreas de servicios al estudiante y con los padres de familia. Asimismo, en la mayoría de los subsistemas del tipo medio superior existe al menos una hora de clase exclusiva para la tutoría de estudiantes.

Dada la complementariedad de objetivos que existe entre la tutoría de estudiantes en el plantel y el Programa Construye T, se elaboró una guía para tutores (de estudiantes), orientadores o figuras similares en el plantel sobre dinámicas específicas de desarrollo socioemocional con estudiantes. Esta guía fue diseñada para ser utilizada en las horas de clase dedicadas a la tutoría u orientación de los estudiantes y fue compartida con los planteles y docentes a través de la página web del Programa. Con esta guía se complementó el trabajo de desarrollo socioemocional que realizaron los docentes de las distintas disciplinas académicas que participaron en la comunidad de aprendizaje.

Finalmente, para el monitoreo y seguimiento de las comunidades de aprendizaje, la adopción del enfoque en HSE en las clases académicas y el uso de la guía para horarios de tutoría se contó con una plataforma de monitoreo que permitió al Tutor Construye T registrar los avances y resultados (para más detalle ver apartado VI. Monitoreo y Evaluación).




1.6 Materiales a desarrollar para la estrategia de formación de HSE

Para apoyar la realización de las acciones descritas en las secciones 1.1 a la 1.5 del presente documento se desarrollaron un conjunto de materiales de apoyo para los distintos actores participantes en el Programa (estudiantes, docentes, directivos y familiares).

1. Documentos con los contenidos de los cursos de HSE para docentes y directivos.
2. Fichas de actividades para desarrollar HSE de los estudiantes en el aula, la escuela y con la familia.
3. Guías para el desarrollo metodológico de HSE en la comunidad escolar.
4. Videos tutoriales con actividades de desarrollo de HSE.
5. Talleres virtuales.

En la Gráfica 1 se presenta el esquema de todo el proceso de formación de HSE que se desarrolló en el marco del Programa Construye T en el periodo 2015-2017.



Gráfica 1. Esquema del proceso de formación de HSE.

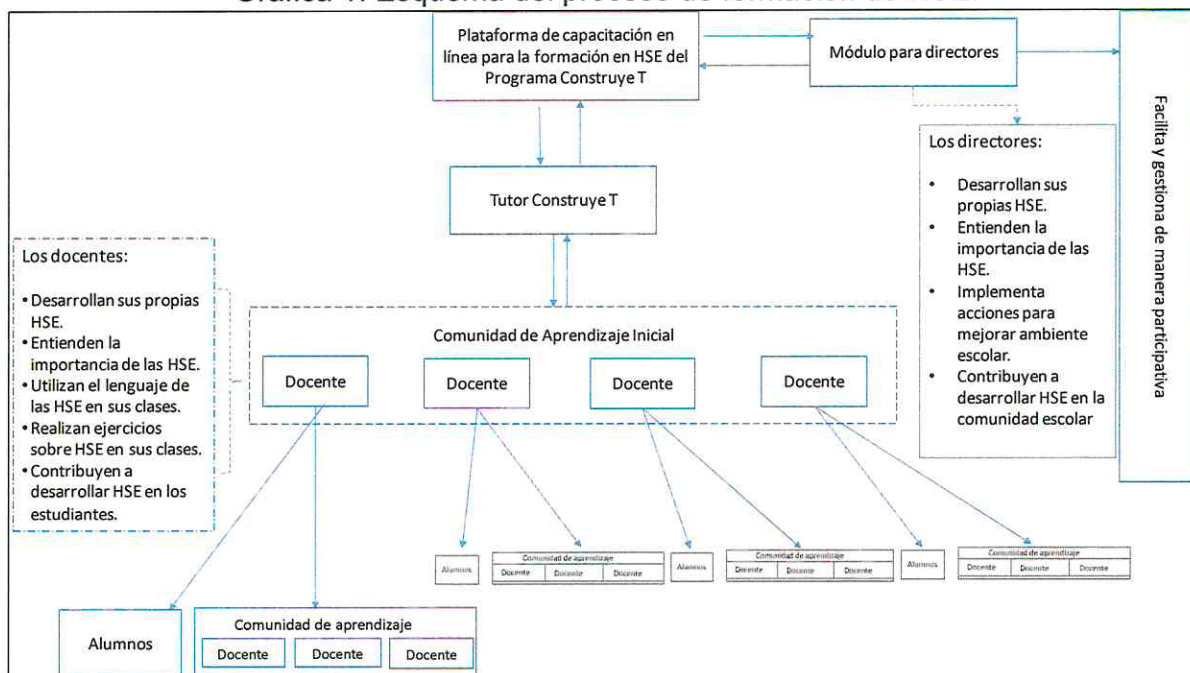

Dada la relevancia que tiene el supuesto de que los docentes pueden desarrollar las HSE de sus estudiantes en el contexto escolar, la Gráfica 2 muestra de manera esquemática el mecanismo observable de transmisión, modelaje y enseñanza de habilidades socioemocionales por parte de los docentes a los alumnos en el aula.



Gráfica 2. Mecanismo de transmisión, modelaje y enseñanza de HSE de los docentes a los alumnos.

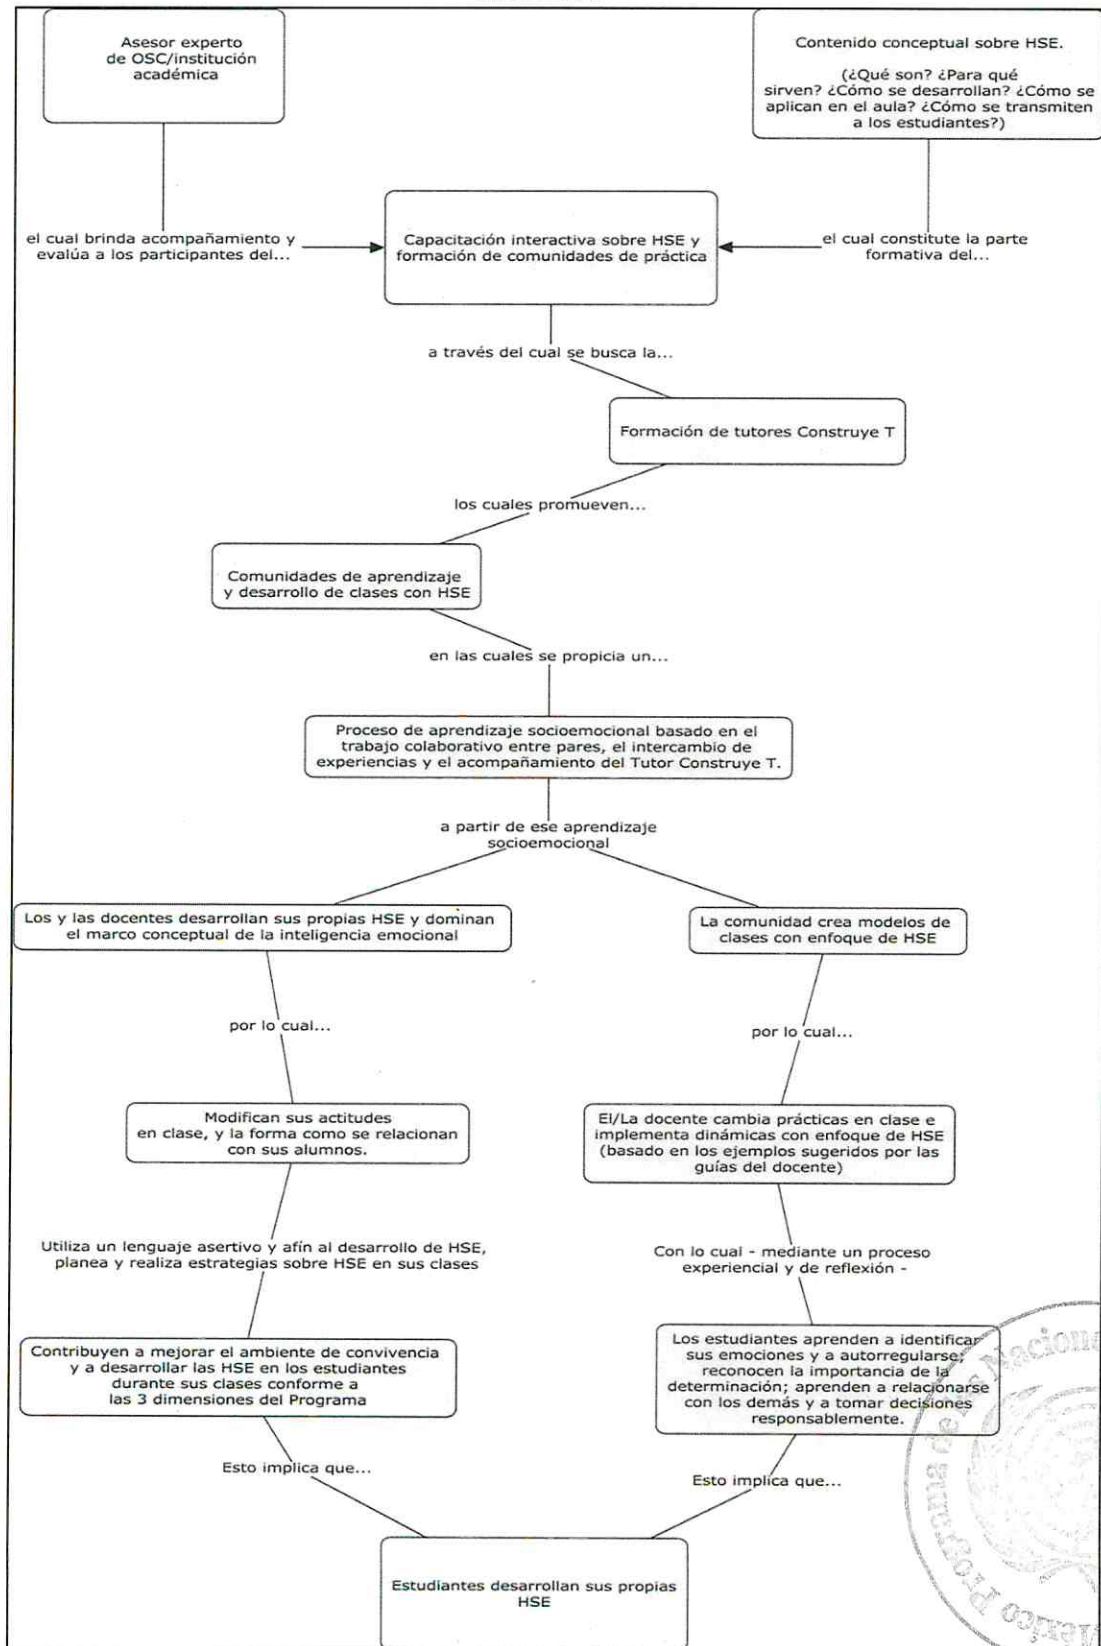

2. Gestión participativa en los planteles educativos

La noción de gestión participativa se refiere al involucramiento de todos los integrantes de una organización en el proceso de toma de decisiones gerenciales, lo cual implica que la gerencia o dirección, sin perder sus atributos de liderazgo y autoridad, utiliza la experiencia y creatividad de todos para resolver problemas.³⁹ Así pues, la gestión participativa de los planteles involucra al personal del plantel, estudiantes y padres de familia, en el proceso de solución de problemas relacionados con la escuela, sin que esto signifique una disminución del liderazgo, autoridad y responsabilidad de los directivos del plantel. Por el contrario, algunos estudios en los Estados Unidos muestran que la gestión participativa de las escuelas ofrece distintos beneficios organizacionales para la escuela y sus integrantes.⁴⁰

En este sentido, la estrategia de gestión participativa o de gestión del ambiente escolar del Programa Construye T complementa a las actividades de formación de HSE, dado que promueve la creación de un ambiente de participación idóneo para la convivencia positiva y el aprendizaje socioemocional. Así, esta gestión es relevante en tanto que integra a los estudiantes en dinámicas de participación que dan pie a un ambiente escolar más incluyente y solidario, lo cual es un factor necesario para el desarrollo integral de los jóvenes.

2.1 Acciones específicas de gestión participativa para la mejora del ambiente escolar

El clima de convivencia, como uno de los elementos fundamentales del ambiente escolar en los planteles, mantiene una relación recíproca con la formación de habilidades socioemocionales, dado que para que éstas se desarrollen adecuadamente es necesario que los jóvenes se desenvuelvan en un entorno de convivencia positiva que refuerce su aprendizaje socioafectivo y les enseñe a socializar de manera respetuosa y pacífica, y a coexistir en armonía. Por tal motivo, el Programa fomentó a través de un conjunto de materiales el desarrollo de procesos y asociaciones de gestión al interior de los planteles para fortalecer una visión institucional del desarrollo de las HSE y de mejora del ambiente escolar. El paquete de instrumentos fue proporcionado en formato electrónico al director y al tutor Construye T de cada plantel, y consistió en guías prácticas para que los planteles pudieran implementar, conforme a sus propios planes de trabajo y calendarios escolares, las acciones y mecanismos de gestión propuestos en el modelo del Programa. De manera específica, los procesos y órganos que se fomentaron en el marco del Programa en cada plantel fueron:

- a) Integración de un comité escolar con representantes de todos los actores que conforman la comunidad escolar (docentes, estudiantes, familiares, personal de apoyo del plantel, etc.).
- b) Realización de un diagnóstico de ambiente escolar con integrantes de la comunidad escolar.
- c) Elaboración de un plan de trabajo escolar que considere actividades y/o proyectos de mejora de la convivencia a lo largo del ciclo escolar.
- d) Realización de un proyecto escolar enfocado a mejorar la convivencia.

El desarrollo de las guías para orientar a los planteles en la realización de cada una de las acciones enumeradas arriba, fue realizado con el apoyo de expertos en el tema de gestión escolar participativa y convivencia escolar.

³⁹ Anthony, W.P., 1978.

⁴⁰ Day et al., 2005; Gebert et al., 2003, citados en Nadeem 2012.



2.2 Establecimiento de acuerdos de convivencia

Los acuerdos de convivencia del plantel son un instrumento fundamental para regular la convivencia entre los diferentes actores de la comunidad escolar, por tal razón se espera que surjan de un proceso participativo y que sean compartidas por todos los integrantes de la comunidad. Los planteles participantes, a través de sus comités escolares y consejos de convivencia de aula, establecieron una serie de normas claras y concretas, escritas en positivo, que fueron consensadas y compartidas por todos en el plantel.

Con la construcción participativa y consenso de las normas o acuerdos de convivencia se busca que todos los integrantes del plantel se apropien de las mismas, y las entiendan como un instrumento para mejorar su propio bienestar. Siendo así, desde la perspectiva de cada integrante del plantel, el cumplimiento de los acuerdos de convivencia resulta en una cuestión de coherencia entre los intereses propios y con los de la comunidad a la que se pertenece.

Para el establecimiento de los acuerdos de convivencia es fundamental la participación de los directivos y de los tutores Construye T, quienes guían el proceso participativo para la redacción de los mismos. El Programa entregó, como parte del paquete de instrumentos, una guía práctica que ayudó en este proceso, el cual se llevó a cabo entre 2015-2016 (puede ser anual o semestral, dependiendo de la periodicidad para el ingreso de nuevos estudiantes al plantel) y fue divulgado a toda la comunidad escolar mediante los mecanismos internos de difusión de cada plantel. Se espera que los acuerdos de convivencia tengan un alcance para todo el plantel, pudiendo existir acuerdos de convivencia por grupos o clases.


2.3 Acciones para mejorar la convivencia en el aula

El aula es el espacio formal para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje curricular dentro de los planteles educativos, pero además es un espacio vivo donde los estudiantes conviven y aprenden a convivir a través de la interacción social y el trabajo colaborativo con sus pares y con los docentes. Por ello es importante que los conflictos o situaciones dentro del aula que afectan la convivencia sean resueltos mediante la reflexión, el diálogo, la participación y la corresponsabilidad, y no mediante la sanción o el castigo. Para este propósito se realizaron materiales que contribuyeron a mejorar la calidad de la interacción docente-estudiantes y estudiantes-estudiantes al interior de las aulas.

2.4 Materiales a desarrollar para la estrategia de gestión del ambiente escolar durante 2015-2016

A continuación se presentan los tipos de materiales que fueron desarrollados para la realización de las actividades de gestión del ambiente escolar que fueron descritas en las secciones 2.1 y 2.2. Cabe resaltar que estos instrumentos son parte del acervo de materiales o paquete de instrumentos que fueron publicados en la página web del Programa:

1. Materiales para conformar el Comité Escolar Construye T.
2. Materiales para realizar el diagnóstico de ambiente escolar.
3. Materiales para realizar una planeación participativa (plan de trabajo, proyectos, etc).
4. Materiales para establecer acuerdos de convivencia en el plantel.
5. Materiales para mejorar la convivencia en el aula.
6. Otros materiales que permitan dar estrategias específicas a los planteles, considerando la diversidad de contextos y poblaciones en los que se encuentran localizados.



3. Mecanismos de apoyo para fortalecer la apropiación del Programa por parte de los planteles

a. Generación de incentivos para la participación

Para facilitar la adopción de las dos estrategias propuestas, el Programa planteó la creación de un sistema de incentivos basados en el reconocimiento público y el prestigio social mediante un esquema de reconocimientos que motive la adopción del enfoque de HSE por parte de docentes y directivos en los planteles participantes. Algunas experiencias latinoamericanas, como el premio Educador Nota 10, de Brasil, el premio Compartir al Maestro, de Colombia, el premio Maestro que deja Huella, de Perú, muestran el éxito de reconocer socialmente la labor del docente⁴¹.

Además de motivar la participación de los docentes y directivos en las estrategias propuestas por el Programa, la implementación de un esquema de reconocimientos y certificaciones permite identificar y sistematizar prácticas con enfoque de HSE innovadoras y exitosas dentro de las aulas y en la gestión de los planteles. En este sentido, se planteó un esquema de reconocimientos Construye T para docentes, directivos y planteles que hayan destacado durante un ciclo escolar debido a la implementación de prácticas o acciones innovadoras que favorezcan la convivencia positiva dentro de los planteles y/o la formación de HSE en los alumnos. El reconocimiento Construye T para docentes que reconociera acciones dentro del aula, mientras que el reconocimiento Construye T para directivos y planteles reconociera acciones de mejora de la gestión del ambiente escolar en todo el plantel⁴².

b. Posicionamiento del enfoque de HSE y fomento a la convivencia positiva mediante acciones de comunicación social

La formación de habilidades socioemocionales y la mejora de la convivencia al interior de los planteles educativos son procesos permanentes que requieren de una presencia constante del Programa. En este sentido, los instrumentos de comunicación social juegan un papel importante como complemento de las actividades de capacitación y de formación. Para fortalecer la presencia y efecto del Programa en los planteles, se plantea una estrategia de comunicación con los siguientes elementos:

- Posicionamiento digital

Tiene como objetivo la difusión permanente, a través de la página web del Programa, de materiales y contenidos, con enfoque en HSE que se dirijan a directivos, docentes y alumnos. Esta estrategia se fortaleció a través de correos electrónicos a los directivos y docentes capacitados y redes sociales.

- Posicionamiento físico

El objetivo de este elemento de la estrategia de comunicación era mantener una presencia visual permanente en los planteles, generando un mayor posicionamiento de la imagen del Programa y transmitiendo el concepto de habilidades socioemocionales. Para este componente se consideraron al menos dos canales físicos⁴³:

⁴¹ Vaillant, D. y Rossel, C., 2010.

⁴² El Equipo Técnico eliminó la estrategia de certificación a planteles Construye T, considerando que el área a cargo del Programa en la SEP no tiene facultades para certificar planteles.

⁴³ En la versión original del Documento de proyecto, agosto 2015, se contemplaba el envío de carteles con información de Construye T a los planteles y la promoción de realización de murales en cada plantel. El Equipo Técnico decidió sustituir estas

- a) Lonas Construye T
- b) USB Construye T con copias electrónicas de los materiales del Programa

Las lonas fueron diseñadas y producidas por el PNUD a través de la Coordinación Técnica del Programa (ver apartado V. Arreglos de gestión, numeral 1 función de los participantes), quien los distribuyó a los planteles o, bien, pudieron ser producidos por los propios planteles bajo los lineamientos de diseño y contenido que establezca el Equipo Técnico. Para la elaboración de los diseños y materiales de difusión, el PNUD tomó como insumos las propuestas realizadas por los propios estudiantes según las convocatorias que fueron emitidas por la Coordinación Técnica del proyecto.

- Seguimiento en video

El seguimiento en video consiste en la grabación y edición de videos con el objetivo de capturar historias y anécdotas motivacionales sobre la manera como los estudiantes y docentes utilizan las HSE en sus vidas, dentro y fuera del plantel. Estos videos se produjeron desde los mismos planteles, siguiendo los lineamientos de contenido establecidos por el Equipo Técnico. Posteriormente, algunos fueron publicados en la página de internet del Programa para ser compartidos con toda la comunidad Construye T y el público en general, y se enviaron vínculos a través de la lista de correos registrada de los participantes en Construye T. El equipo de la Coordinación Técnica del Proyecto también realizó visitas a los planteles con la finalidad de captar historias de éxito y experiencias positivas vinculadas a la implementación de Construye T.

- c. Sistema de Monitoreo en Línea

Para asegurar que la implementación del Programa en los planteles se llevara a cabo de acuerdo a su diseño institucional y al modelo de intervención planteado por el PNUD y la SEP, se contó con un Sistema de Monitoreo Permanente en línea, con especial enfoque a resultados. Los objetivos principales de este sistema fueron recabar información que permitiera medir las actividades y los resultados de la intervención, además de la identificación de oportunidades de mejora en el diseño del Programa. Es decir, a través de este sistema de monitoreo, el PNUD y la SEP tuvieron información sobre la manera como el Programa incidió en la convivencia dentro de los planteles, el ambiente escolar, y utilización del enfoque de HSE en el aula por parte de los docentes. En tal sentido, el Sistema recogió información proveniente de los planteles escolares que permitió medir cambios en la convivencia escolar, en la percepción y comportamiento de los estudiantes, así como en el nivel de conocimiento y uso, por parte de los docentes y directivos, de las herramientas del enfoque de HSE proporcionadas por el Programa.

Esta información fue obtenida, de manera muestral, directamente de los docentes y alumnos por medio de encuestas diseñadas por el equipo de la Coordinación Técnica del Proyecto, con apoyo de expertos en HSE, que fueron enviadas y contestadas en línea. Lo anterior, facilitó la comunicación ágil con los docentes del Programa por correo electrónico. Además, el Sistema recolectó información a través de los directivos y tutores Construye T sobre aspectos de la gestión participativa del plantel, y el avance en la creación de las comunidades de aprendizaje. Para lograr esto, se contó con una plataforma en línea, a la cual tuvieron acceso mediante clave los directivos y tutores Construye T de planteles participantes.

estrategias con el envío de material en formato de USB para que pueda ser reproducido de acuerdo a los espacios disponibles en cada plantel y para optimizar los recursos en rubros de impresión y envío de materiales. Además, se identificó que la estrategia de elaboración de murales no era ágil ni económicamente viable para todos los planteles, ya que implicaba la compra de pintura y en muchos casos también se requería gestionar permisos para dicha actividad.

4. Estrategia 2019-2020


Para el ciclo escolar 2019-2020 se consideran los siguientes cuatro nuevos componentes, cuyos propósitos se describen a continuación:

Componente	Propósitos
I. Responsabilidad social	Impulsar el compromiso de los jóvenes para contribuir en acciones que promuevan una sociedad más justa y la protección del medio ambiente. De manera específica, más no limitativa, se promoverán habilidades socioemocionales vinculadas a los programas de alfabetización y reforestación del Gobierno de México. A través de esta participación, se buscará que los jóvenes pongan en práctica las habilidades de conciencia social y colaboración. El diseño de este componente estará alineado a las metas y enfoque de la Agenda 2030.
II. Educación Sexual	Promover habilidades socioemocionales que coadyuven a conductas responsables en los jóvenes en los ámbitos de la sexualidad, la prevención del embarazo y la violencia. A través de este componente también se impulsará la perspectiva de género y el desarrollo de nuevas masculinidades en los jóvenes.
III. Deporte	Desarrollar en las y los jóvenes habilidades como la colaboración, la empatía y el trabajo en equipo a través de actividades físicas, deportivas y recreativas.
IV. Artes	Desarrollar en las y los jóvenes la identificación, expresión y regulación de emociones a través de actividades artísticas.

Cabe señalar que el programa mantendrá en su diseño el componente de sesiones de aprendizaje socioemocional en el aula o instrucción explícita de las habilidades socioemocionales, el cual fue desarrollado durante el periodo 2017-2018 con base en buenas prácticas a nivel internacional y tomando en consideración elementos de las teorías del aprendizaje, teorías del cambio de comportamiento y las neurociencias. Para el periodo 2019-2020, este componente podrá implementarse de acuerdo a las condiciones operativas y contextuales en los planteles.

Para la implementación de los componentes mencionados (cuatro componentes nuevos y uno elaborado previamente), el proyecto realizará actividades que fortalecen las capacidades de los planteles en materia de desarrollo socioemocional. Es decir, las actividades estarán diseñadas para que el personal de los planteles adquiera los conocimientos y competencias para implementar directamente los diversos componentes del programa en su plantel. Para este fin, específicamente se llevarán a cabo las siguientes acciones:

- a) Una estrategia de **capacitación en línea** dirigida al personal de las escuelas encargado de implementar el programa. Con estos cursos se proporcionarán herramientas y estrategias pedagógicas de desarrollo de las habilidades socioemocionales en diversos ámbitos escolares y comunitarios, elementos básicos del desarrollo socioemocional en el docente y los estudiantes, perspectiva de género y vinculación con la Agenda 2030.



b) **Materiales pedagógicos**, particularmente se desarrollarán manuales con los contenidos y metodologías para implementar las actividades de desarrollo socioemocional con los estudiantes. Asimismo, se desarrollarán guías de implementación para el personal del plantel, las cuales proporcionarán el paso a paso y las acciones de preparación para implementar el programa y la sistematización de resultados.

c) Una **estrategia de acompañamiento en línea** a través de la cual se realizará el monitoreo de la implementación del programa (en las escuelas participantes), la atención de dudas sobre contenidos de capacitación, materiales y/o la estrategia de implementación en su plantel y se generará el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas entre los planteles.

d) Considerando que el programa estará dirigido a todas las escuelas públicas de educación media superior, la SEMS y el PNUD realizarán conjuntamente diversas **acciones de difusión** del programa a nivel nacional e internacional a través de las cuales se buscará incentivar la participación de los jóvenes y docentes en las actividades del programa, así como posicionar a Construye T como una intervención líder en México y Latinoamérica.

e) Se establecerán **alianzas y acciones de vinculación interinstitucional** con otros actores o dependencias de gobierno, previo acuerdo con SEMS, que permitan potenciar la eficacia y la eficiencia en el desarrollo de habilidades socioemocionales para los componentes de responsabilidad social, educación sexual, deporte y artes.

f) Se **desarrollarán modelos alternativos de aprendizaje socioemocional**, los cuales estarán dirigidos a poblaciones en desventaja o modalidades educativas cuyas necesidades requieran de una intervención estratégica. Estos modelos pueden considerar variantes en la estrategia operativa, adecuaciones en los contenidos pedagógicos y/o en las actividades propuestas a los planteles. La escala de implementación de los modelos piloto se definirá en conjunto con la SEMS. El alcance sustantivo y financiero de los modelos piloto se realizará en función de la disponibilidad del presupuesto.

g) El PNUD colaborará con la SEMS como principal asociado, en diseñar e implementar canales de comunicación ágiles y eficaces con los planteles y subsistemas del nivel medio superior, con la finalidad de que, en el mediano y largo plazo, los planteles cuenten con las capacidades y directrices necesarias que les permitan implementar de forma autónoma el programa y/o adaptarlo, con base en criterios técnicos, a la atención de necesidades presentes en sus diversos contextos educativos.

Resultados Esperados

La estrategia de intervención de Construye T consiste en que los estudiantes del nivel medio superior desarrollen sus habilidades sociales y emocionales desde un enfoque de desarrollo integral a través de sesiones formativas escolares y comunitarias dirigidas por los docentes.



Para el periodo 2019-2020, Construye T busca avanzar en el fortalecimiento de la capacidad de los planteles para desarrollar habilidades socioemocionales en los estudiantes a través de diversos ámbitos del contexto escolar, en específico, los resultados esperados en el **corto plazo** son:

- Los docentes capacitados amplían su conocimiento sobre las habilidades socioemocionales y como enseñarlas en diversos espacios escolares y comunitarios.
- Los docentes capacitados implementan con mayor fidelidad las actividades de desarrollo socioemocional en espacios escolares y comunitarios.
- Los estudiantes participan en las actividades de desarrollo socioemocional de sus planteles y aprenden sobre las habilidades socioemocionales asociadas a la responsabilidad social, educación sexual, deporte y artes.
- El programa desarrolla modelos alternativos efectivos y con viabilidad de implementarse a gran escala en contextos, subsistemas o planteles con necesidades que requieran de una intervención estratégica.




III. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

Resultado e indicador del CPD: El Estado mexicano habrá implementado una estrategia de desarrollo social integral que garantice el cumplimiento de los Derechos Humanos mediante la articulación de políticas que contribuyan a la disminución de la pobreza, la mejora de la calidad de vida y la disminución de las desigualdades de género, edad, etnia, económica, de localización geográfica y condición de discapacidad, sustentada en esquemas de diálogo político y participación social inclusiva. Indicador Efecto: 1.3 Índice de Desarrollo Humano e Índice de Desarrollo Relativo al Género. Áreas prioritarias Plan Estratégico: Igualdad, equidad e inclusión social.

Nombre de Proyecto: Cuarta Fase: Apoyo a las y los jóvenes del tipo medio superior para el desarrollo de su proyecto de vida y la prevención de conductas de riesgo, Programa Construye T.

Marco de resultados del Programa Construye T (2015-2016)


Resultados	Indicadores	Línea de base	Meta	Medio de verificación	Riesgos y supuestos
Outcomes (cambios a mediano plazo en la situación/problema que atiende el programa)					
Ambiente escolar mejorado	Porcentaje de estudiantes que están de acuerdo o muy de acuerdo en que la escuela es un lugar que los hace sentir bien.	72%	mes 13 del Plan Anual de Operación: 80%	Encuesta de línea base y encuestas de seguimiento de la evaluación de impacto del Programa.	Las acciones de gestión participativa y de formación de HSE tienen efectos en el mediano plazo.
	Porcentaje de directivos que consideran que la relación entre docentes es buena o muy buena.	90%	mes 13 del Plan Anual de Operación: 95%	Encuesta de línea base y encuestas de seguimiento de la evaluación de impacto del Programa.	Las acciones de gestión participativa y de formación de HSE tienen efectos en el mediano plazo.



Resultados	Indicadores	Línea de base	Meta	Medio de verificación	Riesgos y supuestos
	<p>a) Porcentaje de directivos que mencionan sentirse orgullosos de su plantel.</p> <p>b) Porcentaje de docentes que mencionan sentirse orgullosos de su plantel.</p> <p>c) Porcentaje de estudiantes que mencionan sentirse orgullosos de su plantel.</p>	No disponible	mes 13 del Plan Anual de Operación: 75%	Aplicación de encuestas del Sistema de monitoreo del Programa.	Las acciones de gestión participativa y de formación de HSE tienen efectos en el mediano plazo.
	Porcentaje de docentes que se sienten orgullosos de su trabajo.	81%	mes 13 del Plan Anual de Operación: 85%	Encuesta de línea base y encuestas de seguimiento de la evaluación de impacto del Programa.	Las acciones de gestión participativa y de formación de HSE tienen efectos en el mediano plazo
Outputs (productos y servicios tangibles/intangibles que se integran con las actividades del Programa)					
Habilidades socioemocionales (HSE) formadas y fortalecidas	Incremento porcentual en el número de estudiantes que están de acuerdo en que sus docentes les preguntan su opinión y los animan a participar en clase.	mes 1 del Plan Anual de Operación: 0%	mes 13 del Plan Anual de Operación: 50%	Aplicación de encuestas del Sistema de monitoreo del Programa.	Los docentes adoptan el enfoque propuesto por el Programa y lo aplican en sus clases.
	Incremento porcentual en el número de docentes que aplican técnicas con enfoque de HSE en sus clases.	mes 1 del Plan Anual de Operación: 0%	mes 13 del Plan Anual de Operación: 50%	Encuestas del Sistema de monitoreo del Programa.	Los docentes adoptan el enfoque propuesto por el Programa y lo aplican en sus clases.



Resultados	Indicadores	Línea de base	Meta	Medio de verificación	Riesgos y supuestos
Mecanismos de gestión participativa y convivencia positiva implementados en los planteles	Disminución porcentual en el número de estudiantes a los que sus profesores han hecho comentarios que los lastiman o hacen sentir mal.	mes 1 del Plan Anual de Operación: 0%	mes 13 del Plan Anual de Operación: 30%	Encuestas del Sistema de monitoreo del Programa.	Los docentes adoptan el enfoque propuesto por el Programa y lo aplican en sus clases.
	Incremento porcentual en el número de estudiantes que afirman llevarse bien con sus compañeros.	mes 1 del Plan Anual de Operación: 0%	mes 13 del Plan Anual de Operación: 30%	Encuestas del Sistema de monitoreo del Programa.	No hay resistencia a implementar las acciones de mejora de la convivencia escolar.
	Incremento porcentual en el número de docentes que afirman intercambiar estrategias con otros docentes para mejorar la convivencia de los estudiantes en el aula.	mes 1 del Plan Anual de Operación: 0%	mes 13 del Plan Anual de Operación: 50%	Encuestas del Sistema de monitoreo del Programa.	No hay resistencia a implementar las acciones de mejora de la convivencia escolar.
	a) Disminución porcentual en el número de alumnos que consideran que existen casos frecuentes de acoso escolar (bullying) en el plantel. b) Disminución porcentual en el número de docentes que consideran que existen casos frecuentes de acoso escolar (bullying) en el plantel.	mes 1 del Plan Anual de Operación: 0%	mes 13 del Plan Anual de Operación: 40%	Encuestas del Sistema de monitoreo del Programa.	No hay resistencia a implementar las acciones de mejora de la convivencia escolar.



Resultados	Indicadores	Línea de base	Meta	Medio de verificación	Riesgos y supuestos
	Porcentaje de planteles con Comité Construye T instalado y/o renovado.	No disponible	mes 13 del Plan Anual de Operación: 90%	Sistema de monitoreo del Programa	Existe voluntad en los planteles participantes para implementar las acciones de gestión participativa.
	Porcentaje de planteles cuyo Comité Construye T sesiona al menos tres veces por semestre.	No disponible	mes 13 del Plan Anual de Operación: 90%	Sistema de monitoreo del Programa	Existe voluntad en los planteles participantes para implementar las acciones de gestión participativa.
	Porcentaje de planteles que cuentan con acuerdos de convivencia	No disponible	mes 13 del Plan Anual de Operación: 90%	Sistema de monitoreo del Programa	Existe voluntad en los planteles participantes para implementar las acciones de gestión participativa.
Actividades (Serie de acciones que permiten crear los productos del Proyecto)					
Crear el curso en línea en HSE para los tutores Construye T	Plataforma en línea con contenidos formativos disponible y funcional.	mes 1 del Plan Anual de Operación: 0% de avance en el desarrollo de la plataforma	mes 5 del Plan Anual de Operación: 100% de avance en el desarrollo de la plataforma	Entregables del consultor contratado para el desarrollo de la plataforma.	Los procesos de licitación de las consultorías para desarrollar contenidos y plataforma se llevan a cabo en tiempo y forma.

Resultados	Indicadores	Línea de base	Meta	Medio de verificación	Riesgos y supuestos
Formar Tutores Construye T en el curso de HSE	Porcentaje de tutores que se gradúan del curso en HSE	mes 1 del Plan Anual de Operación: 0%	mes 11 del Plan Anual de Operación: 75%	Registro de participantes y resultados del curso en línea.	Los docentes se interesan en el curso y la tasa de abandono es cercana a cero.
Fomentar que los docentes participen en las comunidades de aprendizaje.	Porcentaje de planteles con al menos 10% de sus docentes participando en comunidades de aprendizaje	mes 1 del Plan Anual de Operación: 0%	mes 13 del Plan Anual de Operación: 75%	Sistema de monitoreo del Programa.	Existe interés de los docentes en participar en las comunidades de aprendizaje.
Publicar los términos de referencia (TOR) para el desarrollo del Sistema de Monitoreo y Evaluación.	Documento de TOR publicado	mes 1 del Plan Anual de Operación: 0%	mes 2 del Plan Anual de Operación: 100%	Página institucional de PNUD	Existe la disponibilidad presupuestal y se hace la transferencia de recursos en tiempo y forma.
Desarrollar la plataforma en línea para el Sistema de Monitoreo y Evaluación.	Plataforma en línea con contenidos formativos disponible y funcional.	mes 1 del Plan Anual de Operación : 0% de avance en el desarrollo de la plataforma	mes 6 del Plan Anual de Operación: 100% de avance en el desarrollo de la plataforma	Entregables del consultor contratado para el desarrollo de la plataforma.	Los procesos de licitación de las consultorías para desarrollar contenidos y plataforma se llevan a cabo en tiempo y forma.
Generar incentivos para la adopción del enfoque de HSE en los planteles	Aumento porcentual en el número de planteles participantes que cumplen con el perfil Construye T.	mes 1 del Plan Anual de Operación: 0%	mes 13 del Plan Anual de Operación: 30%	Encuestas del Sistema de monitoreo del Programa.	Los esquemas de incentivos propuestos por el Programa funcionan.




Resultados	Indicadores	Línea de base	Meta	Medio de verificación	Riesgos y supuestos
	Documento de la propuesta de reconocimientos/certificaciones Construye T	mes 1 del Plan Anual de Operación: 0	mes 5 del Plan Anual de Operación: 100%	Convocatorias de participación publicadas.	Los planteles responden a las convocatorias publicadas.
Generar contenidos de comunicación social para difundir el enfoque de HSE	Porcentaje de contenidos difundidos (con respecto al total de contenidos elaborados y/o adaptados).	mes 1 del Plan Anual de Operación: 0%	mes 13 del Plan Anual de Operación: 90%	Publicaciones en medios electrónicos e impresos.	Existe la capacidad técnica para

Marco de resultados del Programa Construye T (2016-2018)

Resultados	Indicadores	Línea de base	Meta	Modo de cálculo	Medio de verificación	Riesgos y supuestos
Resultados Intermedios (cambios a corto/mediano plazo en la situación/problema que atiende el programa)						
CONFLICTOS EN EL PLANTEL						
Ambiente Escolar Mejorado	Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar (directores, docentes y estudiantes) que reportan no observar agresiones entre estudiantes en su plantel	Directores = 46%	mes 23 del Plan Anual de Operación: 50%	Número de directores que reportan no observar agresiones físicas entre estudiantes en el plantel dividido entre el total de directores encuestados multiplicado por cien	Aplicación de encuestas del Sistema de monitoreo del Programa/Encuesta de Seguimiento	Las acciones de gestión del ambiente escolar y de formación de HSE tienen efectos en el mediano plazo.
		Docentes: 79%	mes 23 del Plan Anual de Operación: 85%	Número de docentes que reportan no observar agresiones físicas entre estudiantes en el plantel dividido entre el total de docentes encuestados multiplicado por cien	Aplicación de encuestas del Sistema de monitoreo del Programa/Encuesta de Seguimiento	Las acciones de gestión del ambiente escolar y de formación de HSE tienen efectos en el mediano plazo.
		Estudiantes: 53%	mes 23 del Plan Anual de Operación: 55%	Número de estudiantes que reportan no observar agresiones físicas entre estudiantes en el plantel dividido entre el total de estudiantes encuestados multiplicado por cien	Aplicación de encuestas del Sistema de monitoreo del Programa/Encuesta de Seguimiento	Las acciones de gestión del ambiente escolar y de formación de HSE tienen efectos en el mediano plazo.




Resultados	Indicadores	Línea de base	Meta	Modo de cálculo	Medio de verificación	Riesgos y supuestos
FORMAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS						
	a) Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar (directores, docentes y estudiantes) que considera que la forma en que se resuelven los problemas que se presentan en el plantel es muy buena o buena	No disponible. Se agrega pregunta a sistema de monitoreo del programa	mes 23 del Plan Anual de Operación: Incremento de 5 puntos porcentuales	Número de directores, docentes y estudiantes que consideran que la forma en que se resuelven los problemas que se presentan en el plantel es "muy buena" o "buena" dividido entre el total de encuestados multiplicado por cien	Aplicación de encuestas del Sistema de monitoreo del Programa/Encuesta de Seguimiento	Las acciones de gestión del ambiente escolar y de formación de HSE tienen efectos en el mediano plazo.
DINÁMICA DE LA RELACIÓN ENTRE LOS ACTORES						
	a) Porcentaje de directores que manifiestan que la relación con su personal docente es muy buena o buena	No disponible. Se agrega pregunta a sistema de monitoreo del programa	mes 23 del Plan Anual de Operación: Incremento de 5 puntos porcentuales	Número de directores que manifiestan que la relación con su personal docente es "muy buena" o "buena" dividido entre el total de directores encuestados multiplicado por cien	Aplicación de encuestas del Sistema de monitoreo del Programa/Encuesta de Seguimiento	Las acciones de gestión del ambiente escolar y de formación de HSE tienen efectos en el mediano plazo.
	b) Porcentaje de docentes que manifiestan que la relación con su director y con sus estudiantes es muy buena o buena	No disponible. Se agrega pregunta a sistema de monitoreo del programa	mes 23 del Plan Anual de Operación: Incremento de 5 puntos porcentuales	Número de docentes que manifiestan que la relación con su director y con sus estudiantes es "muy buena" o "buena" dividido entre el total de docentes encuestados multiplicado por cien	Aplicación de encuestas del Sistema de monitoreo del Programa/Encuesta de Seguimiento	Las acciones de gestión del ambiente escolar y de formación de HSE tienen efectos en el mediano plazo.
	c) Porcentaje de estudiantes que manifiestan que la relación con sus docentes es muy buena o buena	No disponible. Se agrega pregunta a sistema de monitoreo del programa	mes 23 del Plan Anual de Operación: Incremento de 5 puntos porcentuales	Número de estudiantes que manifiestan que la relación con sus docentes es "muy buena" o "buena" dividido entre el total de estudiantes encuestados multiplicado por cien	Aplicación de encuestas del Sistema de monitoreo del Programa/Encuesta de Seguimiento	Las acciones de gestión del ambiente escolar y de formación de HSE tienen efectos en el mediano plazo.
	d) Porcentaje de directores que conoce el nombre de pila de todos sus docentes	76%	mes 23 del Plan Anual de Operación: 86%	Número de directores que manifiestan conocer el nombre de pila de todos sus docentes dividido	Aplicación de encuestas del Sistema de monitoreo del	Las acciones de gestión del ambiente escolar y de formación de




Resultados	Indicadores	Línea de base	Meta	Modo de cálculo	Medio de verificación	Riesgos y supuestos
	e) Porcentaje de docentes que conoce el nombre de pila de más del 60% de sus estudiantes	63%	mes 23 del Plan Anual de Operación: 86%	Número de docentes que manifiestan conocer el nombre de pila de más del 60% de sus estudiantes dividido entre el total de docentes encuestados multiplicado por 100	Programa/Encuesta de Seguimiento	HSE tienen efectos en el mediano plazo. Las acciones de gestión del ambiente escolar y de formación de HSE tienen efectos en el mediano plazo.
EXISTENCIA DE CANALES DE COMUNICACIÓN						
	Porcentaje integrantes de la comunidad escolar (directores, docentes y estudiantes) que están muy de acuerdo o acuerdo en que existen canales de comunicación eficientes para transmitir sus opiniones en el plantel	No disponible. Se agrega pregunta a sistema de monitoreo del programa	mes 23 del Plan Anual de Operación: Incremento de 5 puntos porcentuales	Número de directores, docentes y estudiantes que manifiestan estar "muy de acuerdo" o "de acuerdo" en que los canales de comunicación del plantel son eficientes dividido entre el total de encuestados multiplicado por 100	Aplicación de encuestas del Sistema de monitoreo del Programa/Encuesta de Seguimiento	Las acciones de gestión del ambiente escolar y de formación de HSE tienen efectos en el mediano plazo.
EXISTENCIA DE UN CLIMA DE CONFIANZA						
	Porcentaje de directores que consideran que la confianza hacia su personal docente es muy buena o buena	No disponible. Se agrega pregunta a sistema de monitoreo del programa	mes 23 del Plan Anual de Operación: Incremento de 5 puntos porcentuales	Número de directores manifiestan que la confianza hacia su personal docente es "muy buena" o "buena" dividido entre el total de encuestados multiplicado por 100	Aplicación de encuestas del Sistema de monitoreo del Programa/Encuesta de Seguimiento	Las acciones de gestión del ambiente escolar y de formación de HSE tienen efectos en el mediano plazo.
	Porcentaje de docentes que consideran que la confianza hacia su director y hacia sus estudiantes es muy buena o buena	No disponible. Se agrega pregunta a sistema de monitoreo del programa	mes 23 del Plan Anual de Operación: Incremento de 5 puntos porcentuales	Número de docentes que manifiestan que la confianza hacia su director y hacia sus estudiantes es "muy buena" o "buena" dividido entre el total de encuestados multiplicado por 100	Aplicación de encuestas del Sistema de monitoreo del Programa/Encuesta de Seguimiento	Las acciones de gestión del ambiente escolar y de formación de HSE tienen efectos en el mediano plazo.

Resultados	Indicadores	Línea de base	Meta	Modo de cálculo	Medio de verificación	Riesgos y supuestos
				encuestados multiplicado por 100		
	Porcentaje de estudiantes que consideran que la confianza hacia sus docentes es muy buena o buena	No disponible. Se agrega pregunta a sistema de monitoreo del programa	mes 23 del Plan Anual de Operación: Incremento de 5 puntos porcentuales	Número de estudiantes que manifiestan hacia sus docentes es "muy buena" o "buena" dividido entre el total de encuestados multiplicado por 100	Aplicación de encuestas del Sistema de monitoreo del Programa/Encuesta de Seguimiento	Las acciones de gestión del ambiente escolar y de formación de HSE tienen efectos en el mediano plazo.
	Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar (directores, docentes y estudiantes) que se sienten seguros en su plantel	No disponible. Se agrega pregunta a sistema de monitoreo del programa	mes 23 del Plan Anual de Operación: Incremento de 5 puntos porcentuales	Número de directores, docentes y estudiantes que mencionan sentirse seguros en su plantel dividido entre el total de encuestados multiplicado por cien	Aplicación de encuestas del Sistema de monitoreo del Programa/Encuesta de Seguimiento	Las acciones de gestión del ambiente escolar y de formación de HSE tienen efectos en el mediano plazo.
SATISFACCIÓN						
	Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar (directores, docentes y estudiantes) que se sienten orgullosos de su plantel	No disponible. Se agrega pregunta a sistema de monitoreo del programa	mes 23 del Plan Anual de Operación: 75%	Número de directores, docentes y estudiantes que mencionan sentirse orgullosos de su plantel dividido entre el total de encuestados multiplicado por cien	Aplicación de encuestas del Sistema de monitoreo del Programa/Encuesta de Seguimiento	Las acciones de gestión del ambiente escolar y de formación de HSE tienen efectos en el mediano plazo.
	Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar (directores, docentes y estudiantes) que están de acuerdo o muy de acuerdo en que el plantel es un lugar que los hace sentir bien	No disponible. Se agrega pregunta a sistema de monitoreo del programa	mes 23 del Plan Anual de Operación: Incremento de 8 puntos porcentuales	Número de directores, docentes y estudiantes que mencionan que están "muy de acuerdo" o "de acuerdo" en que el plantel es un lugar que los hace sentir bien dividido entre el total de encuestados multiplicado por cien	Aplicación de encuestas del Sistema de monitoreo del Programa/Encuesta de Seguimiento	Las acciones de gestión del ambiente escolar y de formación de HSE tienen efectos en el mediano plazo.
Habilidades socioemocionales (HSE) formadas y fortalecidas	Porcentaje de docentes que aplican al menos una actividad Construye T en clase por semana	Mes 1 del Plan Anual de Operación: 0%	mes 23 del Plan Anual de Operación: 25%	Número de docentes que manifiestan haber aplicado al menos una actividad Construye T en clase por semana dividido entre el total de docentes encuestados	Encuestas del Sistema de monitoreo del Programa.	Los docentes adoptan el enfoque propuesto por el Programa y lo aplican en sus clases.



Resultados	Indicadores	Línea de base	Meta	Modo de cálculo	Medio de verificación	Riesgos y supuestos
	Porcentaje de estudiantes que reportan que al menos uno de sus docentes realizó una actividad Construye T en su clase en los últimos tres meses	mes 1 del Plan Anual de Operación: 0%	mes 23 del Plan Anual de Operación: 50%	Número de estudiantes que manifiestan que al menos uno de sus docentes aplicó una actividad Construye T en su clase dividido entre el total de estudiantes encuestados	Aplicación de encuestas del Sistema de monitoreo del Programa.	Los docentes adoptan el enfoque propuesto por el Programa y lo aplican en sus clases.
Productos (bienes y servicios tangibles/intangibles que se integran con las actividades del Programa)						
Acciones para el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales implementadas	Porcentaje de planteles que cuentan con una comunidad de aprendizaje en operaciones	mes 1 del Plan de Operación: 0%	1a generación, mes 13 del Plan Anual de Operación: 75% 2a generación, mes 23 del Plan Anual de Operación: 75%	Número de planteles que cuentan con una comunidad de aprendizaje en operaciones dividido entre el total de planteles intervenidos	Sistema de monitoreo del Programa	Existe voluntad en los planteles participantes para implementar las acciones de gestión participativa.
	Porcentaje de planteles que cuentan con un Tutor Construye T graduado del curso en línea en HSE	mes 1 del Plan de Operación: 0%	1a generación, mes 13 del Plan Anual de Operación: 75% 2a generación, mes 23 del Plan Anual de Operación: 75%	Número de planteles que cuentan con un Tutor Construye T dividido entre el total de planteles intervenidos	Registro de participantes y resultados del curso en línea.	Los contenidos y actividades del curso en línea son de utilidad para los docentes y las autoridades educativas facilitan el acceso a Internet en los planteles.
	Porcentaje de planteles que cuentan con su director graduado del curso en línea en HSE	mes 1 del Plan de Operación: 0%	1a generación, mes 13 del Plan Anual de Operación: 75% 2a generación, mes 23 del Plan Anual de Operación: 75%	Número de planteles que cuentan con su Director graduado del curso en línea de HSE dividido entre el total de planteles intervenidos	Registro de participantes y resultados del curso en línea.	Los contenidos y actividades del curso en línea son de utilidad para los docentes y las autoridades educativas facilitan el acceso a Internet en los planteles.
Acciones para la mejora del ambiente escolar implementadas	Porcentaje de planteles con Comité Construye T instalado y/o renovado.	No disponible	mes 23 del Plan Anual de Operación: 90%	Número de planteles que cuentan con un Comité Construye T instalado y/o renovado dividido entre el	Sistema de monitoreo del Programa	Existe voluntad en los planteles participantes para implementar las acciones de mejora



Resultados	Indicadores	Línea de base	Meta	Modo de cálculo	Medio de verificación	Riesgos y supuestos del ambiente escolar
	Porcentaje de planteles que realizan Plan de Trabajo de manera participativa	mes 1 del Plan de Operación: 0%	mes 23 del Plan Anual de Operación: 90%	Número de planteles que desarrollaron un plan de trabajo de manera participativa dividido entre el total de planteles intervenidos	Sistema de monitoreo del Programa	Existe voluntad en los planteles participantes para implementar las acciones de mejora del ambiente escolar
	Porcentaje de planteles que establecieron acuerdos de convivencia	No disponible	mes 23 del Plan Anual de Operación: 90%	Número de planteles que establecieron sus acuerdos de convivencia de manera participativa dividido entre el total de planteles intervenidos	Sistema de monitoreo del Programa	Existe voluntad en los planteles participantes para implementar las acciones de mejora del ambiente escolar



Marco de resultados del Programa Construye T (2019-2020)

Resultados	Indicadores	Línea de base	Meta	Modo de cálculo	Medio de verificación	Riesgos y supuestos
Resultados a corto plazo						
Resultado 1 Los docentes capacitados amplían su conocimiento sobre las habilidades socioemocionales y como enseñarlas en diversos espacios escolares y comunitarios.	1.1 Proporción de planteles públicos de EMS con al menos un docente que acreditó los cursos de capacitación de Construye T implementados en 2019-2020	0%	30%	Número de planteles públicos de EMS con al menos un docente que acreditó los cursos de capacitación de Construye T dividido entre el número total de planteles públicos de EMS	Cuestionarios como parte del curso de capacitación	Los planteles tienen interés en el Programa, por lo que motivan a los docentes a capacitarse.
	1.2 Proporción de docentes capacitados en 2019 que sienten confianza para guiar las sesiones escolares y comunitarias de HSE	0%	50%	Número de docentes capacitados que sienten confianza para guiar las sesiones escolares y comunitarias de HSE dividido entre el total de docentes capacitados	Cuestionarios como parte del curso de capacitación	Los contenidos del curso en línea son útiles y permiten a los docentes adquirir las competencias necesarias para implementar el Programa.
	1.3 Proporción de docentes capacitados en 2019 que saben cómo utilizar la oferta de materiales didácticos para implementar el programa	0%	40%	Número de docentes capacitados que saben cómo utilizar la oferta de materiales didácticos para implementar el programa dividido entre el total de docentes capacitados	Cuestionarios como parte del curso de capacitación	Los contenidos del curso en línea son útiles y permiten a los docentes adquirir las competencias necesarias para implementar el Programa.
	1.4 Proporción de docentes capacitados en 2019 que sienten que cuentan con herramientas para orientar a otros docentes acerca del programa Construye T	0%	30%	Número de docentes capacitados que sienten que cuentan con herramientas para orientar a otros docentes acerca del programa Construye T dividido entre el total de docentes capacitados	Cuestionarios como parte del curso de capacitación	Los contenidos del curso en línea son útiles y permiten a los docentes adquirir las competencias necesarias para implementar el Programa.
Resultado 2 Los docentes capacitados implementan con mayor fidelidad las actividades de desarrollo socioemocional en espacios escolares y comunitarios.	2.1 Porcentaje de planteles públicos con al menos un docente capacitado en 2019 que implementa Construye T (desglosado por componente)	0%	50%	Número de planteles públicos con al menos un docente capacitado que implementa Construye T dividido entre el número total de planteles públicos de EMS con al menos un docente capacitado	Encuestas cara a cara y/o en línea con los actores de la comunidad escolar.	Los planteles tienen interés y tiempo para implementar el Programa

Resultado 3 <i>Los estudiantes participan en las actividades de desarrollo socioemocional de sus planteles y aprenden sobre las habilidades socioemocionales asociadas a la responsabilidad social, educación sexual, deporte y artes.</i> Nota: *Se refiere a cálculo con respecto a los planteles que implementan cada componente	3.1 Proporción de estudiantes por plantel que participan en actividades de responsabilidad social*	0%	10%	Número de estudiantes por plantel que participan en actividades deportivas, artísticas o de educación sexual* dividido entre el total de estudiantes encuestados en el plantel	Encuestas cara a cara y/o en línea con los actores de la comunidad escolar.	Los planteles implementan el Programa y fomentan la participación de los estudiantes en las acciones vinculadas
	3.2 Proporción de estudiantes por plantel que participan en actividades deportivas, artísticas o de educación sexual*	0%	30%	Número de docentes que consideran que el modelo piloto es compatible con las condiciones del plantel dividido entre el total de docentes encuestados	Encuestas cara a cara y/o en línea con los actores de la comunidad escolar.	Los planteles implementan el Programa y fomentan la participación de los estudiantes en las acciones vinculadas
Resultado 4 <i>El programa desarrolla modelos alternativos efectivos y con viabilidad de implementarse a gran escala en contextos, subsistemas o planteles con necesidades que requieran de una intervención estratégica.</i>	4.1 Proporción de docentes que consideran que el modelo piloto es compatible con las condiciones del plantel	0%	55%	Número de estudiantes que califican positivamente el modelo piloto implementado en el plantel dividido entre el total de docentes encuestados	Encuestas cara a cara y/o en línea con los actores de la comunidad escolar.	El diseño de los modelos alternativos responde a las necesidades de los planteles que requieren intervenciones estratégicas.
	4.2 Proporción de estudiantes que califican positivamente el modelo piloto implementado en el plantel	0%	30%	Encuestas cara a cara y/o en línea con los actores de la comunidad escolar.	El diseño de los modelos alternativos responde a las necesidades de los planteles que requieren intervenciones estratégicas.	

Nota: Dado que el periodo de ejecución y colaboración del proyecto será extendido, el marco de resultados considera únicamente los resultados de corto plazo presentados en la Teoría de Cambio del proyecto para el periodo 2019-2020.



IV. PLAN ANUAL DE OPERACIÓN

Al inicio del proyecto, las actividades operativas se programaron durante el ciclo escolar 2015-2016 y consideraban una vigencia de operación hasta el mes de septiembre de 2016. Durante la primera revisión sustantiva (octubre de 2016) se extendió la vigencia del proyecto por 15 meses para actividades operativas y se adicionaron recursos equivalentes a \$5,263,157.89 USD.

Durante la segunda revisión sustantiva (diciembre de 2017) se extiende la operación del proyecto hasta marzo de 2019. En esta revisión no se agregan recursos financieros y se hará uso de las economías generadas durante 2017.


A continuación se presentan los Planes Anuales de Operación para el ciclo 2015-2016, 2016-2017, para el periodo enero 2018-marzo 2019 y abril 2019 a marzo de 2020. De presentarse algún desfase en la disponibilidad de recursos, el PNUD realizará propuestas de ajuste a la calendarización de actividades y al inicio de la operación en los planteles.

Plan Anual de Operación para el ciclo 2015-2016


Productos	Meta anual	Actividades planeadas	Mes												Responsabilidad			
			sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago		sep		
1. Documentos con los contenidos teórico-práctico y materiales del curso en HSE para docentes/directivos.	Contenidos del curso elaborados	Selección y contratación de experto en HSE para brindar asesoría técnica a la Coordinación del Proyecto. Publicación de términos de referencia para el desarrollo de contenidos Selección y contratación de consultor/institución especializada		X														Equipo Técnico (SEP y PNUD)
				X														Equipo Técnico (SEP y PNUD)
							X											Equipo Técnico (SEP y PNUD)

Productos	Meta anual	Actividades planeadas	Mes												Responsabilidad			
			sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jun	ago		sep		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		
		Desarrollo del curso en HSE para docentes/directivos					X	X	X	X	X	X						Consultor /institución especializada
		Validación de contenidos por instituciones especializadas						X		X	X	X						Institución especializada y Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Publicación de términos de referencia para el desarrollo de fichas y videos		X														Equipo Técnico (SEP y PNUD)
	162 fichas de ejercicios de desarrollo socioemocional	Selección y contratación de consultores/instituciones especializadas		X				X										Equipo Técnico (SEP y PNUD)
	9 videos con ejercicios prácticos de desarrollo de HSE	Publicación de las fichas de HSE en página web (54 fichas por trimestre)											X					Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Publicación de videos de HSE en la página web (3 videos por trimestre)															X	Equipo Técnico (SEP y PNUD)
3.Listado de asesores expertos capacitados en los	Al menos 60 asesores expertos	Publicación de convocatoria para instituciones y/o OSC										X						Equipo Técnico (SEP y PNUD)

Productos	Meta anual	Actividades planeadas	Mes												Responsabilidad					
			sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago		sep				
contenidos y alcances del curso	capacitados en los contenidos y alcances del curso	para la integración de los equipos de asesores expertos																	Equipo Técnico (SEP y PNUD)	
		Selección de instituciones y/o OSC con sus respectivos equipos de asesores expertos									X									
4. Plataforma de capacitación en línea para docentes y directivos	Plataforma de capacitación en línea elaborada y funcionando óptimamente Asesores expertos capacitados en el uso de la plataforma de capacitación en línea	Capacitación de asesores expertos acerca de los contenidos del curso en HSE																		Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Publicación de términos de referencia para el desarrollo de la plataforma de capacitación en línea						X	X											
4. Plataforma de capacitación en línea para docentes y directivos	Asesores expertos capacitados en el uso de la plataforma de capacitación en línea	Selección y contratación de institución desarrolladora de la plataforma																		Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Desarrollo de la plataforma en línea										X	X							
																				Institución desarrolladora de plataforma de capacitación




Productos	Meta anual	Actividades planeadas	Mes												Responsabilidad				
			sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jun	ago		sep			
5. Listados de docentes y directivos participantes en el curso en línea de HSE	4,000 docentes o tutores Construye T inscritos y participando en el curso en línea	Pruebas de funcionamiento de la plataforma									X								Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Capacitación de asesores expertos sobre el uso de la plataforma de capacitación en línea para trabajo con docentes									X		X						
	1,500 directivos de planteles de nuevo ingreso a Construye T	Definición del perfil de los participantes por parte del Equipo Técnico								X									Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Definición del mecanismo de invitación, registro y selección de docentes a participar en el curso									X								
		Publicación de convocatoria para docentes sobre participación en el curso															X		Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Selección de docentes participantes (inscritos) en el curso															X		Equipo Técnico (SEP y PNUD)




Productos	Meta anual	Actividades planeadas	Mes												Responsabilidad			
			sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago		sep		
		Realización de sesiones de inducción al curso con los docentes en sedes estatales												X	X			Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Participación de docentes en el curso en línea														X	X	Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Participación de directivos en el curso en línea (10 horas)												X	X			Equipo Técnico (SEP y PNUD)
6. Listados de docentes participantes en la capacitación de HSE a través de las comunidades de práctica	Aproximadamente 20,000 docentes participando en el curso a través de comunidades de práctica	Recolección de los datos de contacto de los participantes en las comunidades de aprendizaje y práctica Construye T														X	X	Equipo Técnico (SEP y PNUD)
7. Guía para desarrollo de HSE en espacios de tutoría y orientación	Guía elaborada	Participación de docentes en el curso a través de las comunidades de práctica (4 meses)															X	Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Publicación de términos de referencia para el desarrollo de la guía de HSE en espacios de tutoría		X														Equipo Técnico (SEP y PNUD)




Productos	Meta anual	Actividades planeadas	Mes												Responsabilidad			
			sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago		sep		
8. Guía para la organización y establecimiento de convivencia y guía para el establecimiento de acuerdos de convivencia	2 Guías elaboradas	Selección y contratación de consultor/institución especializada					X											Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Desarrollo de la guía					X				X	X						Consultor externo
		Publicación de la guía en la página web del Programa															X	Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Publicación de términos de referencia para el desarrollo de las guías sobre convivencia escolar							X								X	Equipo Técnico (SEP y PNUD) Nota: La guía de consejos de convivencia de aula, no se realizará conforme a lo acordado en la Junta de Proyecto, ya que era un órgano que podría representar más carga de gestión para los docentes. En su lugar se elabora una guía con 20 ideas para mejorar la convivencia en el aula.
		Selección y contratación de consultor/institución especializada															X	Equipo Técnico (SEP y PNUD)




Productos	Meta anual	Actividades planeadas	Mes												Responsabilidad		
			sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago		sep	
9. Guía para la conformación del Comité Escolar Construye T, guía para la realización del diagnóstico participativo y guía para la planeación participativa en los planteles	3 Guías elaboradas	Desarrollo de las guías					X	X	X	X	X						Consultor externo
		Publicación de las guías en la página web del Programa							X						X		Equipo Técnico (SEP y PNUD)
10. Plan de trabajo del posicionamiento del enfoque de HSE y fomento a la convivencia positiva mediante acciones de comunicación social		Publicación de términos de referencia para el desarrollo de las guías		X													Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Selección y contratación de consultor/institución especializada															Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Desarrollo de las guías						X	X	X	X						Consultor externo
		Publicación de las guías en la página web del Programa									X					X	Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Publicación de términos de referencia del encargado en comunicación y del webmaster del Programa			X		X										Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Selección y contratación del encargado en comunicación y del				X											Equipo Técnico (SEP y PNUD)



Productos	Meta anual	Actividades planeadas	Mes												Responsabilidad						
			sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago		sep					
		webmaster del Programa																			
		Elaboración del plan de trabajo de la estrategia de comunicación general								X	X										Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Elaboración del plan de trabajo de la estrategia de posicionamiento digital (página web y redes sociales)								X	X										Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Elaboración de materiales para la estrategia de posicionamiento digital (página web y redes sociales)																			Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Desarrollo del posicionamiento en medios digitales																			Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Elaboración del plan de trabajo del posicionamiento por medios físicos/impresos																			Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Elaboración de materiales para la																			Equipo Técnico (SEP)



Productos	Meta anual	Actividades planeadas	Mes												Responsabilidad			
			sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jun	ago		sep		
		<p>estrategia de posicionamiento por medios físicos/impresos</p> <p>Desarrollo del posicionamiento en medios físicos/impresos</p>															X	Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Desarrollo de la plataforma de monitoreo en línea						X	X	X	X							Institución desarrolladora de plataforma de monitoreo
11. Plataforma de seguimiento y monitoreo en línea	Plataforma de monitoreo en línea elaborada y funcionando óptimamente	Docentes y directivos utilizando la plataforma de monitoreo para reportar avances y resultados															X	Equipo Técnico (SEP y PNUD)
12. Bases de datos de la plataforma de seguimiento y monitoreo en línea	Bases de datos sobre las actividades y resultados del programa actualizadas	Envío de comunicaciones oficiales a directivos y tutores Construye T para el llenado y actualización de la plataforma de seguimiento y monitoreo.															X	SEP




Productos	Meta anual	Actividades planeadas	Mes												Responsabilidad															
			sep 1	oct 2	nov 3	dic 4	ene 5	feb 6	mar 7	abr 8	may 9	jun 10	jun 11	ago 12		sep 13														
13. Informe de resultados de la evaluación de procesos y seguimiento a resultados de Construye T	Evaluación de procesos y seguimiento a resultados implementada y que considera el nuevo diseño, alcance y cobertura del Programa	Actualización de las bases de datos del seguimiento y monitoreo en línea															X	X	X									Equipo Técnico (SEP y PNUD)		
		Publicación de términos de referencia para la evaluación															X													Equipo Técnico (SEP y PNUD)
		Selección y contratación de institución evaluadora																								X			Equipo Técnico (SEP y PNUD)	
		Desarrollo de instrumentos y preparación de estrategia operativa en campo																									X			Institución evaluadora
		Levantamiento en campo de instrumentos																											X	Institución evaluadora
		Sistematización de bases de datos y elaboración de informe de resultados																											X	Institución evaluadora


Nota: El producto *Metodología de certificación a planteles y estrategia de reconocimiento a docentes y directivos* (número 10 en el Anexo I del Acuerdo firmado en agosto de 2015), no se realizó en este ciclo, se realizará, de acuerdo a la Junta de Proyecto, para el periodo 2016-2017, ya que se requiere que los planteles se apropien de las estrategias de Construye T.




Productos	Meta	Actividades planeadas	2017												Responsabilidad						
			2016			oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun		jun	ago	sep	oct	nov	dic
15. Plataforma de capacitación funcionando óptimamente y listados de docentes y directivos inscritos y participando en las diferentes modalidades de los cursos de Construye T	3,000 docentes y 3,000 directivos de planteles de nueva incorporación inscritos y participando en los cursos	Adaptación digital y pilotaje de los cursos para docentes y directivos en la modalidad con acompañamiento mixto	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Equipo Técnico (SEP y PNUD)
	Constuye T en la modalidad con acompañamiento mixto	Integración y capacitación de equipos de asesores expertos	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
	31,000 docentes de todos los planteles participando en los cursos	Adaptación digital y pilotaje de los cursos en modalidad con acompañamiento en línea																			
	Constuye T en la modalidad de acompañamiento	Implementación de los cursos de docentes y directivos en la																			




Productos	Meta	Actividades planeadas	2016												2017												Responsabilidad
			2016			2017																					
			oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic										
	miento en línea	modalidad con acompañamiento en línea (todos los planteles)																									
	100% de los telebachilleratos participantes tienen acceso a los cursos Construye T desde sus planteles en una modalidad autogestiva y que no requiere conexión a Internet	Adaptación digital y pilotaje de los cursos en versión para telebachilleratos						x	x	x																	
	Comunidad de Aprendizaje diseñada y piloteada para su implementación a gran escala	Implementación de los cursos de docentes y directivos en modalidad para telebachilleratos y/o subsistemas con poca conectividad																									
		Planeación y desarrollo digital de la Comunidad de Aprendizaje Virtual ConstruyeT																									
		Operación de la Comunidad de Aprendizaje Virtual																									



Productos	Meta	Actividades planeadas	2017												Responsabilidad						
			2016													2017					
			oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jun	ago	sep		oct	nov	dic			
	Materiales con recopilación de buenas prácticas para la mejora del ambiente escolar	Publicación de la guía en la página web del Programa	14	15	16					19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
18. Metodología para la identificación de docentes, directivos y planteles que implementan exitosamente Construye T	Estrategia de reconocimiento o a docentes, directivos y planteles implementada	Concursos de buenas prácticas y evento de entrega de reconocimientos a docentes, directivos y/o planteles			x				x							x					Equipo Técnico (SEP y PNUD)
19. Plan de trabajo del posicionamiento del enfoque de HSE y fomento a la convivencia positiva mediante acciones de comunicación social	3,000 planteles nuevos cuentan con materiales físicos/ impresos del Programa Posicionamiento del Programa en medios digitales	Entrega de lonas y USB a planteles nuevos Campañas en diversos medios digitales																			Equipo Técnico (SEP y PNUD)



Productos	Meta	Actividades planeadas	2016		2017												Responsabilidad		
			oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov		dic	
	(página web y redes sociales)		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
20. Plataforma de seguimiento y monitoreo en línea en óptimo funcionamiento	Plataforma de monitoreo en línea elaborada y funcionando óptimamente	Operación de la plataforma de monitoreo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x		Equipo Técnico (SEP y PNUD)
21. Bases de datos de la plataforma de seguimiento y monitoreo en línea	Bases de datos sobre las actividades y resultados del programa actualizadas bimestralmente	Descarga trimestral de las bases de datos de la plataforma de seguimiento y monitoreo en línea			x						x			x			x		Equipo Técnico (SEP y PNUD)
22. Informe de resultados del seguimiento a la evaluación de impacto del Programa	Seguimiento a la evaluación de impacto implementada y que considera el diseño, alcance y cobertura del Programa, así como acciones	Sistematización de bases de datos y entrega de informe de resultados												x					Equipo Técnico (SEP y PNUD)




Productos	Meta	Actividades planeadas	2016		2017											Responsabilidad			
			oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jun	ago	sep	oct		nov	dic	
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		27	28	
23. Informe de resultados de los encuentros estatales con docentes y directivos	diferenciadas para una muestra de planteles Docentes y directivos comparten experiencias de implementación y buenas prácticas del programa	Organizar los eventos en cada entidad federativa Sistematizar los resultados					x	x											Equipo Técnico (SEP y PNUD)

Nota: El Equipo Técnico (SEP y PNUD) es responsable de dar seguimiento y validación a todas las actividades del Plan Anual Operativo.




Plan Anual de Operación enero 2018-marzo 2019

#	Categoría	Actividades	Productos	2018												2019				
				ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar		
				29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43		
1	Evaluación y seguimiento	Estudio de investigación cualitativa sobre los resultados del programa en una muestra de planteles	Bases de datos Reporte de resultados					X	X											
2	Evaluación y seguimiento	Estudio de medición del tiempo promedio de exposición a la intervención de Construye T en una muestra de planteles	Bases de datos Reporte de resultados						X			X								
3	Evaluación y seguimiento	Encuestas para el seguimiento a la evaluación de resultados de HSE	Bases de datos y reportes operativos					X	X							X		X		
4	Evaluación y seguimiento	Estudio de medición de fidelidad de la implementación	Bases de datos Reporte de resultados						X					X						
5	Evaluación y seguimiento	Proyecto piloto para mejorar las HSE	Reporte de resultados								X							X		
6	Difusión del programa	Campaña de posicionamiento del programa en medios	Propuesta de campaña					X												




Plan Anual de Operación abril 2019 - marzo 2020


#	Componente	Productos	Actividades	2019												2020		
				abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar			
1	Arte	Guía de HSE a través del arte	Definición del plan de trabajo PNUD-INBA para elaboración y validación de contenidos	X	X	X	X	X										
2	Arte	Videotutorial del componente	Definir contenidos y realizar producción				X	X										
3	Arte	Campañas mensuales de difusión en redes sociales/página web	Realizar propuestas de elementos de comunicación y difusión del componente					X	X	X	X	X	X	X				
4	Deportes	Guía de HSE a través de actividades deportivas y lúdicas	Definición de plan de trabajo PNUD-Aliado para elaboración y validación de contenidos	X	X	X	X	X										
5	Deportes	Videotutorial del componente	Definir contenidos y realizar producción				X	X										




#	Componente	Productos	Actividades	2019												2020		
				abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar			
6	Deportes	Campañas mensuales de difusión en redes sociales	Realizar propuestas de elementos de comunicación y difusión del componente	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55			
7	Educación sexual	Guía de Educación Sexual con perspectiva de género y HSE	Definición de plan de trabajo PNUD- Aliado para elaboración y validación de contenidos	X	X	X	X	X						X				
8	Educación sexual	Videotutorial del componente	Definir contenidos y realizar producción				X	X										
9	Educación sexual	Foro/webinar sobre Ed. Sexual con expertos en el tema	Identificar expertos y preparar programa				X	X	X	X								
10	Responsabilidad Social	Establecimiento de grupo técnico	Coordinar y reunirse cada 15 días/ mes para establecer líneas de difusión y comunicación conjunta de los programas				X											




#	Componente	Productos	Actividades	2019												2020		
				abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar			
11	Responsabilidad Social	Videotutorial del componente	Definir contenidos y realizar producción	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55			
12	Responsabilidad Social	Campañas de comunicación digital para fomentar participación en programas de Resp. Social en la escuela y la comunidad "jóvenes con responsabilidad social y agenda 2030"	Realizar propuestas de elementos de comunicación y difusión del componente				X	X	X	X	X	X	X					
13	Responsabilidad Social	Folleto digital para estudiantes sobre Agenda 2030	Realizar propuesta de difusión de la agenda 2030 para jóvenes				X	X	X	X								
14	ASE Aula	Videotutorial del componente	Definir contenidos y realizar producción				X	X										
15	ASE Aula	Estrategia de acompañamiento para planteles que realizan este componente	Ajustar plataforma Contratar y capacitar asesores						X	X	X	X						
16	Capacitación	Nuevo curso de habilidades socioemocionales	Diseño de contenidos del curso en línea				X											



#	Componente	Productos	Actividades	2019												2020			
				abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar				
				44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55				
17	Capacitación		Elaborar los contenidos teóricos y guiones instruccionales de 10 horas de capacitación (contenidos, evaluaciones inicial y final, recursos descargables)				X												
18	Capacitación		Producción y edición de videos del curso				X	X	X										
19	Capacitación		Montaje de curso en plataforma.				X	X	X			X							
20	Capacitación		Operación del curso				X	X	X			X	X						
21	Redes y posicionamiento del programa	Guía de implementación del programa	Realizar guía de implementación con todos los componentes del proyecto				X	X	X			X	X						
22	Redes y posicionamiento del programa	Video de difusión del programa	Definir contenidos y realizar producción. Producción de video. Lanzamiento de video				X	X	X			X	X						



#	Componente	Productos	Actividades	2019												2020		
				abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar			
23	Redes y posicionamiento del programa	Evento de relanzamiento del programa	Identificar expertos y preparar programa Anunciar la conferencia en redes	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55			
24	Redes y posicionamiento del programa	Colaborativo Latinoamericano de Educación Socioemocional	Establecer los criterios para la conformación del Colaborativo Conformar la red de expertos liderada por PNUD						X	X								
25	Modelos pilotos estratégicos	Estrategia general de operación	Identificación de planteles con condiciones especiales Diagnóstico de necesidades de planteles seleccionados Diseño de la estrategia de implementación						X	X	X							



V. ARREGLOS DE GESTIÓN

Este Proyecto está dirigido a contribuir a desarrollar habilidades socioemocionales y mejorar el ambiente escolar de los planteles participantes, como iniciativa de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), financiada con recursos públicos. Todo lo relativo a la gestión del Proyecto se hará en función de los lineamientos y reglamentos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Durante la ejecución del Proyecto, el Asociado en la Implementación, en coordinación con el PNUD podrá realizar los cambios necesarios que permitan ajustar el proceso de implementación en los planteles participantes.

1. Función de los participantes

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). La SRE, a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), es la contraparte oficial entre el gobierno de México y el PNUD por disposiciones del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica. Sus principales responsabilidades son:

- Actuar como contraparte oficial del gobierno mexicano ante el PNUD en su calidad de responsable de la cooperación técnica de México; concretamente, formalizar la aprobación de los documentos de Proyectos de cooperación que las entidades federales, estatales y privadas presenten al PNUD de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo;
- De ser necesario, solicitar por escrito con suficiente antelación informes escritos al PNUD sobre el avance del Proyecto;
- Aprobar, en coordinación con la SEMS y el PNUD, las Revisiones Sustantivas y Presupuestarias del Proyecto:
 - Por Revisión Sustantiva se entiende todo ajuste o cambio al diseño del Proyecto, tanto a los objetivos, enfoques o conceptos como al Análisis de la Situación, las Estrategias el Marco Lógico, los Arreglos de Gestión, el Monitoreo y la Evaluación, o el Plan Anual de Operación. Toda Revisión Sustantiva podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del Proyecto e implicará la realización de una Revisión Presupuestaria.
 - Por Revisión Presupuestaria se entiende todo ajuste o cambio en el monto total de los recursos asignados al Proyecto; en la distribución entre los componentes de gasto del Proyecto –es decir, entre líneas presupuestales–; en los períodos de ejecución del Proyecto; y/o, en el estatus del ejercicio de los recursos. Una Revisión Presupuestaria no necesariamente requiere de una Revisión Sustantiva, aunque toda Revisión Sustantiva implicará una Revisión Presupuestaria. Existen cinco tipos de Revisión Presupuestaria:
 - Total, que consiste en modificar el monto total de los recursos asignados al Proyecto.
 - General, que consiste en modificar la distribución de los recursos asignados al Proyecto entre líneas presupuestales, sin afectar el monto total de los recursos del Proyecto.
 - De Reprogramación, que consiste en transferir recursos no gastados de un año calendario al siguiente año calendario.
 - Semifinal, que consiste en revisar el presupuesto del Proyecto al cierre operativo del mismo.


- Final, que consiste en revisar el gasto final del Proyecto, transcurrido el plazo para emitir el informe combinado de gastos final por parte del PNUD.
- Aprobar el plan de auditoría anual para los Proyectos y convocar a la reunión de información y consulta previa al ejercicio de auditoría de acuerdo a las normas y procedimientos del PNUD;
- Participar en las reuniones de la Junta del Proyecto;
- Participar en las reuniones de seguimiento o reorientación que se requieran.

La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) es donante y Asociada en la Implementación del Proyecto. Sus principales responsabilidades son:

- Realizar las aportaciones financieras necesarias en la cuenta bancaria del PNUD, para el desarrollo de las actividades del Proyecto conforme al calendario de pagos establecido en el acuerdo de contribución
- Formar parte de la Junta del Proyecto;
- Designar al Director/a del Proyecto;
- Proporcionar la asesoría técnica para el desarrollo del Proyecto;
- Aprobar, en coordinación con la SRE y el PNUD, las Revisiones Sustantivas y Presupuestarias del Proyecto;
- Aportar la información y los datos necesarios para que se cumplan los resultados planificados del Proyecto;
- Participar junto con el PNUD en el proceso de selección del/de la Coordinador/a Técnico/a y el/la Coordinador/a Financiero del Proyecto;
- Designar, mediante carta dirigida al PNUD, el nombre y la función de la(s) persona(s) autorizada(s) para firmar, en nombre del Asociado en la Implementación, las Revisiones Sustantivas y Presupuestarias, y
- Designar, mediante el Formato de Control de Firmas Reconocidas del PNUD, el nombre de la(s) persona(s) autorizada(s) para realizar los procesos que requiera la operación cotidiana del Proyecto, tales como correspondencia en general; solicitudes de pago directo; contratos y subcontratos; adelantos; reclamos de viaje; anticipos de fondos; informes financieros trimestrales para los proyectos bajo esa modalidad e informes combinados de gasto; reversiones de cargos y pagos de costos compartidos.

Director/a del Proyecto. Es el/la servidor/a público/a asignado/a por la Subsecretaría de Educación Media Superior a cargo del Proyecto. Sus principales funciones son:

- Junto con la Coordinación Técnica del Proyecto, dar seguimiento a las actividades del Plan Anual de Operación acordado por la Junta del Proyecto y asegurar el logro de los resultados;
- Fungir como enlace permanente entre el PNUD, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Coordinación Técnica del Proyecto para asegurar los insumos necesarios pactados para la ejecución del Proyecto;
- Verificar la planificación y el avance de las actividades del Proyecto;
- Junto con la Coordinación Técnica del Proyecto supervisar la elaboración de la documentación técnica y administrativa del Proyecto;
- Junto con la Coordinación Técnica del Proyecto supervisar la elaboración de los informes técnicos del Proyecto (anual y final);
- Facilitar la vinculación con autoridades educativas federales y estatales;
- Establecer la relación con los directivos y el personal docente de las escuelas donde se implementa el Proyecto;
- Dar seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Operación;



- Aportar la información técnica por parte de la SEMS que permita fortalecer la implementación del Proyecto;
- Participar en el proceso de selección del/de la Coordinador/a Técnico/a y el/la Coordinador/a Financiero y consultorías del Proyecto, y
- Establecer la vinculación con las dependencias gubernamentales que apoyan al Proyecto.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El PNUD es la red mundial de desarrollo establecida por Naciones Unidas cuyo mandato es promover el desarrollo de los países y vincularlos con los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para ayudar a sus pueblos a forjar una vida mejor. Sus principales responsabilidades son:

- Designar un Oficial de Programa responsable de la asesoría sustantiva y operativa, el seguimiento y apoyo al desarrollo de las actividades del Proyecto;
- Formar parte de la Junta del Proyecto;
- Administrar los recursos financieros según el Plan Anual de Operación revisado y aprobado por la Junta del Proyecto, e informar al Asociado en la Implementación y a la Junta del Proyecto sobre su origen y destino;
- Aprobar, en coordinación con la SRE y la SEMS, las Revisiones Sustantivas y Presupuestarias del Proyecto;
- Proporcionar a la SEMS, de conformidad con los incisos a) y c) del Artículo IV del Acuerdo entre la SEP y el PNUD, relativo a la participación de terceros en la financiación de los gastos del proyecto “Cuarta Fase: Apoyo a las y los jóvenes del tipo medio superior para el desarrollo de su proyecto de vida y la prevención de conductas de riesgo, Programa Construye T” (Acuerdo), los informes técnicos del Proyecto (anual y final).
- Proporcionar a la SEMS, de conformidad con los incisos b), d) y e) del Artículo IV del Acuerdo, los informes financieros del Proyecto.
- Participar junto con la SEMS en el proceso de selección del/de la Coordinador/a Técnico/a y el/la Coordinador/a Financiero del Proyecto;
- Supervisar y dar seguimiento a cada una de las actividades del Proyecto que requieran apoyo administrativo del PNUD;
- Aprovechar la red de contactos nacionales e internacionales para una mejor gestión del Proyecto;
- Contratar, con recursos del Proyecto, las evaluaciones y auditorías externas que se estimen necesarias y vigilar sus procedimientos;
- Asesorar técnicamente al Proyecto sobre mejores prácticas en materia de planeación, monitoreo y evaluación, y
- Asesorar técnicamente al Proyecto para que éste incluya de forma transversal la equidad de género y el enfoque de derechos humanos. Estos servicios especializados se proporcionarán sobre la base de recuperación total de costos.

Los arreglos entre el PNUD y el Asociado en la Implementación para la realización de los productos del Proyecto se describen en el apartado correspondiente al “Plan Anual de Operación”.

Coordinación Técnica del Proyecto. Es el equipo, liderado por el/la Coordinador/a Técnico/a, responsable de asegurar y gestionar en tiempo y forma los insumos técnicos y procesos administrativos para las actividades del Proyecto. Las principales funciones son:

- En coordinación con los representantes del Asociado en la Implementación:


- Elaborar, implementar y monitorear el cumplimiento del Plan Anual de Operación;
- Elaborar la documentación técnica del Proyecto;
- En coordinación con el Oficial de Programa del PNUD, seleccionar al Coordinador/a Financiero del Proyecto.
- Establecer los presupuestos (anuales y trimestrales);
- Elaborar la documentación administrativa del Proyecto;
- Elaborar los informes técnicos (anual y final);
- Elaborar los informes financieros según el Acuerdo;
- Llevar a cabo los procesos de selección del personal del Proyecto y consultorías que requiera la implementación del Proyecto;
- Gestionar ante el PNUD los insumos técnicos y los procesos administrativos necesarios para el desarrollo del Proyecto;
- Informar a la Junta del Proyecto sobre el avance de las actividades del Proyecto, problemas y posibles soluciones adoptadas y/o recomendaciones sugeridas para la consecución de los objetivos y resultados;
- Preparar y presentar un informe de la situación del Proyecto ante la Junta del Proyecto.
- Supervisar y asegurar el cumplimiento de las tareas del personal contratado por el PNUD conforme a los criterios de contratación especificados en la Guía de gestión de Proyectos;
- Fungir como Secretario/a Técnico/a de la Junta del Proyecto.
- En coordinación con el Coordinador/a Financiero del Proyecto, preparar y presentar un informe financiero de la situación del Proyecto ante la Junta del Proyecto.

Coordinación Financiera del Proyecto. Es responsable de asegurar y gestionar en tiempo y forma los procesos administrativos para las actividades del proyecto. Las principales funciones son:

- En coordinación con representantes del Asociado en la Implementación, definir la distribución de los presupuestos (anuales y trimestrales);
- En coordinación con representantes del Asociado en la Implementación, elaborar la documentación administrativa del Proyecto;
- En coordinación con representantes del Asociado en la Implementación, elaborar los informes financieros y de avance;
- En coordinación con representantes del Asociado en la implementación llevar a cabo los procesos para la contratación de personal y consultorías que requiera la implementación del Proyecto;
- Gestionar ante el PNUD los procesos administrativos necesarios para el desarrollo del Proyecto;
- Asegurar la gestión eficaz del sistema contable establecido en el Proyecto;
- Preparar y presentar un informe financiero de la situación del Proyecto en la(s) reunión(es) tripartita(s); o reuniones a la Junta del Proyecto, y
- Supervisar y asegurar el cumplimiento de las tareas del personal contratado por el PNUD; conforme a los criterios de contratación, conforme a los lineamientos y normativas del PNUD.

La Junta del Proyecto es un órgano de supervisión y seguimiento que se reúne al menos una vez al año y está integrado por:

- El/la Director/a del Proyecto (representante de SEMS, como se especifica en organigrama)



- Un/a Oficial de Programa del PNUD;
- Un/a representante de la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica de la AMEXCID;
- Un/a representante de la SEMS distinto/a al/a la Director/a del Proyecto, y
- El/la Coordinador/a Técnico/a del Proyecto, quien fungirá como Secretario/a Técnico/a.

Sus funciones principales son:


- Aprobar el Plan Anual de Operación del Proyecto y el presupuesto;
- Monitorear el cumplimiento de los objetivos y resultados del Proyecto;
- Establecer, enfocar o rediseñar la estrategia del Proyecto;
- Analizar o en su caso resolver asuntos relacionados con el avance de las actividades del Proyecto, a fin de darle seguimiento al Plan de Anual de Operación y cumplir con los indicadores de desempeño;
- Monitorear la situación del presupuesto, así como la aportación oportuna de los insumos financieros, humanos y técnicos para el cumplimiento del Plan Anual de Operación;
- Monitorear que se cumplan satisfactoriamente las normas y procedimientos del PNUD;
- Convocar a reuniones ordinarias a fin de considerar las propuestas y avances del Proyecto;
- Convocar, en caso de ser necesario, a reuniones extraordinarias, y
- Realizar un análisis, por lo menos una vez al año, con el objetivo de evaluar sustantivamente el Documento de Proyecto; es decir, el Anexo I del presente Acuerdo.

Equipo Técnico. Es el órgano encargado de brindar asesoría técnica especializada al Proyecto y estará integrado por:

- El/la Director/a del Proyecto;
- Un/a representante de la SEMS distinto/a al/a la Director/a del Proyecto;
- Un/a representante del área de Programas del PNUD;
- Un representante del Proyecto;
- El/la Coordinador/a Técnico/a del Proyecto, quien fungirá como Secretario/a Técnico/a.
- Especialistas del proyecto en el PNUD


Sus principales funciones son:

- Elaborar y actualizar el Plan Anual de Operación del Proyecto.
- Brindar asistencia técnica para el logro de los resultados del Proyecto;
- Aportar los insumos técnicos acordados por la Junta del Proyecto;
- Planificar y dar seguimiento al avance de los productos y actividades del Proyecto;
- Proponer la elaboración de materiales físicos y virtuales para la formación de actores involucrados;
- Aportar experiencias internacionales y buenas prácticas para la mejora conceptual y metodológica del Proyecto;
- Apoyar en la organización de eventos internacionales y nacionales;
- Proponer al/la Directora/a del Proyecto y al/la Coordinador/a Técnico/a del Proyecto los perfiles para la contratación de consultorías puntuales;
- Constituirse en Comité para la selección y dictaminación de las OSC, de acuerdo con los lineamientos y reglamentos del PNUD;
- Dar seguimiento a la elaboración de investigaciones, análisis y al proceso de evaluación;



- Elaborar el sistema de seguimiento y monitoreo de la implementación del Proyecto;
- De ser necesario, convocar a representantes de otras agencias del Sistema de Naciones Unidas para proporcionar asesoría en temas específicos relacionados con la formación docente, acciones de gestión escolar participativa, mejora del ambiente escolar y/o en estrategias para el reconocimiento de avances de docentes, directivos y planteles.
- Convocar a expertos externos para proporcionar asesoría en temas específicos.

2. Estructura Organizativa del Proyecto

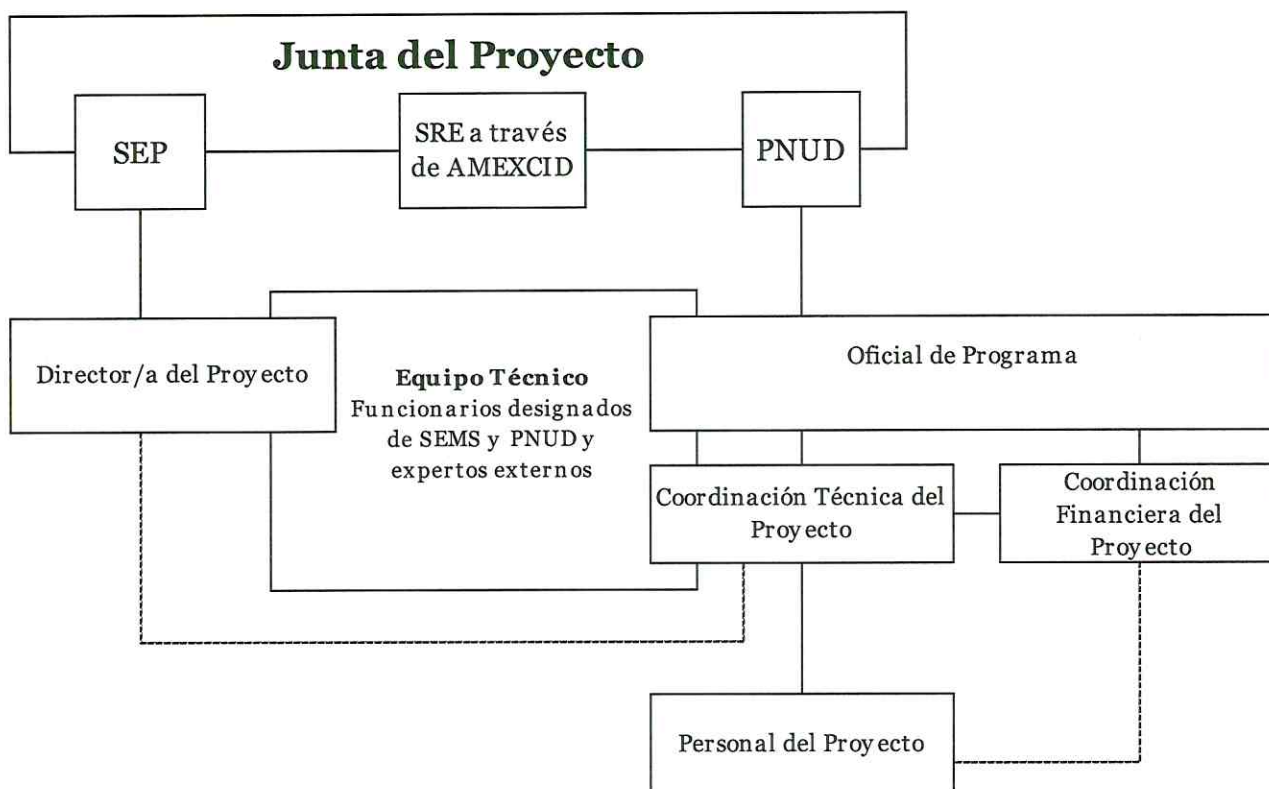

3. Arreglos Administrativos

Para la administración de los recursos, el PNUD pondrá a disposición del Proyecto su capacidad instalada, garantizando transparencia y agilidad en el ejercicio de los recursos. El Plan Anual de Operación se especifica en este Documento. De existir modificaciones en dicha sección, deberá ponerse a consideración y ser aprobada por los miembros de la Junta del Proyecto.

El costo de recuperación por la administración del Proyecto (GMS) es de 7% sobre saldos ejercidos. Dicho monto será hasta por un máximo de MX \$ 11'252,336.45 (Once millones doscientos cincuenta y dos mil trescientos treinta y seis pesos 45/100 M.N.). Este monto se acredita al PNUD, de los mismos recursos del proyecto y en sincronía con la ejecución de los gastos. Cabe señalar que cualquier servicio que el PNUD proporcione al Proyecto se hará en función de sus propios lineamientos y reglamentos internos.

Durante el ciclo escolar 2015-2016 el Proyecto fue financiado con fondos de la **Subsecretaría de Educación Media Superior, SEP**, por el monto total de **MX \$72'000,000.00 (setenta y dos millones de pesos 00/100 M.N.)**⁴⁴.

Para la revisión sustantiva y presupuestaria total, correspondiente al ciclo escolar 2016-2017, el Proyecto fue financiado con fondos adicionales de la **Subsecretaría de Educación Media Superior, SEP**, por el monto total de **MX \$100'000,000.00 (cien millones de pesos 00/100 M.N.)**, mismos que se depositaron en la siguiente cuenta del PNUD México:

Banco:	Banamex SA de CV
Cuenta número:	0443009
Cuenta depósitos ventanilla:	0230443009
CLABE:	002180002304430098
A nombre de:	UNDP Representative in México
Sucursal:	023
Plaza:	México, en la Ciudad de México, 01001


En el caso de la revisión sustantiva (2019-2020) el proyecto utilizará los fondos disponibles en el PNUD al mes de marzo de 2019, los cuales ascienden a 1.1 millones de dólares.

Si el pago se efectúa en una moneda distinta del dólar de los Estados Unidos, su valor se determinará aplicando el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas vigente en la fecha de hacerse efectivo dicho pago. Si antes de la total utilización por el PNUD del importe abonado hubiera una variación en el tipo de cambio operacional de las Naciones Unidas, se ajustará en consonancia el valor del saldo de fondos no utilizados. Si, en ese caso, se registrara una pérdida en el valor de dicho saldo de fondos, el PNUD informará al Donante, con miras a determinar si el Donante ha de aportar más financiación. Si no se dispusiera de dicha financiación adicional, el PNUD podrá reducir, suspender o terminar anticipadamente el Proyecto.

El PNUD recibirá y administrará los pagos de conformidad con las normas, los reglamentos y las directrices del PNUD.

Todas las cuentas y todos los estados financieros se expresarán en dólares de los Estados Unidos.

Si se prevén o si ocurren aumentos inesperados en los gastos o en los compromisos (debido o bien a factores inflacionarios, o bien a fluctuaciones en los tipos de cambio, o bien a eventos imprevistos), el PNUD proporcionará oportunamente al Donante una estimación complementaria, donde se indicarán las sumas adicionales necesarias a fin de determinar si es necesario que se transfieran fondos adicionales o únicamente se hagan modificaciones al presupuesto.



⁴⁴ Los recursos para el año escolar 2015-2016 fueron depositados al PNUD en septiembre de 2015.

Si los pagos mencionados supra no se recibieran de conformidad con el calendario de pagos, o si el Donante u otras fuentes no aportaran la financiación adicional requerida de conformidad, el PNUD podrá reducir, suspender o terminar anticipadamente la asistencia a proporcionar al Proyecto. En el caso de que se presente una suspensión, reducción o terminación anticipadamente del Proyecto, el PNUD reintegrará los fondos recibidos que no hayan sido utilizados a la SEP, aplicando para ello el tipo de cambio de Naciones Unidas vigente al día de la devolución, a la cuenta bancaria que para tal efecto le indique; en caso de registrarse una pérdida cambiaria, este déficit será cargado al Proyecto.

4. Compromisos del PNUD y el gobierno mexicano para la prestación de los servicios de apoyo

Los servicios de apoyo que se requieran del PNUD se proporcionarán de acuerdo con las condiciones que a continuación se indican:

1. La oficina del PNUD México tiene la posibilidad de proporcionar los servicios de apoyo y asistencia necesaria para cubrir los requisitos que se pidan, ya sea para presentar informes o efectuar pagos directos. Al prestar esos servicios, PNUD México velará para que se incremente la capacidad de la institución designada a fin de que pueda asumir esas actividades de manera directa.
2. La oficina del PNUD en México tiene la facultad de proporcionar, a petición de la Subsecretaría de Educación Media Superior, los siguientes servicios de apoyo para las actividades del Proyecto:
 - Soporte técnico de recursos nacionales e internacionales del Sistema de Naciones Unidas;
 - Diseño y planeación estratégica del Proyecto;
 - Administración del Proyecto mediante el seguimiento técnico y financiero, con un enfoque basado en resultados;
 - Desarrollo de redes de conocimiento internacionales, nacionales y locales basadas en la experiencia del Sistema de Naciones Unidas;
 - Selección del personal para el Proyecto, asistencia para su contratación y sugerencia de candidatos (personas físicas o morales) para las actividades sustantivas y administrativas del Proyecto, y
 - Adquisición de bienes y servicios, en concordancia con sus procedimientos y políticas.
3. La adquisición de bienes y servicios, así como la contratación del personal para el Proyecto son responsabilidad del PNUD, en consulta con el Asociado en la Implementación, y para su gestión se deberán seguir las políticas, normas y procedimientos del PNUD. Es importante mencionar que los puestos del/de la Coordinador/a Técnico/a y del/ de la Coordinador/a Financiero/a, son posiciones que se deberán seleccionar de manera conjunta entre el Asociado en la Implementación y el PNUD México.
4. En caso de demandas o controversias relacionadas con la prestación de servicios por parte de la oficina del PNUD México, éstas tendrán la aplicación que corresponda según el modelo de asistencia básica de este documento.

5. La manera y el método como el PNUD México recuperará los gastos que le signifique la prestación de los servicios de apoyo, descritos en la parte correspondiente a los "Arreglos Administrativos", estarán especificados en el anexo que contiene al presupuesto.
6. La oficina en México del PNUD informará por escrito sobre los servicios de apoyo prestados y los gastos reembolsados por ese concepto, en conformidad con los acuerdos de la Junta del Proyecto.
7. Si las necesidades de servicios de apoyo cambiasen durante la vigencia del Proyecto, tendrá que revisarse el Documento de Proyecto por acuerdo mutuo del Representante Residente del PNUD México y el Asociado en la Implementación.

5. Mecanismo de Selección y Contratación de la OSC e Instituciones Académicas

Para los ciclos escolares 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019 y 2019-2020, el Programa podrá operar con OSC y/o instituciones académicas bajo alguna de las siguientes modalidades:


1. Licitación Pública (*Procurement* por su nombre en inglés). Consiste en un mecanismo competitivo para obtener insumos específicos requeridos a una OSC o institución bajo la figura de proveedor de servicios para la implementación de las actividades del Proyecto. La relación con el PNUD se formaliza mediante un contrato de servicios.
2. Memorándum de Entendimiento, convenios de colaboración o acuerdos entre partes responsables. Consiste en un mecanismo para formalizar una asociación y/o colaboración con una OSC o institución a largo plazo para el logro de objetivos de desarrollo comunes y para la implementación de actividades específicas en el marco de un Acuerdo (Cost Sharing Agreement).
3. Acuerdos de subsidio de microcapital a través de un proceso competitivo y con una convocatoria pública que emitirá el PNUD. Consiste en un mecanismo de colaboración que el PNUD establece con organizaciones no lucrativas, en el que se establece el compromiso de las instituciones involucradas para la realización de las actividades en el marco de un proyecto.

Bajo cualquiera de las modalidades anteriores, las OSC y/o instituciones académicas ejercerán los recursos conforme a los lineamientos y manuales del PNUD.

Las OSC y/o instituciones académicas, no podrán recibir los recursos cuando exista entre sus directivos y los servidores públicos encargados de otorgar los recursos, relaciones de interés o nexos de parentesco, así como a personas con nexos de parentesco con los directivos de la organización.

Las OSC y/o instituciones académicas participantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Cumplir con los requisitos administrativos y contables de acuerdo con los lineamientos establecidos por el PNUD.
- b) Entregar Carta-Compromiso firmada por su representante legal, en la cual la institución académica se compromete a proporcionar la información que les sea requerida sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, fuentes de



- financiamiento nacionales o extranjeras o de ambas, patrimonio, operación administrativa y financiera, y uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban.
- c) Entregar Constancia de No Adeudo de obligaciones fiscales federales.
 - d) Entregar documentación que acredite su capacidad institucional, la trayectoria y la experiencia metodológica en el tema.
 - e) Contar con Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) actualizada (requisito aplicable únicamente para las OSC).

6. Auditoría

La Contribución estará sujeta exclusivamente a los procedimientos de auditoría interna y externa previstos en el Reglamento Financiero, la Reglamentación Financiera Detallada y las directivas del PNUD. El Proyecto será auditado con el objetivo de obtener una seguridad de que los recursos son administrados de acuerdo a los reglamentos financieros, las cláusulas y condiciones del Documento de Proyecto, el Plan Anual de Operación y el presupuesto establecido. Del presupuesto del Proyecto, se deberán contemplar los recursos necesarios para efectuar la auditoría.

7. Equipo

El PNUD será titular de la propiedad del equipo, los suministros y otros bienes financiados con cargo a la Contribución. Las cuestiones relativas a la transferencia de la propiedad, al cierre del proyecto, serán decisión del PNUD y se determinarán de conformidad con las políticas y los procedimientos del PNUD, las cuales establecen que el equipo puede ser transferido al Asociado a la Implementación (SEMS), a una institución sin fines de lucro (identificada y definida por PNUD), o de ser el caso a una nueva fase del Proyecto.

8. Consideraciones especiales

Las publicaciones, investigaciones y productos que se generen como parte de lo aquí propuesto son propiedad del PNUD México, pudiendo ser utilizados de forma ilimitada por la Subsecretaría de Educación Media Superior.


Asimismo, todo el material que se produzca como consecuencia de este Proyecto, deberá llevar de manera visible y en tamaño similar los logotipos del PNUD, SEMS-SEP y del Proyecto Construye T, dándoles el crédito correspondiente a los autores y organismos de apoyo, en concordancia con la Junta del Proyecto.

Además, todas las publicaciones producidas como consecuencia de este documento deberán incluir de manera obligatoria la siguiente inscripción:

Las opiniones, análisis y recomendaciones de política no reflejan necesariamente el punto de vista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como tampoco de su Junta Ejecutiva ni de sus estados miembros.

9. Comunicación y difusión

Al ser una red de conocimiento, el PNUD promueve la difusión de aquellas experiencias y lecciones aprendidas de los Proyectos, de manera que puedan ser compartidas al interior de los países y con el resto de la comunidad internacional para ayudar a sus pueblos a forjar una vida mejor.



Por ello el PNUD, en coordinación con el Asociado en la Implementación, promoverá la sistematización de experiencias y la difusión de los productos que surjan del marco de este Proyecto como una actividad transversal al logro de sus resultados. Dichas actividades se contemplan en el Plan de Anual de Operación del Proyecto y se destinará un porcentaje de su presupuesto para este fin.

La Junta del Proyecto definirá la estrategia de comunicación y la revisará periódicamente para promover la visibilidad de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas empleadas en la ejecución de las actividades del Proyecto. La Junta del Proyecto también determinará los ajustes al presupuesto del Proyecto para cumplir con este objetivo.

De igual forma, el PNUD y el Asociado en la Implementación participarán coordinadamente en la promoción de estos resultados aprovechando los espacios de difusión de las Naciones Unidas (como en los Días de la juventud, de la no violencia contra las mujeres, por mencionar algunos), eventos relacionados con el Proyecto y otros espacios de interés común.

Finalmente, el PNUD seguirá una política de acceso a la información relacionada con el Proyecto, respetando aquella información que el Asociado en la Implementación considere de carácter confidencial.

10. Seguridad

Es prioridad del PNUD garantizar condiciones mínimas de seguridad en el funcionamiento de los Proyectos, para lo cual las oficinas de los Proyectos deberán cumplir, en la medida de lo posible, con los estándares operacionales establecidos por la Oficina de Seguridad de las Naciones Unidas. Por lo anterior, se llevarán a cabo reuniones periódicas, así como talleres de información y capacitación con los/las responsables de la coordinación del Proyecto y para todos –aquellos que tengan una relación contractual con el PNUD con el propósito de permitirles estar compenetrados con las regulaciones, procedimientos e instrucción que todo Funcionario de las Naciones Unidas debe seguir para el cumplimiento de dichos estándares.

En la consulta realizada a la Oficina de Seguridad de las Naciones Unidas el 15 de abril de 2008 se contemplan los siguientes apoyos:

- a) La Oficina de Seguridad de las Naciones Unidas brindará servicios para fortalecer la seguridad en el equipo de trabajo del Proyecto a través de cursos de capacitación por medios electrónicos como son a) Curso de seguridad básica, b) Seguridad avanzada sobre el terreno;
- b) Adicionalmente, se ofrecerá al personal contratado en el marco del Proyecto sesiones de inducción presenciales sobre medidas de seguridad, los Procedimientos Operativos Vigentes (POV's) y trípticos que contienen recomendaciones diversas referidas a temas específicos. Será responsabilidad de la Unidad Coordinadora que el personal que labora en el Proyecto atienda las sesiones mencionadas y reciba la información que la Oficina de Seguridad de las Naciones Unidas elabore.
- c) La oficina de Seguridad de las Naciones Unidas en México proporcionará recomendaciones y, en determinado caso, evaluaciones de las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo eventos en el marco del Proyecto.

Si en el marco del Proyecto se requiere la renta de espacios fuera de estas instalaciones, se procurará que dichos espacios cumplan con los principios de seguridad establecidos por el PNUD, en concordancia con las políticas de la Secretaría de Educación Pública en esta materia. Estos criterios estarán establecidos en los términos de referencia y serán un factor de decisión importante para la contratación de dichos espacios.

Finalmente, aquellas personas que estén destinados o deban viajar, por actividades en el marco del Proyecto, a zonas que estén en una etapa de seguridad elevada (señalada por la Oficina de Seguridad de las Naciones Unidas), deberán acreditar el Curso Avanzado de Seguridad sobre el Terreno.

El PNUD circulará periódicamente un comunicado con aquellas zonas geográficas que, por determinada circunstancia, sean consideradas de mayor riesgo para la operación del personal.



VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN

Durante el periodo 2015 a 2018, se consideraron las siguientes estrategias de monitoreo y evaluación para el Programa.

“Con el propósito de medir los avances en la implementación del Plan Anual de Operación y los resultados obtenidos a partir de la presencia del Programa Construye T en los planteles de educación media superior, se contemplaron las siguientes herramientas de monitoreo y evaluación:

a) Sistema de monitoreo de resultados en línea

En el marco del Proyecto Construye T se diseñó e implementó un Sistema de Monitoreo Permanente a través de una plataforma en línea que permitió dar seguimiento a la implementación de las estrategias de intervención propuestas por el Programa, con especial énfasis en el monitoreo de indicadores de resultados. En ese sentido, el Sistema tuvo la capacidad de obtener información que permitió medir y evaluar los resultados esperados en términos de mejora de la convivencia escolar en los planteles de EMS como parte fundamental del ambiente escolar, además de información sobre el conocimiento y uso de las herramientas del enfoque de HSE por parte de los docentes y directivos. Finalmente, el sistema aportó elemento para medir cambios en el comportamiento y percepción de los estudiantes. La información necesaria para medir los indicadores de resultados fue obtenida directamente de los docentes y alumnos —al menos de manera muestral—, por medio de encuestas diseñadas por la Coordinación Técnica del Proyecto, con apoyo de expertos en HSE, que fueron enviadas y contestadas en línea.

Adicionalmente, el Sistema recolectó la información necesaria para monitorear la correcta implementación de los procesos del Programa, comprobando su consistencia con respecto al diseño institucional y a las estrategias establecidas por el PNUD. Dicho de otra manera, el Sistema aportó elementos para verificar que las actividades y procesos que conforman las distintas estrategias del Programa se estuvieran implementando correctamente.

Finalmente, el Sistema tuvo la capacidad de dar seguimiento a requerimientos de información coyuntural que fueron de interés para la toma de decisiones en el Proyecto.

Para poder cubrir todas las necesidades de información que plantea el Proyecto —operativa, estratégica y financiera— se planteó una estructura por módulos de captura vinculados a una misma base de datos:

- Módulo I: Monitoreo permanente de la implementación del Programa (indicadores de productos y procesos).
- Módulo II: Monitoreo permanente de resultados (indicadores de resultados).

Cada módulo contenía plantillas de información previamente definidas y diseñadas por la Coordinación Técnica del Proyecto, de acuerdo a las necesidades de información detectada, además fue lo suficientemente flexible para añadir o quitar plantillas según se requiriera. Los módulos de captura nutrieron de información a la base de datos central, la cual, a su vez, generó —mediante el uso de macros— informes en formatos ejecutivos de indicadores de especial interés. Por otra parte, los módulos contaron con un tablero de control que permitió observar de manera ejecutiva el avance sobre las metas establecidas para cada indicador del sistema.

El seguimiento y sistematización de información financiera se realizó conforme a los lineamientos y normativa del PNUD, considerando un esquema de bases de datos en formato de Excel.⁴⁵

b) Evaluación de impacto

Con la finalidad de obtener una valoración objetiva del impacto atribuible al Proyecto, se realizó un riguroso proceso de evaluación externa. En su diseño original se contempló el uso de un modelo experimental con una muestra de planteles de tratamiento y una de control. Los resultados de la evaluación aportaron elementos para visibilizar los cambios generados por la intervención del Proyecto, particularmente la formación de HSE en los docentes y alumnos, y en mejoras del ambiente escolar dentro de los planteles. En ese sentido, los resultados del Programa se midieron a través de indicadores de cambio en el aprendizaje socioemocional de los alumnos y del ambiente escolar –principalmente en su componente de convivencia escolar–. Por tal motivo, se aplicaron cuestionarios que incluían escalas de medición de HSE probadas a nivel internacional⁴⁶ y que técnicamente cubrían la medición de las habilidades promovidas por Construye T.

Entre los indicadores de impacto incluidos en esta metodología se consideraron:

- Medición de habilidades socioemocionales en la comunidad escolar de acuerdo a estándares internacionales.
- Cambio en las conductas de riesgo en los estudiantes de EMS.
- Cambio en los niveles de satisfacción, confianza y motivación de los estudiantes de EMS.
- Cambio en las expectativas de futuro y proyecto de vida de los estudiantes de EMS.
- Cambio en el nivel de violencia y acoso escolar en los planteles.

Durante la tercera fase del Proyecto, entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, se aplicaron encuestas para la obtención de la línea base para la evaluación, siguiendo rigurosamente el diseño metodológico y los instrumentos propuestos por el evaluador externo. Es de resaltar que la línea base se levantó antes del inicio de la intervención propuesta en este documento en su diseño original, por lo que aportó, además, un diagnóstico sobre las habilidades socioemocionales y la convivencia en los planteles de EMS –asumiendo que la encuesta se aplicó en una muestra representativa de planteles de EMS–. Para 2015-2016 se planteó la realización de un primer seguimiento que, serviría de línea base para los planteles que se incorporarán por primera vez al Programa con la nueva intervención.

Con respecto a las mediciones de seguimiento para evaluar el impacto del nuevo modelo de intervención, es importante considerar que los cambios en el desarrollo socioemocional y en el comportamiento, así como las formas de convivencia entre los actores de la comunidad

⁴⁵ Considerando que la participación de las OSC y/o instituciones académicas no es continua en el tiempo, no resulta costo-efectivo el desarrollo de un módulo específico para ello, pues las características en cada participación se modifican.

⁴⁶ Los cuestionarios para estudiantes se diseñarán considerando al menos las siguientes escalas de medición de habilidades socioemocionales: escala de Inteligencia Emocional de BarOn; escala "Inventario Big 5 de la personalidad"; Inventario de comportamiento de estudiantes, Inventario de resolución de problemas, cuestionario de Fortalezas y dificultades SDQ, el Test de Autoestima de Rosenberg y la escala Gallup de Satisfacción Personal. Asimismo, se controlará por una medida de inteligencia cognitiva a través del Test de Matrices Progresivas de Raven.

escolar, no son observables en el corto plazo; la experiencia internacional y la opinión de expertos indica que el proceso de asimilación y aprendizaje de HSE podría comprender más de un año escolar. Tomando en cuenta que la intervención en los planteles se realizó como se establece en el Plan Anual de Operación, se considera que no es factible identificar un impacto dentro de este periodo atribuible al nuevo modelo. En tal sentido, un segundo seguimiento –primero para el caso de la nueva intervención– tendría que realizarse durante la vigencia del Proyecto. No obstante, el sistema de monitoreo aportó algunos resultados intermedios en términos del conocimiento y uso de habilidades socioemocionales en docentes, así como algunos cambios de comportamiento y percepción de los estudiantes, y algunos indicadores relacionados con la mejora de la convivencia.

Adicionalmente, en apego a las Políticas y Procedimientos del PNUD, el presente Programa será monitoreado según los siguientes elementos:

Durante el ciclo anual del proyecto

- Con el fin de facilitar el seguimiento y solucionar eventuales problemas y riesgos el “Registro de Issues y Riesgos” debe ser activado y actualizado en el sistema Atlas por el Oficial de Programa a cargo del Proyecto. La Coordinación Técnica del Proyecto elaborará los informes técnicos del Proyecto (anual y final). El PNUD enviará el informe anual a más tardar un mes después del final del año calendario en cuestión. Asimismo, enviará el informe final a más tardar un mes después de la terminación del Proyecto.
- Las acciones para el monitoreo del Proyecto deben ser activadas y planificadas en el Módulo de Gestión del Proyecto en Atlas y se deben registrar el status de cumplimiento de estas acciones claves de monitoreo planeadas. En caso de que el Proyecto no disponga de acceso externo al Sistema Atlas, hasta que ésta herramienta esté disponible, la información será proporcionada cuando sea necesario por parte del/de la Coordinador/a Técnico/a del Proyecto, en coordinación con el/la directora/a del mismo, a través de informes técnicos. En caso de tener acceso externo, esta información será ingresada por la Coordinación Técnica del Proyecto en el sistema Atlas, dejando la salvedad que el contenido de la misma será una responsabilidad compartida de la Subsecretaría de Educación Media Superior y el PNUD.
- El Informe Anual del Proyecto será preparado por la Coordinación Técnica del Proyecto en coordinación con el Asociado en la Implementación y el Oficial de Programa a cargo del PNUD y presentado a la Junta del Proyecto.
- Reunión Anual y Final del Programa: sobre la base del “Informe Anual del Programa” se realizará una Reunión Anual del Programa durante el cuarto trimestre del año/o el segundo semestre, para revisar y evaluar el desempeño del Programa y el Plan Anual de Operación (AWP) del año siguiente. En el último año del Programa, dicha revisión se considerará como Reunión Final de Cierre del Programa. La Reunión Anual o Final del Programa será realizada por la Junta del Proyecto y puede involucrar a otros posibles interesados. Las Revisiones Anuales y Finales se focalizarán en evaluar el nivel de logros de los objetivos, resultados y productos y su alineamiento con los Resultados esperados del Programa de País.

Gestión de Calidad de las Actividades-Resultado del Proyecto

Con el propósito de medir los avances en la implementación del Plan Anual de Operación y los resultados obtenidos a partir de la presencia del Programa Construye T en los planteles de educación media superior, a continuación, se presenta el marco de gestión de Calidad de las Actividades-Resultado para los ciclos 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018.

Gestión de Calidad de las Actividades-Resultado del Proyecto 2015-2016

PRODUCTO 1: Documentos con los contenidos teórico-práctico y materiales del curso en HSE para docentes/directivos		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Curso en HSE disponible para los tutores Construye T.	
Propósito	Desarrollar los contenidos y materiales del curso Construye T para docentes con base en el actual marco conceptual de HSE del Programa	
Descripción	El desarrollo del curso incluye realizar los contenidos (texto, propuesta de guiones de video, gráficos y ejemplos), materiales pedagógicos, metodología de evaluación de avances y entregar una descripción técnica para la elaboración de la plataforma en línea.	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Se contrata a un equipo de consultores o a una institución especializada a través de un proceso competitivo a nivel nacional.	Para la selección de los consultores y la revisión de sus productos o entregables se integrará al equipo de la Coordinación Técnica del Proyecto a un especialista en temas de pedagogía y psicopedagogía.	Meses 2 a 9 del Plan Anual de Operación

PRODUCTO 2: Materiales prácticos para el desarrollo de HSE		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Formación en HSE para directivos, docentes y estudiantes	
Propósito	Apoyar a directivos, docentes y estudiantes para que realicen ejercicios para desarrollar HSE en el plantel, el aula y/o el ámbito personal	
Descripción	162 fichas con ejercicios prácticos de desarrollo socioemocional 9 videos con ejercicios prácticos de desarrollo de HSE	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Mejores prácticas en términos de desarrollo socioemocional con base en las recomendaciones técnicas de los consultores o la institución especializada que desarrolle los materiales.	Revisión de mejores prácticas y consultoría con expertos en el tema de desarrollo de HSE	Meses 2,3, 4, 5, 8, 10 y 13 del Plan Anual de Operación

PRODUCTO 3: Listado de <i>asesores expertos</i> capacitados en los contenidos y alcances del curso.		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Curso en HSE disponible para los tutores Construye T.	
Propósito	Formar al equipo de asesores expertos que acompañarán y retroalimentarán el avance de los docentes a través del curso en línea.	
Descripción	El evento será organizado por la Coordinación Técnica del Proyecto y convocará los asesores expertos. En este evento los consultores o institución especializada realizan la capacitación de los contenidos del curso.	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Mejores prácticas en términos de eventos de capacitación y las recomendaciones técnicas de los consultores o la institución especializada para el desarrollo de las sesiones.	Revisión de mejores prácticas y consultoría con expertos en el tema de formación	Meses 6 a 9 del Plan Anual de Operación

PRODUCTO 4: Plataforma de capacitación en línea para docentes y directivos.		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Curso en HSE disponible para los tutores Construye T.	
Propósito	Capacitar a docentes en la incorporación del enfoque de habilidades socioemocionales en el aula de clase.	
Descripción	Esta actividad comprende la adaptación de los contenidos y materiales de curso a un formato interactivo y disponible para su acceso en línea.	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Mejores prácticas en términos de sistemas de capacitación en línea.	Asesoramiento con dependencias o instituciones que han implementado plataformas de capacitación para docentes. Asesoramiento con la escuela virtual del PNUD.	Meses 5 a 9 del Plan Anual de Operación



PRODUCTO 5: Listados de docentes y directivos participantes en el curso en HSE		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Formación de Tutores Construye T a través del curso en HSE.	
Propósito	Registrar y sistematizar el avance de la capacitación de docentes directamente del curso en línea.	
Descripción	A través de un módulo de seguimiento en la plataforma de capacitación se registrará el avance de los tutores Construye T en el curso y la creación de comunidades de práctica en sus planteles.	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Mejores prácticas en términos de sistemas de capacitación en línea y monitoreo de avances.	Asesoramiento con dependencias o instituciones que han implementado plataformas de capacitación para docentes y construcción de padrones de beneficiarios. Asesoramiento con la escuela virtual del PNUD.	Meses 6 a 13 del Plan Anual de Operación

PRODUCTO 6: Listados de docentes participantes en la capacitación de HSE a través de las comunidades de práctica		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Formación de docentes a través del curso en HSE.	
Propósito	Registrar y sistematizar el avance de la capacitación de docentes bajo el esquema de comunidades de práctica.	
Descripción	A través de un módulo de seguimiento en la plataforma de capacitación se registrarán los participantes en el curso de HSE a través de las comunidades de práctica en sus planteles.	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Mejores prácticas en términos de sistemas de monitoreo de avances.	Asesoramiento con dependencias o instituciones que han implementado satisfactoriamente sistemas de monitoreo en línea.	Meses 10 a 13 del Plan Anual de Operación

PRODUCTO 7: Guía para desarrollo de HSE en espacios de tutoría y orientación		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Docentes utilizan las HSE en sus clases y mejoran la manera de relacionarse con sus estudiantes.	
Propósito	Fortalecer el aprendizaje socioemocional de los estudiantes a través de actividades específicas de desarrollo de HSE en los horarios de clase donde no se tiene actividad académica de un campo disciplinar o asignatura tecnológica, es decir, en los horarios de orientación, tutorías o educación física.	
Descripción	Desarrollar una guía práctica con actividades de desarrollo socioemocional para tutores u orientadores de los planteles participantes.	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Selección de consultor especializado en el tema.	Proceso de contratación competitiva	Meses 3 a 9 y 13 del Plan Anual de Operación

PRODUCTO 8: Guía para la organización y establecimiento de consejos de convivencia y guía para el establecimiento de acuerdos de convivencia.		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Mejora en la convivencia dentro de los planteles escolares. Disminución del fenómeno de acoso escolar en los planteles.	
Propósito	Desarrollar la capacidad institucional de la escuela para mejorar la convivencia escolar.	
Descripción	Desarrollar una guía práctica con actividades concretas sobre mejora de la convivencia escolar en planteles del tipo medio superior.	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Selección de consultor especializado en el tema.	Proceso de contratación competitiva	Meses 5 a 8, 10 y 12 del Plan Anual de Operación

PRODUCTO 9: Guía para la conformación del Comité Escolar Construye T, guía para la realización del diagnóstico participativo y guía para la planeación participativa en los planteles.		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Mejora en la convivencia dentro de los planteles escolares. Disminución del fenómeno de acoso escolar en los planteles.	
Propósito	Desarrollar la capacidad institucional de la escuela para mejorar la convivencia escolar a través de procesos participativos y el involucramiento de toda la comunidad escolar.	
Descripción	Desarrollar una guía práctica sobre las mejores prácticas de gestión participativas en planteles.	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Selección de consultor especializado en el tema.	Proceso de contratación competitivo	Meses 2 a 9, 12 y 13 del Plan Anual de Operación

PRODUCTO 10: Plan de trabajo de la estrategia de posicionamiento del enfoque de HSE y fomento a la convivencia positiva mediante acciones de comunicación social.		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Generación de contenidos de comunicación social para difundir el enfoque de HSE. Generación de incentivos para la participación de tutores y docentes.	
Propósito	Contar con una estrategia efectiva de difusión de los resultados y de posicionamiento del Programa entre la población objetivo.	
Descripción	Página Web dinámica y redes sociales del Programa posicionadas entre la población objetivo (docentes, estudiantes, directivos) y las autoridades educativas estatales y federales.	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Mejores prácticas en términos de difusión de resultados y de gestión de información por medios electrónicos.	Consulta de propuestas y productos con las áreas de comunicación y tecnologías de la información del PNUD y el Asociado en la Implementación	Meses 4 a 13 del Plan Anual de Operación

PRODUCTO 11: Plataforma de seguimiento y monitoreo en línea.		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Docentes utilizan las HSE en sus clases y mejoran la manera de relacionarse con sus estudiantes	
Propósito	Monitorear el avance en los resultados del Programa entre la población objetivo.	
Descripción	Se desarrollará una plataforma de monitoreo de avances estrechamente vinculada a la plataforma de capacitación y que permitirá recolectar mensual, trimestral o semestralmente, indicadores de actividades y resultados directamente de los docentes, directivos y estudiantes.	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Mejores prácticas en términos de difusión de monitoreo basado en resultados.	Asesoramiento con las áreas de monitoreo y evaluación de organismos especializados como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).	Meses 3 a 9, 12 y 13 del Plan Anual de Operación

PRODUCTO 12: Bases de datos de la plataforma de seguimiento y monitoreo en línea.		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Docentes utilizan las HSE en sus clases y mejoran la manera de relacionarse con sus estudiantes.	
Propósito	Monitorear el avance en los resultados del Programa entre la población objetivo.	
Descripción	A través de la plataforma de monitoreo de avances se recolectarán indicadores de actividades y resultados de forma bimestral, asimismo otros indicadores serán recolectados de forma semestral y/o anual.	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Mejores prácticas en términos de difusión de monitoreo basado en resultados.	Asesoramiento con las áreas de monitoreo y evaluación de organismos especializados como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).	Meses 7, 8, 12 y 13 del Plan Anual de Operación

PRODUCTO 13: Informe de resultados del seguimiento a la evaluación de impacto del Programa.		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Docentes utilizan las HSE en sus clases y mejoran la manera de relacionarse con sus estudiantes.	
Propósito	Contar con un comparativo de algunos indicadores de aprendizaje socioemocional, aprendizaje cognitivo, ambiente escolar, etc.	
Descripción	Aplicar un instrumento que considere los cambios en el modelo operativo del Programa, alcance y cobertura de 4,000 planteles del tipo medio superior en una muestra de planteles.	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Contratación de institución experta especializada en evaluación de impacto.	Proceso competitivo de selección.	Meses 10 a 13 del Plan Anual de Operación de 2015

Gestión de Calidad de las Actividades-Resultado del Proyecto 2016-2017

PRODUCTO 14: Documentos con los contenidos teórico-práctico y materiales del curso en HSE para docentes/directivos		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Curso en HSE disponible para los tutores docentes/directivos Construye T.	
Propósito	Desarrollar los contenidos y materiales del curso Construye T para docentes con base en el actual marco conceptual de HSE del Programa.	
Descripción	El desarrollo del curso incluye realizar los contenidos (texto, propuesta de guiones de video, gráficos y ejemplos), materiales pedagógicos, metodología de evaluación de avances y entregar una descripción técnica para la elaboración de la plataforma en línea.	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Se contrata a un equipo de consultores o a una institución especializada a través de un proceso competitivo a nivel nacional.	Para la selección de los consultores y la revisión de sus productos o entregables se integrará al equipo de la Coordinación Técnica del Proyecto a un especialista en temas de pedagogía y psicopedagogía.	Meses 15 a 18 del Plan Anual de Operación

PRODUCTO 15: Plataforma de capacitación funcionado óptimamente y listados de docentes y directivos inscritos y participando en las diferentes modalidades de los cursos Construye T.		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Curso en HSE disponible para los docentes y directivos Construye T.	
Propósito	Capacitar a docentes en la incorporación del enfoque de habilidades socioemocionales en el aula de clase.	
Descripción	Esta actividad comprende la adaptación de los contenidos y materiales de curso a un formato interactivo y disponible para su acceso en línea.	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Mejores prácticas en términos de sistemas de capacitación en línea.	Asesoramiento con dependencias o instituciones que han implementado plataformas de capacitación para docentes. Asesoramiento con la escuela virtual del PNUD.	Meses 15 a 27 del Plan Anual de Operación

PRODUCTO 16: Listados actualizados de docentes participantes en las Comunidades de Aprendizaje Socioemocional de los planteles.		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Formación de docentes a través del curso en HSE.	
Propósito	Registrar y sistematizar el avance de la capacitación de docentes bajo el esquema de comunidades de práctica.	
Descripción	A través de un módulo de seguimiento en la plataforma de capacitación se registrarán los participantes en el curso de HSE a través de las comunidades de práctica en sus planteles.	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Mejores prácticas en términos de sistemas de monitoreo de avances.	Asesoramiento con dependencias o instituciones que han implementado satisfactoriamente sistemas de monitoreo en línea.	Meses 16, 19, 22, 25 y 28 del Plan Anual de Operación

PRODUCTO 17: Paquete de materiales prácticos para el desarrollo de HSE y mejora del ambiente escolar.		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Formación en HSE para directivos, docentes y estudiantes.	
Propósito	Desarrollar la capacidad institucional de la escuela para mejorar la convivencia escolar y desarrollar HSE en los estudiantes.	
Descripción	Conjunto de materiales para el desarrollo de HSE que favorezcan la inserción laboral de los jóvenes, promuevan el desarrollo de HSE con perspectiva de género, guías de buenas prácticas de mejora del ambiente escolar y materiales audiovisuales.	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Mejores prácticas en términos de desarrollo socioemocional con base en las recomendaciones técnicas de los consultores o la institución especializada que desarrolle los materiales.	Proceso de contratación competitivo	Meses 15, 16, 18 a 22, y 24 a 27, del Plan Anual de Operación

PRODUCTO 18: Metodología de identificación de docentes, directivos y planteles que implementan exitosamente Construye T.		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Generación de incentivos para la participación de tutores y docentes.	
Propósito	Incentivar a los estudiantes, docentes y directivos a adoptar el enfoque de desarrollo socioemocional a través de estrategias de incentivos basados en el reconocimiento público y el prestigio social.	
Descripción	Desarrollar concursos para estudiantes, convocatorias para docentes y directivos y certificaciones para los planteles que efectivamente fomenten el desarrollo socioemocional en la comunidad escolar y se conviertan en agentes transformadores del cambio.	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Creación del perfil del docente que promueve el desarrollo de HSE en los estudiantes. Creación del perfil del director que fomenta el desarrollo de HSE en su comunidad escolar. Creación del perfil del plantel Construye T donde se fomenta efectivamente el desarrollo de HSE y la convivencia escolar positiva.	Asesoramiento con instituciones especializadas en desarrollo de HSE y en materia de convivencia escolar.	Meses 16, 19 y 25 del Plan Anual de Operación

PRODUCTO 19: Plan de trabajo del posicionamiento del enfoque de HSE y fomento a la convivencia positiva mediante acciones de comunicación social.		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Generación de contenidos de comunicación social para difundir el enfoque de HSE. Generación de incentivos para la participación de tutores y docentes.	
Propósito	Contar con una estrategia efectiva de difusión de los resultados y de posicionamiento del Programa entre la población objetivo.	
Descripción	Página Web dinámica y redes sociales del Programa posicionadas entre la población objetivo (docentes, estudiantes, directivos) y las autoridades educativas estatales y federales.	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Mejores prácticas en términos de difusión de resultados y de gestión de información por medios electrónicos.	Consulta de propuestas y productos con las áreas de comunicación y tecnologías de la información del PNUD y el Asociado en la Implementación	Meses 15, 17, 18, 19, 21, 23 y 25 del Plan Anual de Operación

PRODUCTO 20: Plataforma de seguimiento y monitoreo en línea.		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Docentes utilizan las HSE en sus clases y mejoran la manera de relacionarse con sus estudiantes	
Propósito	Monitorear el avance en los resultados del Programa entre la población objetivo.	
Descripción	Se desarrollará una plataforma de monitoreo de avances estrechamente vinculada a la plataforma de capacitación y que permitirá recolectar mensual, trimestral o semestralmente, indicadores de actividades y resultados directamente de los docentes, directivos y estudiantes.	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Mejores prácticas en términos de difusión de monitoreo basado en resultados.	Asesoramiento con las áreas de monitoreo y evaluación de organismos especializados como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).	Meses 4, 8 y 14 a 28 del Plan Anual de Operación

PRODUCTO 21: Bases de datos de la plataforma de seguimiento y monitoreo en línea.		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Docentes utilizan las HSE en sus clases y mejoran la manera de relacionarse con sus estudiantes.	
Propósito	Monitorear el avance en los resultados del Programa entre la población objetivo.	
Descripción	A través de la plataforma de monitoreo de avances se recolectarán indicadores de actividades y resultados de forma bimestral, asimismo otros indicadores serán recolectados de forma semestral y/o anual.	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Mejores prácticas en términos de difusión de monitoreo basado en resultados.	Asesoramiento con las áreas de monitoreo y evaluación de organismos especializados como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).	Meses 16, 19, 22, 25 y 28 del Plan Anual de Operación

PRODUCTO 22: Informe de resultados del seguimiento a la evaluación de impacto del Programa.		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Docentes utilizan las HSE en sus clases y mejoran la manera de relacionarse con sus estudiantes.	
Propósito	Contar con un comparativo de algunos indicadores de aprendizaje socioemocional, aprendizaje cognitivo, ambiente escolar, etc.	
Descripción	Aplicar un instrumento que considere los cambios en el modelo operativo del Programa, alcance y cobertura de 7,000 planteles del tipo medio superior en una muestra de planteles.	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Contratación de institución experta especializada en evaluación de impacto.	Proceso competitivo de selección.	Meses 24 y 25 del Plan Anual de Operación


PRODUCTO 23: Informe de resultados de los encuentros estatales con docentes y directivos		
Actividad Resultado (No. Actividad en Atlas)	Generación de redes de docentes y directivos en las cuales se promueve el intercambio de experiencias y buenas prácticas	
Propósito	Generar espacios en los cuales docentes y directivos de diversos planteles comparten experiencias de implementación y buenas prácticas del Programa	
Descripción	Aplicar un instrumento que considere los cambios en el modelo operativo del Programa, alcance y cobertura de 7,000 planteles del tipo medio superior en una muestra de planteles.	
Criterios de Calidad	Método de Calidad	Fecha de la Evaluación
Contratación de institución experta especializada en evaluación de impacto.	Proceso competitivo de selección.	Meses 19 y 20 del Plan Anual de Operación

Para el ciclo 2019-2020, se considera el siguiente plan de monitoreo y evaluación de acuerdo con las políticas y los procedimientos de programación del PNUD.

Plan de Monitoreo

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Asociados (si fuese conjunto)	Costo (si lo hubiese)
Seguimiento del progreso en el logro de los resultados	Reunir y analizar datos sobre el progreso realizado en comparación con los indicadores de resultados que aparecen en el Marco de Resultados y Recursos (RRF por sus siglas en inglés) a fin de valorar el avance del proyecto en relación con el logro de los productos acordados. Asimismo, se establecerán desde la SEMS indicadores de seguimiento acordes con sus líneas de política.	Cuatrimestral	La gerencia del proyecto analizará cualquier demora que afecte el avance esperado del proyecto.	Secretaría de Educación Pública	Se definirá en el marco del Equipo Técnico
Monitoreo y Gestión del Riesgo	Identificar riesgos específicos que pueden comprometer el logro de los resultados previstos. Identificar y monitorear medidas de gestión del riesgo mediante un registro de riesgos. Ello incluye medidas	Trimestralmente	La gerencia del proyecto identificará los riesgos y tomará medidas para controlarlos. Se mantendrá un	Equipo interno PNUD	No aplica

Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Asociados (si fuese conjunto)	Costo (si lo hubiese)
	de monitoreo y planes que se pueden haber exigido según los Estándares Sociales y Ambientales del PNUD. Las auditorías se realizarán conforme a la política de auditoría del PNUD para gestionar el riesgo financiero.		registro activo para el seguimiento de los riesgos identificados y las medidas tomadas.		
Aprendizaje	Se captarán en forma periódica los conocimientos, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas de otros proyectos y asociados en la implementación y se integrarán al presente proyecto.	Anual	El equipo del proyecto capta las lecciones relevantes que se utilizarán para tomar decisiones gerenciales debidamente informadas.	Equipo interno PNUD	No aplica
Aseguramiento de Calidad Anual del Proyecto	Se valorará la calidad del proyecto conforme a los estándares de calidad del PNUD a fin de identificar sus fortalezas y debilidades e informar a la gerencia para apoyar la toma de decisiones que facilite las mejoras relevantes.	Anual	La gerencia del proyecto revisará las fortalezas y debilidades que se utilizarán para la toma de decisiones informadas a fin de mejorar el desempeño del proyecto.	Equipo interno PNUD	No aplica
Revisar y Efectuar Correcciones en el curso de acción	Revisión interna de datos y evidencia a partir de todas las acciones de monitoreo para asegurar la toma de decisiones informadas.	Semestral	La Junta Directiva del Proyecto debatirá los datos de desempeño, riesgos, lecciones y calidad que se utilizarán para corregir el curso de acción.	Equipo interno PNUD y Secretaría de Educación Pública	No aplica
Informe del Proyecto	Se presentará un Informe del Proyecto a la Junta Directiva y a los actores clave, incluyendo datos sobre el progreso realizado que reflejen los resultados logrados de conformidad con las metas anuales definidas de antemano	Anual y al finalizar el proyecto (Informe Final)		Equipo interno PNUD	No aplica



Actividad de Monitoreo	Objetivo	Frecuencia	Medidas a Seguir	Asociados (si fuese conjunto)	Costo (si lo hubiese)
	en cuanto a productos, un resumen anual sobre la calificación de la calidad del proyecto, un registro de riesgos actualizado, con medidas de mitigación, y todo informe de evaluación o revisión preparado durante el período.				
Revisión del Proyecto (Junta Directiva del Proyecto)	El mecanismo de gobernanza del proyecto (es decir, la Junta Directiva del Proyecto) efectuará revisiones periódicas del proyecto para evaluar su desempeño y revisar el Plan de Trabajo Plurianual, a fin de asegurar una elaboración del presupuesto realista durante la vida del proyecto. En el transcurso del último año del proyecto, la Junta Directiva realizará una revisión final del proyecto para captar las lecciones aprendidas y debatir aquellas oportunidades para escalar y socializar los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas con los actores relevantes.	Anual	La Junta Directiva del Proyecto debatirá toda inquietud referente a la calidad o a un progreso más lento de lo esperado y acordará medidas de gestión para abordar las cuestiones identificadas.	Equipo interno PNUD y Secretaría de Educación Pública	No aplica

Plan de Evaluación

Título de la Evaluación	Asociados (si fuese un proyecto conjunto)	Producto Relacionado del Plan Estratégico	Efecto MECNUD/CPD	Fecha de Realización Prevista	Principales Actores en la Evaluación	Costo y Fuente de Financiamiento
Evaluación de medio término (interna PNUD)	Secretaría de Educación Pública	Outcome 1. Erradicar la pobreza en todas sus formas	CPD 35	Agosto 2019	PNUD y SEMS. Se contempla una evaluación interna de carácter cualitativo.	El alcance y los costos se definirán en el marco del equipo técnico, fuente: recursos del proyecto



VII. CONTEXTO LEGAL

Este documento conjuntamente con el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México 2014-2019 (UNDAF) firmado por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Sistema de las Naciones Unidas en México (SNU) el cual se incorpora como referencia, constituyen el Documento de Proyecto.

El instrumento de referencia para el acuerdo entre el fondo especial y el gobierno de México (firmado el 23 de febrero de 1961), junto con sus dos resoluciones de asamblea, es parte de este documento. (Anexo I)

La responsabilidad para la seguridad y protección del Proyecto y su personal y propiedad, y de la propiedad del PNUD que se encuentre bajo la custodia del Asociado en la Implementación recaerá, en su caso, en el propio Asociado en la Implementación.⁴⁷

El Asociado en la Implementación deberá:

- a) implementar un plan de seguridad apropiado y actualizar el plan de seguridad, tomando en cuenta la situación del país donde el Proyecto se ejecute;
- b) asumir todos los riesgos y obligaciones relacionadas a la seguridad del Asociado en la Implementación y de la implementación total del plan de seguridad.

El PNUD se reserva el derecho de verificar si tal plan está siendo implementado, y sugerir modificaciones al plan cuando sea necesario. El no cumplimiento en el mantenimiento e implementación de un plan de seguridad apropiado como aquí se requiere será considerado una violación a este acuerdo.

El PNUD acuerda realizar todos los esfuerzos razonables para asegurar que ninguno de los fondos del Proyecto sean utilizados para proporcionar apoyo a individuos o entidades asociadas con terrorismo y que los receptores de tales cantidades proporcionadas por el PNUD aquí acordadas no se encuentren en la lista que mantiene el Comité del Consejo de Seguridad establecido de la resolución 1267 (1999). La lista puede encontrarse en la siguiente dirección electrónica: <http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm>. Esta provisión debe ser incluida en todos los subcontratos o sub-acuerdos que se suscriban en el marco de este Documento de Proyecto.

Texto Organismos participantes del Sistema de Naciones Unidas

Organismos SNU	Acuerdo
PNUD	<ul style="list-style-type: none">• El instrumento de referencia para el acuerdo entre el fondo especial y el gobierno de México (firmado el 23 de febrero de 1961), junto con sus dos resoluciones de asamblea, es parte de este documento.

⁴⁷ Sin embargo, debido a que el personal y la propiedad del Proyecto se encuentran ubicados en las instalaciones del PNUD, la seguridad y protección del personal y propiedad del Proyecto, para efectos de este Documento de Proyecto, corresponderá al PNUD, conforme a su normatividad y mecanismos.

Organismos SNU	Acuerdo
	<ul style="list-style-type: none">• Para los fines del acuerdo, el organismo de ejecución del gobierno es el mismo organismo de ejecución del país huésped que aparece en el propio acuerdo. El documento que rige su normatividad es el Manual de Proyectos de ejecución nacional (Manual Nex).• En virtud de la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas, firmada por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, nada de lo dispuesto ni en este documento ni en otros contractuales que se rubriquen a manera de amparo, podrá interpretarse como una renuncia expresa o tácita a toda inmunidad de jurisdicción, privilegio, excepción o cualquier otra inmunidad de que goce el PNUD.



VIII. BIBLIOGRAFÍA

Alderete, A. M. y Cardoso, G., 2009. Adolescentes en riesgo psicosocial y resiliencia. *Psicología desde el Caribe*, Volumen 23, pp. 148-182.

Alfonso M., Santiago A., M. Bassi. Estimating the Impact of Placing Top University Graduates in Vulnerable Schools in Chile. Inter-American Development Bank, Education Division (SCL/EDU). TECHNICAL NOTES No. IDB-TN-230.

Arceo-Gómez, E. O. y Campos-Vázquez, R. M., 2014. Evolución de la brecha salarial de género en México. *El Trimestre Económico*, Fondo de Cultura Económica, Issue 323, pp. 619-653.

Arón, A. y Milicic, N., 1999. *Clima social escolar y desarrollo personal: un programa de mejoramiento*. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello.

Bazán, C. y Kudó, Inés, *Estudiantes sanos, seguros y felices: El rol del clima escolar y las habilidades socioemocionales*, Segunda edición. Lima, Perú: Banco Mundial, 2014.

Betanuett-Kattan, R. y Székely, M., 2013. *Deserción en la Educación Media Superior de México: patrones, consecuencias y posibles causas*, Washington, D.C., Centro de Estudios Educativos y Sociales, World Bank.

Brackett, M.A., Fernández-Barrocal, P., y Palomera, R., 2008. La inteligencia emocional como una competencia básica en la formación inicial de los docentes: algunas evidencias. *Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa*, Vol. 6 (2), pp 437-454.

Bruns, B. y Luque, J., 2014. *Docentes excelentes: Cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe*, resumen, Washington, DC, Banco Mundial. Licencia: Creative Commons de Reconocimiento CC BY 3.0. Publicado originalmente en inglés.

Cobb, C.D. y Mayer, J.D., 2000. Emotional Intelligence: What the reasearch says, *Educational Leadership*, noviembre 2000.


Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL), *What is social emotional learning?* disponible en: <http://www.casel.org/social-and-emotional-learning>.

Cunningham, Wendy, Linda McGinnis, Rodrigo García Verdú, Cornelia Tesliuc y Dorte Verner, *Youth at Risk in Latin America and the Caribbean: Understanding the Causes, Realizing the Potential*, Directions in Human Development, World Bank, 2008.

Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en Educación Media Superior, 2013.

Hair, E., Jager, J., and S. Garrett, *Helping Teens Develop Healthy Social Skills and Relationships: What the Research Shows about Navigating Adolescence*, Child Trends, Research Brief, 2002.

Hanushek, E. y S. Rivkin, 2010. "Generalizations about Using Value-Added Measures of Teacher Quality", *American Economic Review* 100 (2), págs. 267-71.



Hawkins, J. D., Smith B. H., y Catalano, R.F., *Social development and social and emotional learning*, 2014, en Milicic et al, *Aprendizaje Socioemocional*. Programa Base, Editorial Paidós, 2014.

Heckman, James, The case for Investing in Young Children, European Expert Network on Economics of Education Policy Brief 1/2012, enero de 2012.

Heckman, J. y Kautz, T., 2012. Hard Evidence on Soft Skills. *Labour Economics*, Elsevier, 19(4), pp. 451-464.

Heckman, J. y Kautz, T., 2013. Fostering and Measuring Skills: Interventions that Improve Character and Cognition. National Bureau of Economic Research, Volumen Working Paper 19656.

Heckman, James y Flavio Cunha, "Investing in our young people", Working Paper 16201, National Bureau of Economic Research, 2010.

Heckman, James y Tim Kautz, *Fostering and Measuring Skills: Interventions that Improve Character and Cognition*, Human Capital and Economic Opportunity Global Working Group, noviembre de 2013.

Lopes, P. y Salovey, P. (2004). "Toward a broader education: Social, emotional, and practical skills", en J. E. Zins, R. P. Weissberg, M. C. Wang, y H. J. Walberg (Eds.), *Building school success on social and emotional learning* (pp. 79-93). New York: Teachers College Press.

Milicic, Neva, Lidia Alcalay, Christian Berger, y Alejandra Torretti, *Aprendizaje Socioemocional*. Programa Base, Editorial Paidós, 2014.

Murck, Max, *School Climate and its impact on School Climate*, World Bank, 2014.

Payton, J., Weissberg, R.P., Durlak, J.A., Dymnicki, A.B., Taylor, R.D., Schellinger, K.B., & Pachan, M., *The positive impact of social and emotional learning for kindergarten to eighth-grade students: Findings from three scientific reviews*. Chicago, IL: Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, 2008.


Programa Construye T, Documentos de Proyecto, 2008 a 2013.

Rockoff, J. E., 2004. "The Impact of Individual Teachers on Student Achievement: Evidence from Panel Data", *American Economic Review* 94 (2), págs. 247-52.

Rosenholtz, S. J. y Simpson, C., 1990. Workplace Conditions and the Rise and Fall of Teachers' Commitment, *Sociology of Education*, Vol. 63, No. 4, pp. 241-257.

Smith, Stuart C. y Scott, James J., 1990. The Collaborative School: A Work Environment for Effective Instruction, ERIC/CEM School Management Digest Series, No. 33.

UNESCO, 2006. Modelos innovadores en la formación inicial docente: estudio de casos de modelos innovadores en la formación docente en américa latina y europa. Disponible en <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001465/146544s.pdf>



Vaillant, D., y Rossel, C., 2010. El reconocimiento de la docencia efectiva: la premiación a la excelencia, PREAL, Serie Documentos, No. 48.

Waldron, Nancy y McLenskey, James, 2010. Establishing a Collaborative School Culture Through Comprehensive School Reform, Journal of Educational and Psychological Consultation, Vol. 20, 58-74.

Weare, K., y Gray G., 2003. What Works in developing children's emotional and social competence and wellbeing? Department for Education and Skills research report, No. 456, citado en Brackett, M.A., Fernández-Barrocal, P., y Palomera, R., 2008.

West, J. Frederic y Idol, Lorna, 1993. The Counselor as Consultant in the Collaborative School, Journal of Counseling & Development, Vol. 71, Issue 6, 678-683.



IX. APÉNDICES

ANÁLISIS DE RIESGOS

APÉNDICE I. Teoría de cambio del nuevo modelo de intervención del Programa Construye T 2015-2016 y 2016-2017.

APÉNDICE II. Análisis de actores involucrados en la operación del Programa.

APÉNDICE III. Impactos superiores del Programa Construye T – Teoría de Cambio a partir de la transformación del Ambiente Escolar en los planteles de EMS.



Análisis de Riesgos

Al inicio de la fase del proyecto (2015) se realizó el siguiente análisis de riesgos:

Nombre del Proyecto: Cuarta Fase: Apoyo a las y los jóvenes del tipo medio superior para el desarrollo de su proyecto de vida y la prevención de conductas de riesgo, Programa Construye T.	Fecha de realización: Junio 2015
--	---


#	Descripción	Tipo	Impacto & Probabilidad	Contra medidas / Mngt respuesta	Propietario	Presentado Actualizado por	Última actualización	Estatus
1	Retraso en la derivación de recursos por parte de la SEMS para la implementación del Proyecto Construye T.	Financiero	<p>Ante la falta de recursos operativos, la normativa establece la no posibilidad de emisión de convenios de colaboración con OSC.</p> <p>El retraso en la derivación de recursos de igual forma impactaría en la implementación de las actividades establecidas en el Plan de Trabajo Nacional en los tiempos y formas establecidos.</p> <p>P = 3 I=4</p>	Realización de revisiones sustantivas y presupuestales con la debida anticipación. Comunicación constante con el donante, para tomar las medidas necesarias en conjunto para evitar retrasos en la derivación de los recursos financieros.	Agencia de Gestión	Agencia de Gestión	Enero 2014	El Proyecto actualmente se encuentra en proceso de recepción de nuevos recursos financieros por parte del donante para el desarrollo de la cuarta etapa del Proyecto Construye T.
2	Falta de consecución de los objetivos y metas establecidas en el marco del Proyecto Construye T debido a la sobrecarga de trabajo existente en algunas escuelas de educación media superior.	Operativo Organizacional	En el marco del nuevo modelo operativo del Proyecto Construye T se establecen responsabilidades importantes sobre la figura de los docentes y directivos de las escuelas de educación media superior. Con base en la experiencia previa de operación del Proyecto, estos	Acompañamiento por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil para la correcta implementación de los Planes de Trabajo Escolares.	Asociado en la Implementación	Agencia de Gestión	Mayo 2014	El Proyecto se encuentra actualmente definiendo las características del modelo de operación del Proyecto para establecer y operar los mecanismos necesarios para el correcto cumplimiento del Plan

#	Descripción	Tipo	Impacto & Probabilidad	Contra medidas / Mngt respuesta	Propietario	Presentado Actualizado por	Última actualización	Estatus
			actores han expresado la ausencia de horas libres y/o descarga de trabajo, para poder desarrollar de forma íntegra las actividades de Construye T. P = 3 I = 4					de Trabajo de cada escuela.




Para la revisión sustantiva del proyecto que corresponde al ciclo escolar 2019-2020 se actualizó el análisis de riesgos para contemplar lo siguiente:

Título del Proyecto: Cuarta Fase: Apoyo a las y los jóvenes del tipo medio superior para el desarrollo de su proyecto de vida y la prevención de conductas de riesgo, Programa Construye T		Número de Proyecto: 0095479	Fecha de realización: 27/03/2019 ⁴⁸
Descripción	Categoría de Riesgos	Impacto Probabilidad y	Tratamiento del riesgo/ Medidas de mitigación
Los cambios en la estructura organizacional de la SEP- SEMS pueden provocar retrasos en la operación del proyecto, debido al proceso de adaptación a los procesos de gestión.	Estratégico	Podrían presentarse retrasos al plan de trabajo convenido para el periodo. Podrían no realizarse todas las estrategias previstas. P = 1 I = 3	El PNUD ha presentado a la SEP toda la información relevante acerca del proyecto, tanto en términos técnicos, de gestión y operativos. Se ha informado de los procesos internos, requisitos y forma de operar del PNUD, además del rol y responsabilidades de la contraparte. Además, se han dado a conocer los tiempos estimados del PNUD para realizar distintas acciones contempladas para la ejecución del proyecto. Se han establecido a los actores responsables para la toma de decisiones financieras y operativas en ambas partes.
Los cambios en la legislación educativa cambian la visión de enseñanza de las habilidades socioemocionales para el nivel medio superior o restan importancia a operar el programa en los planteles, por lo que los planteles suspenden la implementación de Construye T por falta de incentivos.	Regulatorio	El alcance del proyecto disminuiría en término de planteles involucrados. La disposición a cooperar con el PNUD de las autoridades locales y de los planteles podría disminuir. P = 2 I = 2	El PNUD ha dialogado con la Secretaría de Educación Pública acerca de la importancia de la enseñanza de habilidades socioemocionales y su inclusión en el programa de estudios del nivel medio superior. También, ha planteado distintos escenarios bajo los cuales el programa podría operar si los cambios en la legislación afectasen negativamente al proyecto.
			Responsable del riesgo Equipo PNUD





⁴⁸ Fecha de elaboración del análisis de riesgo conforme a lo acordado en la Junta de Proyecto, celebrada el 26 de marzo de 2019.

<p>Los procesos administrativos del PNUD para la contratación de consultores, firma de convenios y acuerdos, y adquisición de bienes y servicios retrasan la operación del proyecto de acuerdo al cronograma establecido.</p>	<p>Operacional</p>	<p>Las actividades del Proyecto que requieren contrataciones, adquisiciones o firma de convenios y acuerdos pueden retrasarse debido a los tiempos institucionales requeridos para llevar a cabo estos procesos.</p> <p>P = 1 I = 3</p>	<p>El PNUD ha dado a conocer a la SEP las características de sus procesos internos, tales como los tiempos de ejecución, sus requisitos y el rol de la contraparte. Esto con el fin de que el cronograma de trabajo considere estos tiempos. A su vez, a nivel interno, el equipo del proyecto en el PNUD compartirá el plan de trabajo y mantendrá un diálogo constante con las áreas operativas del PNUD involucradas en los procesos de adquisiciones, contrataciones y establecimiento de convenios y acuerdos. Eso les permitirá considerar estos procesos en su planeación y establecimiento de prioridades.</p>	<p>Equipo PNUD</p>
<p>Los cambios en el diseño del programa resultan confusos para la población objetivo (planteles de EMS), por lo que estos deciden no operar el programa o implementarlo bajo modelos anteriores.</p>	<p>Operacional</p>	<p>Los planteles deciden no operar el programa o utilizan modelos de implementación antiguos, debido a dificultades para actualizarse en los cambios de estrategia o para entender las adecuaciones propuestas para el nuevo ciclo.</p> <p>P = 3 I = 3</p>	<p>El PNUD utilizará su estrategia de comunicación y difusión con actores estratégicos y en redes sociales para comunicar oportunamente los cambios en el diseño del programa. Asimismo, establecerá contacto con las autoridades educativas responsables de dialogar con los planteles sobre la implementación de Construye T. Además, se crearán materiales didácticos que comuniquen de forma sencilla y rápida los cambios en el programa.</p>	<p>Equipo PNUD</p>
<p>El proyecto no recibe nuevos recursos adicionales por parte del gobierno, para su operación antes de abril de 2020.</p>	<p>Financiero</p>	<p>El Proyecto terminaría sus operaciones y entraría en etapa de cierre.</p> <p>P = 2 I = 5</p>	<p>El PNUD ha mantenido un diálogo constante con el gobierno federal actual, con el fin de dar a conocer los objetivos, la relevancia y los efectos esperados del proyecto, así como los procesos de planeación y gestión para la posible extensión del proyecto más allá de 2020. De la misma forma, se han integrado estrategias nuevas al proyecto para alinearlo con las prioridades del gobierno actual.</p>	<p>Equipo PNUD</p>



APÉNDICE I. Teoría de cambio del nuevo modelo de intervención del Programa Construye T 2015-2016 y 2016-2017.

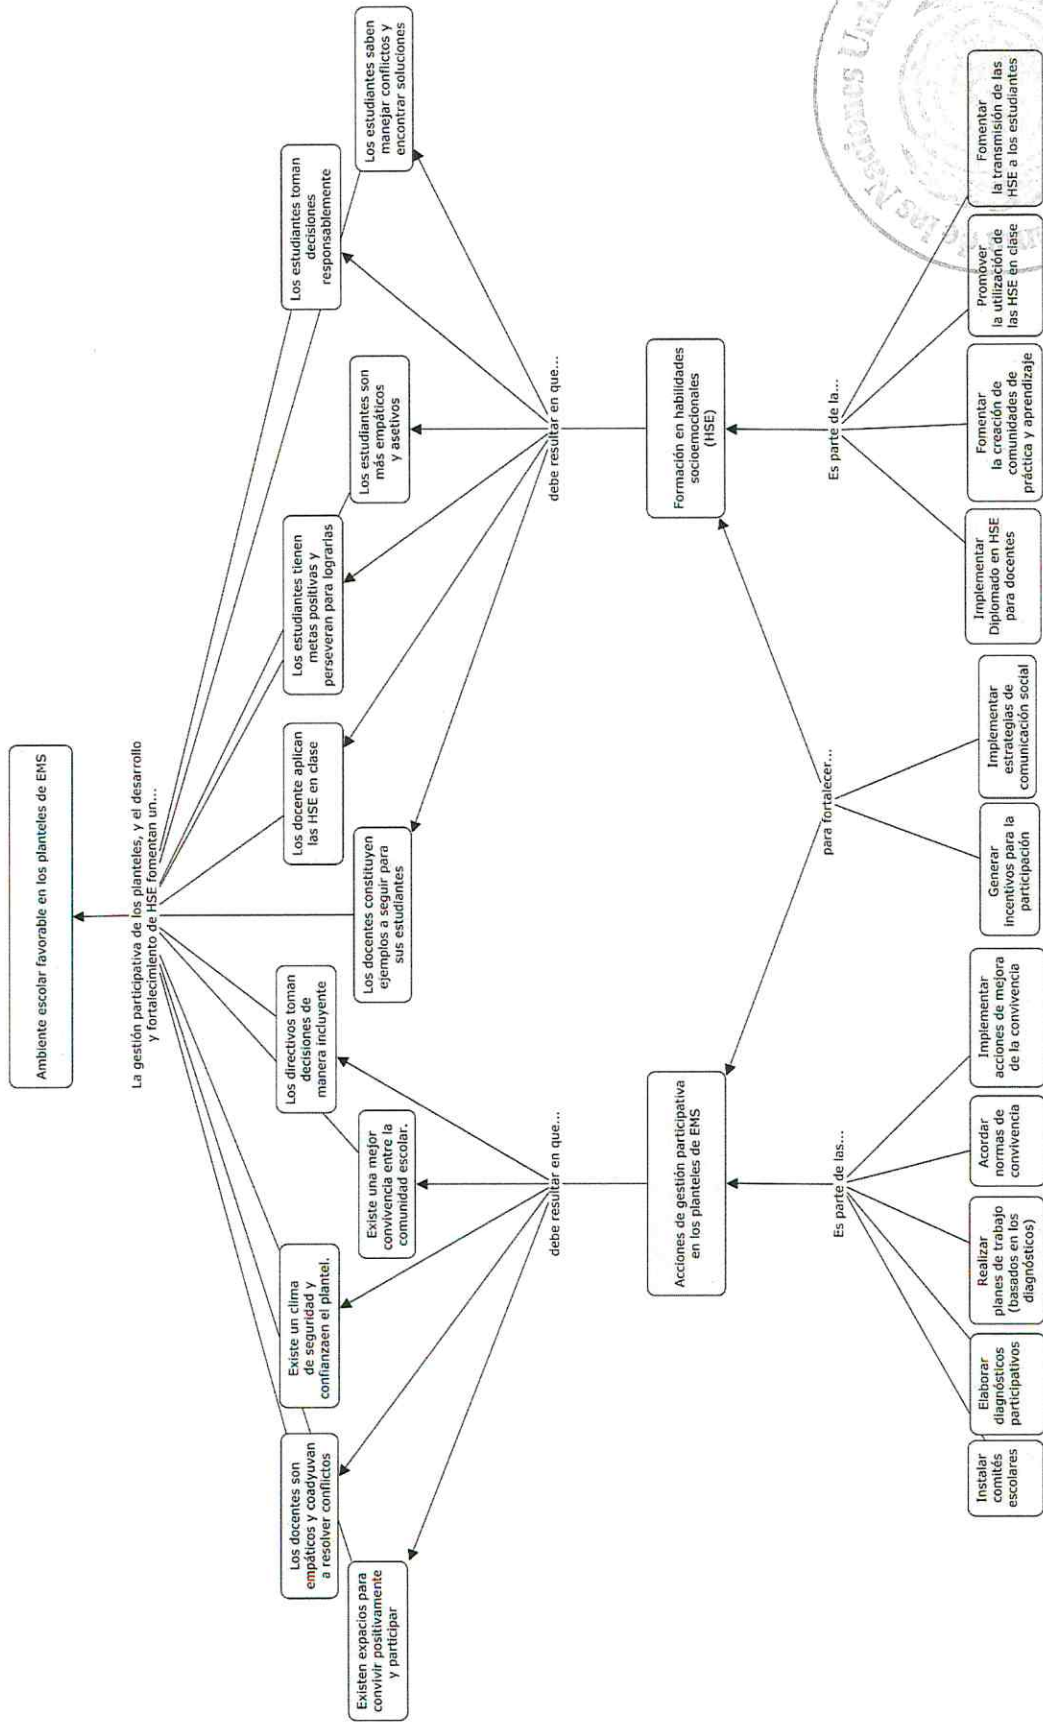


RIESGOS

- Los docentes y directivos perciben el programa como una carga adicional e impositiva
- El enfoque de habilidades socioemocionales no fue bien asimilado por los docentes y por lo tanto no es transmitido correctamente a estudiantes
- Las autoridades de los subsistemas no se apropian del proceso de implementación del programa e imponen metas y/o actividades que no atienden las necesidades del plantel
- Desmotivación de la comunidad escolar por falta de estrategias personalizadas a las necesidades de los contextos locales

SUPUESTOS


- Los directivos se muestran receptivos a las propuestas de mejora de la gestión escolar de sus planteles
- Los tutores Construye T y directores capacitados permanecen en funciones en sus planteles y comparten los aprendizajes y herramientas del Programa con el resto del personal del plantel
- Los materiales y guías son prácticos, claros y responden a las necesidades de los distintos subsistemas participantes
- Directores, docentes y estudiantes usan los materiales y guías
- Los docentes y directores disponen de tiempo para capacitación y aplicar las herramientas de Construye T
- Directores y docentes tienen acceso a internet para capacitarse y usar los materiales
- Los asesores expertos se apropian del modelo y dan seguimiento efectivo a los Tutores Construye T
- Los Tutores Construye T cumplen con el perfil requerido
- Las autoridades educativas se comprometen a dar seguimiento y reforzar la difusión de las estrategias del Programa
- Las herramientas del programa incentivan la participación de los estudiantes
- Directores y docentes encuentran útiles las estrategias y materiales proporcionados por el Programa



APÉNDICE I. Teoría de cambio del Programa Construye T 2018-2020.

Problema: Los estudiantes de educación media superior necesitan desarrollar nuevas habilidades para superar los retos personales, académicos, sociales y globales a los que se enfrentarán.

Insumos <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Personal especializado del PNUD en aprendizaje socioemocional y desarrollo integral<input type="checkbox"/> Personal especializado en temas de educación sexual, deporte y artes<input type="checkbox"/> Personal técnico para la coordinación, gestión, seguimiento a la implementación y de comunicación<input type="checkbox"/> Personal especializado para realizar el asesoramiento en línea<input type="checkbox"/> Buenas prácticas de etapas previas (capacidad instalada) y evidencia científica y contenidos de otras intervenciones efectivas de aprendizaje socioemocional a nivel nacional e internacional
Actividades <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Materiales del componente de aprendizaje socioemocional en el aula (desarrollados previamente)<input type="checkbox"/> Plataforma de acompañamiento en línea (desarrollados previamente)<input type="checkbox"/> Actualización de página web y generación de nuevos contenidos para redes sociales<input type="checkbox"/> Desarrollo y adaptación de contenidos de capacitación para la implementación de los nuevos componentes del programa<input type="checkbox"/> Desarrollo de materiales y guías para los nuevos componentes del programa<input type="checkbox"/> Actualización y/o adaptaciones a la estrategia de acompañamiento para integrar los nuevos componentes del programa<input type="checkbox"/> Capacitación de asesores para la estrategia de acompañamiento en línea<input type="checkbox"/> Acciones de difusión y posicionamiento del programa a nivel nacional e internacional (campañas, concursos, foros, entre otros)<input type="checkbox"/> Creación de alianzas y vinculación interinstitucional<input type="checkbox"/> Diseño de los modelos piloto con metodologías específicas para contextos, subsistemas o planteles cuyas necesidades requieran de una intervención estratégica
Productos <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Plataforma de capacitación en línea desarrollada y en operación<input type="checkbox"/> Plataforma de asesoría adaptada a los nuevos componentes del programa y en operación<input type="checkbox"/> Guías de implementación, materiales pedagógicos y tutoriales desarrollados y a disposición de los planteles a través de medios digitales<input type="checkbox"/> Sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas en los planteles a partir de la estrategia de acompañamiento<input type="checkbox"/> Implementación de modelos piloto para planteles cuyas necesidades requieran de una intervención estratégica.
Resultados a corto plazo <ul style="list-style-type: none">• Los docentes capacitados amplían su conocimiento sobre las habilidades socioemocionales y como enseñarlas en diversos espacios escolares y comunitarios.• Los docentes capacitados implementan con mayor fidelidad las actividades de desarrollo socioemocional en espacios escolares y comunitarios.• Los estudiantes participan en las actividades de desarrollo socioemocional de sus planteles y aprenden sobre las habilidades socioemocionales asociadas a la responsabilidad social, educación sexual, deporte y artes.• El programa desarrolla modelos alternativos efectivos y con viabilidad de implementarse a gran escala en contextos, subsistemas o planteles con necesidades que requieran de una intervención estratégica.
Resultados a mediano plazo <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Los planteles son sensibilizados sobre la importancia del aprendizaje socioemocional con enfoque integral<input type="checkbox"/> Los planteles cuentan con las capacidades para promover el desarrollo de habilidades socioemocionales entre los estudiantes en espacios escolares y comunitarios<input type="checkbox"/> Los estudiantes desarrollan las habilidades enseñadas durante el bachillerato y éstas sirven como un factor de protección ante conductas de riesgo<input type="checkbox"/> Los planteles cuentan con modelos de intervención alternativos eficaces para implementar el programa y atender necesidades que ameriten intervenciones estratégicas
Impacto <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Aumento en el bienestar de los jóvenes<input type="checkbox"/> Disminución de conductas de riesgo como consumo de sustancias, abandono escolar y embarazo adolescente, entre otras<input type="checkbox"/> Aumento en la permanencia<input type="checkbox"/> Mejora en el ambiente escolar con la mejora de las relaciones entre actores y disminución de la violencia y el bullying<input type="checkbox"/> Mejora en el ambiente comunitario mediante la participación de los jóvenes en actividades fuera del plantel



Con esta intervención, se abona al diseño de una política pública que contribuye a revertir y atender factores de desigualdad entre los jóvenes y, ulteriormente, al efecto 39 del MANUD: "El Estado mexicano habrá implementado una estrategia de desarrollo social integral que garantice el cumplimiento de los derechos humanos mediante la articulación de políticas públicas que efectivamente contribuyan a la disminución de la pobreza, la mejora de la calidad de vida y la disminución de las desigualdades de género, edad, etnia, económicas, de localización geográfica y condición de discapacidad, sustentada en esquemas de diálogo político y participación social inclusiva."


La teoría de cambio se basa en los siguientes supuestos:

- Los docentes que dirigen las sesiones de aprendizaje socioemocional se capacitan para familiarizarse con los aspectos teóricos y operativos del programa.
- La capacitación en línea y los materiales didácticos son suficientes para guiar a los docentes en la correcta implementación del programa en los planteles.
- El enfoque de habilidades socioemocionales es entendido y asimilado adecuadamente por los docentes, de modo que lo transmiten correctamente a los estudiantes.
- La carga de trabajo de los docentes les permite llevar a cabo las sesiones con la periodicidad y duración recomendada por el programa.
- Los docentes llevan a cabo las actividades en el plantel de acuerdo a las prácticas recomendadas en los materiales y en los cursos de capacitación: apegándose a los objetivos, contenidos, la frecuencia recomendada, el orden de las actividades y la HSE correspondiente al semestre del estudiante.
- Los estudiantes muestran interés en las actividades del programa en todos sus componentes. Esto permite que, en primer lugar, comprendan los conceptos asociados al tema. En segundo lugar, los estudiantes son capaces de poner las habilidades socioemocionales en práctica en escenarios simulados guiados por los docentes. Y, finalmente, los estudiantes se apropian de dichas habilidades y las practican en escenarios reales.




APÉNDICE II. Análisis de actores involucrados en la operación del Programa

Actores involucrados	Tipo y nivel de involucramiento en el proyecto	Capacidad y recursos/vulnerabilidades	Resultados deseados/ cambios en los involucrados	Influencia/impacto de los involucrados sobre los resultados
Directivos/as de los planteles escolares	El estilo de liderazgo y la forma de gestión por parte del director influye en la convivencia dentro del plantel.	Necesitan recibir herramientas para fortalecer la gestión de los planteles desde el enfoque de las HSE.	Los directivos utilizan las herramientas de gestión con enfoque de HSE para mejorar la convivencia en el plantel.	Nivel de influencia: ALTO Al transformar la gestión del plantel hacia una gestión con enfoque en HSE, contribuyen a la mejora de la convivencia y propician la formación de HSE del resto de la comunidad escolar.
Tutor/a Construye T	El nivel de HSE, motivación y liderazgo que posean, así como la capacidad para formar a través del trabajo colaborativo en comunidades de aprendizaje, determinará la formación de HSE en los docentes	Requieren ser formados en el enfoque de HSE, además de recibir herramientas prácticas para la formación de comunidades de aprendizaje y la transmisión de HSE a través de trabajo colaborativo con sus pares.	Los tutores Construye T utilizan las herramientas proporcionadas para el trabajo colaborativo entre pares y la formación de comunidades de aprendizaje. Transmitem HSE a los docentes.	Nivel de influencia: ALTO El tutor Construye T es el punto de partida para la creación de las comunidades de aprendizaje donde los docentes desarrollarán sus propias HSE y recibirán las herramientas prácticas para mejorar la convivencia dentro las aulas y formar HSE en sus estudiantes.
Docentes	El nivel de HSE que posean, así como la capacidad de transmitirles, influye en la convivencia dentro del aula, y en la formación de estas habilidades en los alumnos.	Los docentes necesitan desarrollar y/o fortalecer sus propias HSE, además de recibir herramientas prácticas para fortalecer la transmisión de estas habilidades en el contexto del aula.	Los docentes con HSE desarrolladas, y con herramientas para transmitirles, mejoran la convivencia dentro del aula y favorecen la formación de HSE en sus alumnos.	Nivel de influencia: ALTO El docente es el eslabón fundamental en el proceso de formación de HSE en los alumnos.




En TESTIMONIO de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Anexo I en la Ciudad de México, el **5 de julio de dos mil diecinueve**, en cinco (5) ejemplares en idioma español, de un mismo tenor y a los mismos efectos.

**POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS**



**Juan Pablo Arroyo
Subsecretario de Educación Media
Superior**

**POR EL PROGRAMA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO**



**Sr. Lorenzo Jiménez de Luis
Representante Residente
del PNUD México**



ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO I DEL TERCER CONVENIO MODIFICATORIO DEL ACUERDO FIRMADO EL 21 DE AGOSTO DE 2015 ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DEL PROYECTO "CUARTA FASE: APOYO A LAS Y LOS JÓVENES DEL TIPO MEDIO SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DE SU PROYECTO DE VIDA Y LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, PROGRAMA CONSTRUYE T".
