



**République du TCHAD**  
**Ministère de l'Environnement, de la Pêche et du**  
**Développement Durable (MEPDD)**

---

**Compte-Rendu de la première réunion du comité de pilotage de  
l'année 2022 des projets conjoints du ministère de l'Environnement,  
de la Pêche et du Développement Durable (MEPDD) du Tchad mis en  
œuvre en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le  
développement (PNUD)**

**N'Djamena, le 18 janvier 2022**

**Hôtel Radisson Blu**

*sil*

## **TABLE DES MATIERES**

I.	INTRODUCTION .....	3
II.	DEROULEMENT DES TRAVAUX .....	3
a)	Cérémonie d'ouverture .....	4
b)	Présentations et débats.....	5
III.	Cérémonie de clôture .....	6
IV.	RECOMMANDATIONS.....	6
V.	ANNEXES .....	8
1.	Annexe 1 : Photothèques .....	8
2.	Annexe 2 : Liste des participants .....	9
3.	Annexe 3 : TDRs et agenda .....	10

## I. INTRODUCTION

Sur invitation du Ministre de l'Environnement, de la Pêche et de Développement Durable (MEPDD), Monsieur **MAHAMAT AHMAT LAZINA**, Président du Comité de Pilotage des Projets (COPIL-P) conjoints mis en œuvre par son département avec l'appui technique et financier du Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM) et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et d'autres partenaires, il s'est tenu le mardi **18 janvier 2021**, à l'hôtel **Radisson Blu de N'Djamena**, la première réunion du Comité de Pilotage de l'année 2022 du projet Plan National d'Adaptation aux Changements Climatiques (PNA) du Tchad.

Ce projet a pour but l'appui à la mise en œuvre du Programme National de Développement (PND) et de la vision 2030 « **Le Tchad que nous voulons** », notamment aux axes stratégiques liés à la préservation de l'environnement. Le projet PNA ainsi que les deux autres dont le ministère est bénéficiaire sont destinés à jouer un rôle essentiel, dans la réduction de la vulnérabilité des systèmes de production et l'amélioration de leur capacité d'adaptation face aux effets néfastes des Changements Climatiques.

La rencontre a regroupé une trentaine de membres composés des cadres représentants des ministères sectoriels et des projets mis à contribution, des ONG, des partenaires techniques et financiers impliqués dans la mise en œuvre du projet sus-cité notamment le PNUD, ainsi que des acteurs de la société civile.

Ce Comité de Pilotage avait principalement pour objectif l'examen de manière consensuelle des résultats de l'année 2021, des Plans de Travail et des Budgets de l'année 2022 afin de développer une vision commune pour les prochaines étapes. Les principaux résultats attendus à l'issue de la réunion sont les suivants :

- un examen de la mise en œuvre des recommandations issues de la première réunion ; du Comité de Pilotage du projet tenu en février 2021 est fait et validé ;
- les rapports bilan de mise en œuvre des PTA 2021 sont examinés et adoptés ;
- le PTA 2022 du projet PNA est examiné et adopté par le Comité ;
- un accord est trouvé en vue de la prorogation du projet.

La réunion a été présidée par Monsieur Oualbadet Magomna, Secrétaire Général du MEPDD, représentant le Ministre, Président du Comité de Pilotage des Projets (COPIL-P) et co-présidée par Mme Binta Sanneh, Représentante Résidente Adjointe au Programme (RRA/P) du PNUD. Le secrétariat a été assuré par la Direction de la Lutte contre les Changements Climatiques (DLCC) dudit ministère avec l'appui de la coordination du projet PNA et de la CELIAF.

## II. DEROULEMENT DES TRAVAUX

La rencontre a débuté avec un léger retard à 10h 15 minutes pour prendre fin à 15 h 38 minutes. Elle s'est déroulée conformément à l'agenda prévu à cet effet :

- l'ouverture officielle de la rencontre ;
- les différentes présentations, les discussions et les échanges
- la synthèse des recommandations et la cérémonie de clôture.

EF



### a) Cérémonie d'ouverture

L'ouverture officielle de la rencontre a été marquée par deux temps forts :

- les mots de bienvenue et de cadrage technique sur le projet par la Représentante Résidente Adjointe au Programme du PNUD ;
- le discours d'ouverture des travaux de la Réunion du Comité de Pilotage par Monsieur OUALBADET MAGOMNA, Secrétaire Général du MEPDD, représentant le Ministre , Président du Comité de Pilotage

Dans son discours de bienvenue, Madame la Représentante Résidente Adjointe au Programme du PNUD, a souhaité ses vœux les meilleurs pour l'année 2022 à Monsieur le Ministre à travers le Secrétaire Général du MEPDD et à tous les invités présents à cette importante réunion. Puis, elle a insisté sur la nécessité de tenir deux comités dans l'année, avant de se réjouir que celle-ci se tienne en début d'année malgré les agendas très chargés des uns et des autres.

Au regard de la modalité de mise en œuvre choisie, c'est à dire « Nationale », Mme Binta Sanneh a souligné l'importance de procéder à un examen judicieux des points de blocage par le comité de pilotage afin de formuler des recommandations claires pour booster la performance des projets.

Tout en remerciant le Ministre en charge de l'Environnement pour sa franche collaboration et sa promptitude dans des prises de décisions qui s'imposent pour corriger les manquements constatés en vue d'améliorer la gestion de ces projets, Madame la Représentante Adjointe a renouvelé la confiance en chacune des parties prenantes afin de maintenir un niveau d'engagement soutenu pour permettre à ces projets d'atteindre leurs objectifs et de contribuer ainsi à l'amélioration des conditions environnementales des populations tchadiennes.

Dans son discours d'ouverture de la réunion, le président du comité de pilotage a affirmé que le projet PNA est l'une des preuves concrètes du dynamisme de la collaboration agissante entre le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Gouvernement du Tchad à travers le Ministère de l'Environnement de la Pêche et du Développement Durable.

Il a évoqué la diversité écologique propice au développement du Tchad qui se heurte aux adversités tant sécuritaires que climatiques plaçant ainsi le pays dans une extrême vulnérabilité sur le plan du développement socio-économique et environnemental.

Il a ensuite félicité l'appui des partenaires au développement dans la mobilisation des ressources en faveur des divers programmes / projets de développement durable pertinents et catalyseurs surtout des promesses climat issues de la 26ème Conférence des parties (Cop 26) tenue à Glasgow en novembre 2021, qu'il salue en passant la bonne et active participation de la délégation du Tchad à ces assises mondiales.

Faisant le lien entre les apports du projet en termes d'appuis à l'élaboration de notes conceptuelles et des documents de politiques notamment les deux documents stratégiques à savoir la Contribution Déterminée au niveau national (CDN) mise à jour et du premier Plan National d'Adaptation du Tchad, le Président du Copil a établi le lien évident entre les actions du PNA et la Vision 2030, le « Tchad que nous voulons ». Il a annoncé à l'occasion l'agrément de deux documents stratégiques par le Secrétariat Exécutif des Nations unies sur les Changements climatiques et le Groupe d'experts des



pays les moins avancés (LEG), confirmant ainsi la volonté du Tchad aux côtés de la communauté internationale dans la lutte contre les Changements climatiques.

Cette phase cérémoniale a pris fin avec des photos de famille et une pause-café.

## **b) Présentations et débats**

Après l'étape d'ouverture, les travaux se sont poursuivis par les présentations alternées des discussions. L'Expert Suivi-évaluation du PNA a présenté au comité et de manière successive : le tableau de suivi des recommandations de la dernière réunion du comité de pilotage tenue en février 2021, le résumé du projet, le bilan des activités de l'année 2021.

**Première présentation :** Elle concerne l'examen du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière réunion du Comité de Pilotage de février 2021. Il a été déroulé au Copil les recommandations une par une en soulignant et en justifiant l'état de leur mise en œuvre par les parties responsables. Ainsi sur six (06) recommandations générales, quatre (04) ont été totalement mise en œuvre. Quant aux douze (12) recommandations spécifiques au PNA, six (06) recommandations sont totalement mise en œuvre et six (06) autres sont en cours de réalisation (voir annexe 3).

**Deuxième présentation :** Elle a porté sur le rapport bilan de mise en œuvre du projet PNA en 2021. L'Expert en suivi-évaluation du projet PNA a fait un bref aperçu du projet. Ensuite, il a mis l'accent sur les réalisations du PTA 2021, élaboré de manière participative avec l'implication des différents acteurs et validé lors de la dernière réunion du comité de pilotage en février 2021. Enfin, un focus a été fait sur les principales contraintes de mise en œuvre ainsi que les leçons apprises et bonnes pratiques. Des ressources mobilisées, des dépenses et engagements du budget 2021, il ressort un budget total approuvé de 2 399 693 USD exécuté à 86% au 31 décembre 2021 avec 95% d'exécution sur les fonds du PNUD et 84% sur les fonds du FEM.

**Troisième présentation :** Elle a porté sur l'examen du Plan de Travail Annuel et Budgets 2022 (PTBA 2022) du projet PNA. Monsieur Saturnin KOUMA KOSSI, Coordonnateur du projet a procédé au déroulement du PTA 2022 en mettant un accent particulier sur les contraintes et changements liés à l'avènement de la COVID-19. Des ressources à mobiliser pour le PTA 2022, il ressort un budget de 1 780 000 USD avec 19% à mobiliser sur les fonds du PNUD et 81% sur les fonds du FEM.

**Quatrième présentation :** Elle a porté sur la présentation des arguments justifiant la prorogation de la durée du projet de 12 mois.

Dans son argumentaire, le Coordonnateur a justifié la nécessité et raisons fondamentales justifiant la prolongation de la durée du projet. Entre autres : la lenteur dans la validation du Prodoc (16 août au 11 septembre 2018), le retard dans la tenue du 1er Copil du projet (19 février 2019), le lancement tardif (13 mois après la validation du Prodoc), la COVID-19, le décès tragique du président de la République du Tchad en avril 2021 mettant le pays dans une situation de transition et la non-finalisation du document du plan national d'adaptation complet. Tels sont les éléments justifiant la prorogation sans coût du projet.

Le Comité de pilotage a pris acte de la demande à adresser au FEM, mais il a demandé des clarifications sur le terme « prorogation sans coût ». M. Emmanuel KERYANG, Analyste programme

de l'Unité Développement Durable du PNUD et M. Saturnin Kouma Kossi se sont relayés pour expliquer au Copil qu'il y a des ressources nécessaires pour mener les activités restantes (1 052 755 \$) et qu'il est de principe d'adresser à l'avance la demande pour permettre la finalisation des activités à l'horizon 2023.

En marge de la discussion sur la dernière présentation du jour, la demande de clôture des deux autres projets (Réhabilitation des écosystèmes du Lac Tchad et de Renforcement des capacités du Ministère de l'Environnement et de la pêche) a été soumise au Copil afin qu'un acte soit délivré aux fins de la clôture définitive des deux projets.

Avant de clore la discussion sur le bilan des activités du PTA 2021 et les perspectives de 2022, le point évoqué dans le suivi des recommandations, point relatif à une proposition d'arrêté de création du CTS, a été repris pour souligner l'importance de ce comité scientifique et techniques afin de solliciter l'attention particulière de la structure de tutelle du projet.

Le Copil a pris acte de la demande de clôture des deux projets et de l'urgence d'actualiser le projet d'arrêté portant création du CTS, vu son importance.

Enfin la démarche du Copil en vue d'adresser une requête au Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), principal bailleur de fonds du projet PNA, ainsi que les stratégies d'actions à entreprendre pour permettre la finalisation des activités à l'horizon 2023, a été agréée à l'unanimité par les membres du comité.

### **III. Cérémonie de clôture**

Après le retour du buffet, le Secrétaire Général du MEPDD, Président et la RRA/P, co-président de la réunion du Comité de Pilotage, sollicités pour honorer d'autres agenda, ont délégué leur pouvoir respectivement à M. Olivier KIMTO SEID, Directeur Général de l'Environnement et M. Emmanuel KERYANG, Analyste programme pour poursuivre la direction de la réunion.

Ensuite, l'un des rapporteurs a été sollicité pour procéder à la lecture des recommandations. Les membres du comité ont apporté séance tenante, des amendements et ont validé les recommandations formulées et celles de la précédente assise qui sont reconduites et consignées dans le tableau ci-après.

Le Directeur Général de l'Environnement, tout en recommandant à l'UGP de se mettre ensemble avec les rapporteurs afin d'intégrer tous les amendements pertinents des membres du Copil a procédé à la clôture de la première réunion du comité de pilotage de l'année 2022 à 15h 30 min.

### **IV. RECOMMANDATIONS**

A l'issue des fructueux échanges et discussions, les membres du comité de pilotage ont adopté et validé pour le projet PNA : le rapport bilan des activités réalisées en 2021 et les PTBA 2022 qui leur ont été soumis. En ce qui concerne le suivi de recommandations, les recommandations qui n'ont pas été réalisées en totalité en 2021 (voir annexe 3), elles sont reconduites pour l'année 2022 en plus de nouvelles recommandations formulées pendant cette réunion.



**Tableau 1 : Recommandations 2022**

N°	Nouvelles recommandations 2022	Responsables
1	Veiller au respect des délais indiqués pour la tenue d'au moins deux (02) réunions des comités du pilotage dans l'année. Aussi, les différents documents programmatiques des projets pourraient être validés en fin d'année précédente pour mieux appréhender l'exercice de l'année suivante et ainsi, éviter les retards.	MEPDD et PNUD
2	Continuer à dérouler le plan d'action genre du PNA pour une prise en compte effective de la dimension genre dans la mise en œuvre du projet	PNA
3	Confier le lead de la stratégie de sortie du projet aux services de météorologie et d'hydrologie du pays pour garantir la durabilité des équipements hydrométéorologiques acquis et installés ainsi que des investissements en assurant leur sécurité, leur suivi et leur maintenance : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requérir l'engagement des Ministres de tutelle ;</li> <li>• Assurer la mobilisation des ressources de l'Etat à travers ses budgets annuels pour le fonctionnement du réseau.</li> </ul>	MHUR, MACMN
4	Adresser au FEM une requête de prorogation du projet PNA de 12 mois pour finaliser les activités.	MEPDD, DLCC
5	Veiller à ce que le quota à la fonction publique, du Ministère en charge de l'aviation civile et de la météorologie ainsi que du Ministère en charge de l'Hydraulique, tiennent compte de l'intégration des jeunes filles et garçons dans les domaines spécifiques pour garantir la durabilité des acquis du projet PNA.	ANAM, DRE
6	Veiller à ce qu'au moins un des 4 radars soit opérationnel en 2022 sans oublier des stratégies permettant de réaliser l'installation des radars des 03 autres sites retenus.	PNA, ANAM et DLCC
7	Prendre des dispositions pour corriger les manquements constatés sur les équipements acquis au profit de la DRE	PNA
8	Veiller à ce qu'à partir de 2022 les LoA soient établies pour la durée de vie des nouveaux et anciens projets.	PNA, DLCC et PNUD
9	Maintenir la synergie d'action avec l'ANAM et la DRE pour les interventions du projet CREWS	PNA, DLCC, DRE et ANAM
10	Mettre en place et rendre opérationnel le comité technique scientifique (CTS)	MEPDD
11	Acter la clôture opérationnelle et financière des projets de Réhabilitation et Restauration des Ecosystème du Lac Tchad et de Renforcement des Capacités du Ministère en charge de l'Environnement et procéder au transfert des Assets.	MEPDD



**Le président du comité de pilotage des projets**

**Signatures**

Fait à N'Djamena, le 18 Janvier 2022




**Le vice-président du comité de pilotage des projets**

Les participants



## V. ANNEXES

### 1. Annexe 1 : Photothèques

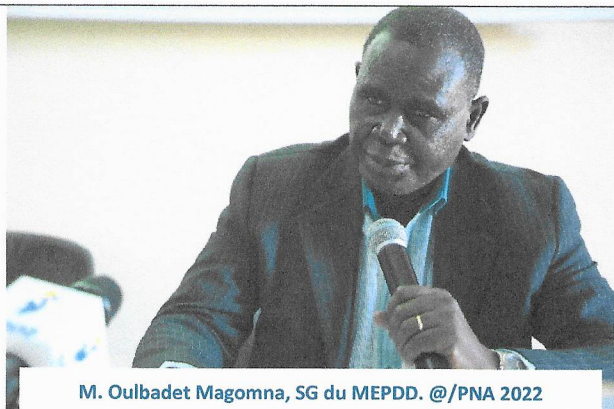

M. Oulbadet Magomna, SG du MEPDD. @/PNA 2022



Mme Binta Sanneh, RRAP PNUD. @/PNA 2022



Vue des participants. @/PNA 2022



Vue des participants. @/PNA 2022



Vue des participants. @/PNA 2022



Lecture des recommandations. @/PNA 2022



Photo de famille. @/PNA 2022

5/6

## 2. Annexe 2 : Liste des participants

546



### **3. Annexe 3 : TDRs et agenda**

#### **TERMES DE REFERENCE**

**Première réunion du Comité de Pilotage de l'année 2022 du Projet du Plan National d'Adaptation aux Changements Climatiques du Ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable.**

#### **CONTEXTE**

Le Projet du Plan National d'Adaptation au changement est destiné à jouer un rôle essentiel dans la réduction de la vulnérabilité et la mise en œuvre de la capacité d'adaptation, en intégrant l'adaptation dans tous les plans de développement nationaux et sectoriels. Ils pourraient soutenir le renforcement des capacités institutionnelles et techniques, pour consolider l'ensemble des activités d'adaptation et s'engager dans une approche d'adaptation stratégique, cohérente, tout en améliorant la coordination, le suivi et l'évaluation des initiatives de développement.

Il est donc tout important et urgent, de tenir la deuxième réunion du comité de pilotage de l'an 2021 afin d'engager la poursuite de la mise en œuvre du projet PNA et de définir, ensemble avec les membres du Comité de Pilotage, un plan d'action et d'identifier les principaux défis à surmonter pour atteindre les résultats attendus pour l'année 2022.

Enfin, il est également pertinent de discuter, ensemble avec les membres du Comité de Pilotage, les prochaines étapes et perspectives après deux années de mise en œuvre.

#### **OBJECTIFS**

L'objectif global de la deuxième réunion du Comité de Pilotage est d'examiner, de manière consensuelle, le plan de travail et budget (PTA 2022), les résultats 2021 du Projet PNA et de développer une vision commune sur les contours des prochaines étapes.

#### **RESULTATS ATTENDUS**

Les principaux résultats attendus à l'issue de cette réunion du Comité de Pilotage sont les suivants :

1. Un examen du suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière Réunion du Comité de Pilotage de février 2021 est fait et validé ;
2. Les rapports bilan de mise en œuvre des PTA 2021 sont examinés et adoptés ;
3. Le PTA 2022 du projet PNA est examiné et validé par le Comité ;
4. Un accord est trouvé en vue de la prorogation du projet

#### **PARTICIPATION**

Le comité de pilotage du PNA est composé de : 30 membres.

#### **LIEU ET DATE**

La réunion du comité de pilotage se déroulera en une (1) seule journée de 09H 30 à 12H 00 le 21 décembre 2021 à l'Hôtel Radisson Blu.

*SeV*



## AGENDA PROVISOIRE


**Première réunion du Comité de Pilotage 2022 du Projet du Plan National d'Adaptation aux Changements Climatiques du Ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable.**

**N'Djamena, le 18 janvier 2022**












HORAIRES	ACTIVITES	RESPONSABLES
09 H 30 – 10H 00	Mots de bienvenue du Président du Comité de Pilotage et du Représentant résident du PNUD	Ministre de EPDD
	Présentation des participants	Représentant résident PNUD
	Présentation et adoption de l'Agenda	
10 H 00 -10 H 30	Revue et suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière Réunion du Comité de Pilotage du 11 février 2021 ; Examen et adoption des rapports bilans des PTA 2021.	Coordonnateur du PNA
10 H 30 – 11 H 45	Examen et validation du projet de PTBA 2022 du Projet PNA Examen des arguments pour la demande de prorogation du projet Echanges et Discussions	UGP PNA Participants
11 H 45 -11 H 55	Validation des recommandations du Copil	Participants
11 H 55 – 12 H 00	Mot de clôture du Président du Comité de Pilotage	Ministre de EPDD

S. P.





## LISTE DE PRESENCE

Date	18 Janvier 2022	Modérateur :	Rapporteur :			
Première réunion du Comité de Pilotage de l'année 2022 du Projet du Plan National d'Adaptation aux Changements Climatiques du Ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable						
Radisson Blu, Mardi 18 Janvier 2022						
N°	Noms et prénoms	Sexe	Fonction	Institution	Tél /Email	Signature
1	SOUNKILA DOMAR GADJI	M	DCC / PF FEN	NGPDD	66989196 / soumar.gadji@yahoo.fr	
2	Hamid Abekkar Souleyman	M	ANAM / DGA	ANAM	62000047 / chogard.moukoko@yahoo.fr	
3	MAHAMAT SALEH DOUGA	M	SG / MACMN	Ministère Environnement	66372890 / dougama.mamat.saleh@gmail.com	
4	DELRINDGAM BETOUDJI	M	RATGA Suivi évaluation	PNUD	66447300 / delrindgam.betoudji@undp.org	
5	EMMANUEL KERVANJY	M	CP / PNUD	PNUD	66277326 / emmanuel.kervanjy@undp.org	
6	MORATE L. YOUSSEUF	M	DGA / IRED	IRED	63226955 / morate.l.yousseuf@gmail.com	
7	NASSOUR SALEH TERDA	M	DRE / MHUR	MHUR	66707097	
8	DJERAREOU GOLNABEI M	M	DPSA / A / MDA	MDA	62382948	
9	JUSTIN ANATRAED ASTAINE	M	DP / CNCPRT	CNCPRT	66371323 / astainamathias@yahoo.fr	
10	DENODJI Robenine	F	SG / CELIAF	CELIAT	66296571 / denodji@gmail.com	
11	BIANPAMBE PATALLET	M	Expert Hydro Météo	PNA / PNUD	bianpambe.patallet@undp.org	
12	DOCTEUR KDISSOUHARI	M	Expert R C	PNA / PNUD	66211698 / docteur.kdissouhary@yahoo.fr	
13	MBAÏRAMADJI GOLLAR M	M	Journaliste	L'Observateur	66464573	



14	Ngardobé Roy Moussa	M	Journaliste	MSGmeine hebdo	66805369/96250518	<del>66231231</del>
15	KANTO EJC	M	Journaliste	RNT	66231231	<del>66231231</del>
16	Althas KHARIS	M	Journaliste	RNT	66231231	<del>66231231</del>
17	Bouina Tchoufamba	M	Journaliste	RNT	66231231	<del>66231231</del>
18	BATHE BATH GONDJA	F	Technicienne	RNT	66231231	<del>66231231</del>
19	ESSA AZARAK	M	Journaliste	TUT	66231231	<del>66231231</del>
20	MBAISSSEM JONAS	M	Journaliste	FM pre-en-cul	66231231	<del>66231231</del>
21	YASSIA NHTAHAT	M	Journaliste	TUT	66231231	<del>66231231</del>
22	Barak Kassoué	M	Journaliste	Vision fm	66231231	<del>66231231</del>
23	AHMAI NGARASTA	M	Journaliste	TVI	66231231	<del>66231231</del>
24	Boulga DAVIO	M	Journaliste	JTA FM	66231231	<del>66231231</del>
25	Enlène Adjinké Berdoug	F	Journaliste	Journal de progrès	66231231	<del>66231231</del>
26	GABRIE DABA PARDON	M	Journaliste	Oxygène	66231231	<del>66231231</del>
27	Badoun Oumar	M	Journaliste	Tchadinfos	66231231	<del>66231231</del>
28	Dzibika Kankou	M	Journaliste	Le Sahel	66231231	<del>66231231</del>
29	Souka Samouh	F	Journaliste	PNUD	66231231	<del>66231231</del>
30	SALEH MAHAMAT ALI	M	Journaliste	MEPDEL	66231231	<del>66231231</del>
31	Ahmed M. HAGGAR	M	Journaliste	ANGEL	66231231	<del>66231231</del>
32	KIMTO OLIVIER JEID	M	Journaliste	MEPDD	66231231	<del>66231231</del>
33	Eli YANYARA D.	M	Journaliste	PNUD	66231231	<del>66231231</del>
34	ROYOUMBAYE A. PATRICIA	F	Journaliste	PNUD	66231231	<del>66231231</del>
35	DE KHALID A. HOGA	F	Journaliste	PNUD	66231231	<del>66231231</del>
36	RONEL PELAGIE NOÏ PARD	F	Journaliste	PNUD	66231231	<del>66231231</del>
37	OUALBDET MAGOMNA	M	Journaliste	MEPDD	66231231	<del>66231231</del>
38	NBOULBAKAT PAUL	M	Journaliste	MEPDD	66231231	<del>66231231</del>
39	BERAL OUAÏE	M	Journaliste	MEPDD	66231231	<del>66231231</del>



40	IKOUMA-KOSSI SATURUNIN	M	Coordinator - PNA	PNUD	66265761 s.furuih.kawano@undp.org
41	MADJIBAYE DJIMDOURAL	M	Chaufeur	PNUD	66257181 madjibaye.djimdoual@undp.org
42	Châibou Fssa Rawaou	M	Expert H&E PNA	PNUD	66462086 ramadoun@undp.org
43					
44					
45					

✓
