

Informe Anual del Proyecto

Contribuyendo a la territorialización de la Agenda 2030 en tiempos de COVID-19: una alianza estratégica AACID-PNUD (No. 00128155)

CONTENIDO

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO	1
2. RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS AVANCES EN EL PERÍODO ANUAL	2
3. AVANCE EN EL LOGRO DEL EFECTO Y LOS PRODUCTOS.....	4
4. REGISTRO DE RIESGOS.....	6
5. REGISTRO DE PROBLEMAS	6
6. LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA	7
7. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO.....	8
8. INDICADORES CORPORATIVOS DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN.....	8
9. ANEXOS	10

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Número y título del Proyecto:	Contribuyendo a la territorialización de la Agenda 2030 en tiempos de COVID-19: una alianza estratégica AACID-PNUD (No. 00128155)
Fecha de firma del Proyecto:	26/06/2020
Fecha de inicio y término del Proyecto:	19/06/2020 a 31/12/2021
Fecha de entrega del informe al PNUD:	15/01/2022
Período cubierto por el informe:	01/01/2021 a 31/12/2021
Autor:	Magdalena Martínez del Cerro
Efecto/s del MANUD:	Para 2022, se fortalecen las instituciones públicas para garantizar el desarrollo sostenible, la participación, la protección y el goce efectivo de los derechos humanos, sin discriminación, con énfasis en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad y migrantes.
Efectos Esperados del Plan de Acción del Programa del País (CPAP):	Para 2022, las instituciones públicas están fortalecidas y pueden garantizar el desarrollo sostenible, la participación, la protección y el disfrute efectivo de los derechos humanos sin discriminación

	y poniendo el acento en los niños, los adolescentes, los jóvenes, las personas con discapacidad y los migrantes.
Número y descripción de(los) Resultado(s)/Producto(s) del Proyecto:	Promovida una estrategia de territorialización de la Agenda 2030 que responda a las necesidades surgidas a causa de la pandemia COVID-19 en República Dominicana. (Output n. 00122186)
Asociado en la Implementación:	No aplica
Partes Responsables:	No aplica
Presupuesto del período cubierto por el informe en USD\$	161,431 USD
Ejecución presupuestaria del período cubierto por el informe en USD\$	135,720.02 USD
Breve descripción del Proyecto	
<p>El propósito de este proyecto es diseñar e impulsar una estrategia de territorialización de la Agenda 2030 que responda a las necesidades surgidas a causa de la pandemia COVID-19 en República Dominicana. Se espera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyar la respuesta y recuperación socioeconómica de hogares y sectores frente a los impactos del COVID-19 en los territorios focalizados • Impulsar las estructuras de gobernanza local multiactor y multinivel implementando plataformas territoriales para la localización de ODS • Poner en marcha de una estrategia de sensibilización y capacitación adaptada contexto COVID-19 en la subregión Suroeste 	

2. RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS AVANCES EN EL PERÍODO ANUAL

Durante el año 2021 se han construido los cimientos para promover el desarrollo sostenible en los territorios focalizados avanzando en el diseño de los modelos locales de desarrollo, fortaleciendo las estructuras de gobernanza multiactor e integrando la recuperación al COVID19 a partir de alianzas con organizaciones de la sociedad civil y representantes de la academia.

La planificación del desarrollo sostenible a nivel local (Planes Municipales de Desarrollo, PMD) se ha realizado a partir de un análisis de brechas ODS (lectura ODS) que ha permitido visibilizar elementos no convencionales en estos ejercicios, como la preservación del medio ambiente, el respeto y la promoción de los derechos de todas las personas, el fortalecimiento de las instituciones, entre otros. Al cierre del año se contaba con un plan (PMD) finalizado sólo pendiente de la diagramación final (municipio de Polo), otro en fase de cierre (municipio de Vicente Noble) y un tercero en etapa diagnóstica (municipio de Barahona). Como resultado de este proceso se cuenta con una propuesta de **aportes metodológicos para la transversalización de la Agenda 2030 en la planificación local** y se han realizado conversatorios y encuentros para compartirla.

Estos ejercicios de planificación se han solapado con el **inicio de su ejecución**, aprovechando oportunidades de colaboración y aliados estratégicos en el territorio. A modo de ejemplo, PNUD, en el marco de este proyecto, está contribuyendo al fortalecimiento de los Consejos Municipales como plataformas ODS, iniciativa identificada y priorizada en el PMD de Polo.

Se ha avanzado en el diseño participativo de una **Estrategia de Comunicación** para las plataformas ODS o Consejos Municipales de Desarrollo que permita difundir los planes a 2030, aumentar la conciencia de la población sobre su realidad y los desafíos de desarrollo, involucrar a actores y aliados en las acciones, fomentar cambios de comportamiento positivos y rendir cuentas a la población. Además, como oficina se han implementado acciones de

comunicación en diversos medios (prensa, web y redes sociales) para difundir y sensibilizar acerca de la importancia de territorializar las políticas públicas para un efectivo desarrollo sostenible. Esto ha permitido adicionalmente visibilizar la contribución de la AACID y PNUD a la localización de los ODS. (Ver **Anexo 3**).

Se han realizado **capacitaciones** en materia de localización de ODS en diferente formato y a diverso público, entre ellos; (i) a los Consejos Municipales de Desarrollo durante las sesiones de formulación de los planes, (ii) a las autoridades locales y técnicos de las municipalidades de la Región Enriquillo en el marco del Diplomado en Planificación Territorial, Cambio Climático y Localización de ODS, organizado por ASOMURE y (iii) al personal de FEDOMU en el taller sobre la Agenda 2030.

Además, se han realizado capacitaciones en temas específicos y de particular relevancia para la localización de los ODS en estos territorios como son; i) la gestión de riesgo ante desastre y ii) los derechos de las personas con discapacidad. Estos cursos se han ejecutado con la Defensa Civil y la Fundación ProBien.

Se ha avanzado junto a MEPyD en la conceptualización de un **sistema de apoyo a la gestión municipal**, y en 2022 se estarán ensayando dos modelos (i) el SIGOBITO con apoyo del equipo PNUD-SIGOB en Barahona, y (ii) un modelo a desarrollar de forma piloto en 9 municipios del país en coordinación con MEPyD y el Ministerio de Medio Ambiente. Ambas implementaciones contarán con recursos apalancados por PNUD. Este segundo modelo se está concibiendo para integrar un tablero de seguimiento a los ODS a nivel local. Ya se cuenta con una nota conceptual y una versión preliminar de los términos de referencia.

Para la **recuperación socioeconómica ante el COVID19** en los territorios priorizados se diseñaron de forma participativa 2 planes de recuperación a partir de la información disponible sobre el impacto del COVID19 generada por el proyecto (encuesta SEIA-Red Actúa a hogares pobres, y encuesta a MIPYMES de Barahona) y el levantamiento de información adicional en grupos focales. Estos planes contemplan intervenciones para reducir la afectación en los ODS directamente más afectados por la pandemia (ODS 2, 3, 4, 5, 8, 15 y 16).

De estas se han priorizado **6 acciones** en los tres municipios dirigidas a mujeres, personas jóvenes y colectivos desproporcionalmente afectados por la pandemia, a financiar con el **fondo para la respuesta y recuperación socioeconómica local**. De estas acciones que se ejecutando con ONGs y con la academia, 1 ya finalizó, 3 se encuentran en fase de implementación y 2 están en proceso de arranque. Este fondo está recibiendo recursos de otras fuentes identificadas por PNUD para ampliar el alcance de la recuperación. Por el momento se ha apoyado la recuperación de 100 personas a través de capacitaciones y 30 personas y/o MiPymes con asesorías. Se espera apoyar la recuperación de al menos 130 personas más como resultado directo de este proyecto y 175 sumando los recursos apalancados.

Todas estas acciones han contribuido a la **consolidación de los Consejos Municipales de Desarrollo**, principalmente de Vicente Noble y Polo (o plataformas ODS), quienes han protagonizado el análisis y la toma de decisiones. Durante este año estas estructuras de gobernanza multiactor para el avance hacia la Agenda 2030 en el ámbito local, han construido una visión común de desarrollo, y han asumido roles de liderazgo para impulsar acciones concretas en beneficio de su comunidad, fortaleciendo así su compromiso como representantes de la población.

A nivel provincial se ha participado en reuniones del Consejo Provincial de Desarrollo, compartiendo datos sobre la afectación del COVID19 a los hogares por ODS y capacitando en ámbitos solicitados por ellos. A finales de año se recibió la solicitud de apoyarles en la formulación del Plan Estratégico Provincial con la transversalización de la Agenda 2030 durante el ejercicio (solicitud en estudio).

A nivel nacional se ha mantenido un diálogo permanente con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para consensuar enfoques, avanzar hacia la articulación entre las demandas territoriales y los planes de inversión pública e involucrar en el seguimiento al ente rector en el país.

Las principales **colaboraciones y sinergias** durante 2021 han sido:

- Acuerdo con ASOMURE para la sensibilización de actores y el fortalecimiento de las capacidades de planificación del Ayuntamiento de Barahona
- Acuerdos con las ONGs Cáritas, Cesal y MUDE para la implementación de acciones de recuperación
- Acuerdo con la universidad UCATEBA para el estudio de la afectación del COVID19 a Mipymes y la implementación del programa Ponte En Marcha para la recuperación de las mismas.
- Colaboración con el programa Coopera de Banreservas para el apoyo conjunto a las mujeres artesanas de Vicente Noble
- Articulación con UNICEF y el Sistema Nacional de Salud para la erradicación de la desnutrición infantil aguda en los territorios del proyecto
- Colaboración en fase de exploración con FEDOMU, principalmente para transversalizar la Agenda 2030 en instrumentos y para implementar programa de capacitación municipal.
- Incidencia con las AFP del Sistema de Naciones Unidas para la extensión de la Estrategia de Localización de ODS de PNUD al sistema ONU

El equipo del proyecto se consolidó durante los primeros meses del año con la contratación de una persona con dedicación plena a la coordinación, otra de apoyo en el territorio y una a cargo de la gestión del conocimiento, adicionales al equipo de especialistas de PNUD con participación en el proyecto. A finales de año se realizó una misión de la Directora General de la AACID (donante del proyecto) para monitorear los avances e identificar nuevas oportunidades de colaboración.

Las acciones continuarán en el marco de un nuevo documento de proyecto que se está diseñando para cubrir la extensión en tiempo autorizada por el donante. Este nuevo documento cubrirá las actividades que se ejecutarán hasta septiembre de 2022 e incorporará modificaciones en relación a los indicadores de producto y a ciertas actividades que no serán alcanzables por factores externos a PNUD.

3. AVANCE EN EL LOGRO DE LOS PRODUCTOS

Producto 1:	Promovida una estrategia de territorialización de la Agenda 2030 que responda a las necesidades surgidas a causa de la pandemia COVID-19 en República Dominicana.
Indicadores:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis de brechas realizado 2. Al menos un (1) plan municipal de desarrollo elaborado 3. Al menos un (1) plan de desarrollo implementado 4. Al menos un (1) módulo de capacitación incorporado en los planes municipales
Línea de base:	<ul style="list-style-type: none"> - Desconocimiento del impacto en las poblaciones afectadas por COVID-19 - Desconocimiento de las brechas ODS - Instrumentos para la planificación territorial y del desarrollo no contemplan la Agenda 2030
Meta(s) del año:	Cumplimiento de todos los indicadores al 31 de diciembre 2021.

Avance en el logro de la meta anual del Producto 1 en el año: 80%.

De los 4 indicadores establecidos en el proyecto, 3 se han cumplido (indicadores 1, 2 y 4). El indicador 3 relacionado con la implementación de, al menos, un (1) plan de desarrollo, no es alcanzable en su totalidad ya que excede el ciclo del proyecto y su implementación depende de múltiples actores externos a las alcaldías.

En los tres municipios del proyecto se ha avanzado considerablemente en la planificación del desarrollo sostenible desde una lectura de ODS. El municipio de Polo ya cuenta con una versión final de su Plan Municipal de Desarrollo que, durante la elaboración de este informe se encontraba en fase de diseño y diagramación para su publicación final. Los otros dos municipios avanzan a ritmos diferentes, como resultado de los procesos locales de concertación y participación social.

Se ha iniciado también la implementación de los planes para la que es necesario el fortalecimiento de las capacidades y la generación de sinergias con otros actores. Por este motivo todos los planes contemplan acciones de capacitación; a modo de ejemplo el municipio de Polo ha identificado 8 ámbitos donde quiere fortalecer sus capacidades; gestión de riesgos, turismo rural sostenible, gestión de los recursos naturales, cambio climático, producción sostenible con los ecosistemas de montaña, veeduría social, acceso a la información y estadística.

En cuanto a la implementación, un 8% de las acciones contempladas en el plan de este municipio están siendo apoyadas por PNUD, concretamente lo relacionado con el fortalecimiento del Consejo Municipal de Desarrollo / plataforma multiactor, los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta, la promoción de su Estrategia de Desarrollo Sostenible, y la educación en materia de género.

<p>Evidencias</p>	<p>Levantamiento de información sobre el impacto del COVID19 en hogares: https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fview%3Fr%3DeyJrIjoiNWmODRIMWQOtOGRhMC00NGQ2LWFhY2MtOTBmZjRlMzVkNmFjliwidCI6ImQwZmI2ZjY5LWVjNzAtNGI3NS05NGQ4LWZhMWJhYzI4OTQ2YSIsImMiOiJl9%26pageName%3DReportSectionfe4382b50c030b17b179&data=04%7C01%7Cedwin.gomez%40undp.org%7Cdde3a758b1f8459da2d408d937e5d1c7%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637602282463034493%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWljojMC4wLjAwMDAilCjQljojV2luMzliLjBtIl6k1haWwiLCJXVCi6Mn0%3D%7C1000&sdata=UqcLrWJ%2FNjTgH4SfafWzE%2Fn7W2e15ic4M6e0l0ZLy%3D&reserved=0</p> <p>Levantamiento de información sobre el impacto del COVID19 en MiPymes de Barahona: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTM4NTI0ZDktMGFhYy00OWEyLWFiZGYtNzVjNTJkNGNiMWE1IiwidCI6ImU1YzhjN2QyLTk0YjktNGI1OS1iMmM3LWVjNWUwMDBjMjE4ZiIsImMiOiJl9</p> <p>Plan Municipal de Desarrollo de Polo elaborado a partir de análisis de brechas ODS subidos al Sistema SISMAP y resolución de aprobación: https://www.sismap.gob.do/Municipal/uploads/evidencias/637709400966420635-2.02_9-17_PMD-POLO.pdf https://www.sismap.gob.do/Municipal/uploads/evidencias/637709400966420635-2.02_10-17_-RESOLUCIN-APROBACIN--PMD-2021-2024_19OCT2021.pdf</p> <p>Ejemplo de difusión en prensa sobre la integración de los ODS en los Planes Municipales de Desarrollo (más enlaces Anexo 3): https://www.elcaribe.com.do/destacado/municipios-integran-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/</p> <p>Acciones de capacitación/sensibilización: https://www.fedomu.org/gobierno-fedomu-y-la-onu-socializan-sobre-la-importancia-de-los-ods-en-los-gobiernos-locales/ https://www.elfarodelsur.com/2021/09/asomure-inicio-un-diplomado-en.html</p>
--------------------------	---

4. REGISTRO DE RIESGOS

Tipo de riesgo	Descripción	Valoración actual (Alto/Medio/Bajo)	Medidas de Mitigación
*Seguridad	El COVID 19 y nuevos brotes de contagio	Alto	La extensión en tiempo del proyecto permitirá reprogramar actividades en el caso de nuevos brotes del COVID19, como la actual 5ª ola, que dificulte el desarrollo de actividades
*Político	Actores del Consejo / plataforma ODS de Barahona, incluida la Alcaldía, menos disponibles y comprometidos con la Agenda 2030	Media	Se firmó un acuerdo de subvención con ASOMURE para apoyar la sensibilización de actores y el fortalecimiento de las capacidades. También se están ejecutando acciones directamente con las organizaciones de la sociedad civil, la academia e iglesia
*Operacional	Transición gubernamental a nivel central-local	Media	PNUD ha desarrollado un proceso de diálogo y coordinación técnica, a fin de contribuir a conectar los planes y agendas de trabajo vinculadas a la gestión territorial local
*Operacional	Débil capacidad de actores en el territorio (ONGs, ASOMURE) para cumplir con los estándares procedimentales de PNUD	Media	Se cuenta con un técnico de apoyo en campo para el acompañamiento a los actores en la elaboración de informes y otros procesos, con el fin de fortalecer las capacidades de estos y evitar retrasos en la ejecución.

* Financiero, Organizacional, Estratégico, Político, Operacional, Ambiental, Seguridad, Otro.

5. REGISTRO DE PROBLEMAS

Problema / Situación	Fecha de identificación	Medidas de manejo / posibles soluciones	Respuesta de la Gerencia
Retrasos en la ejecución del proyecto que imposibilitan cumplir con los tiempos estipulados, debido a: 1. el tiempo que ha tomado el proceso de recambio institucional a las instituciones a nivel central y local producto de las elecciones de 2020 y; 2. La	Julio 2021	Solicitud a AACID de una extensión del periodo de ejecución del proyecto de 18 meses	Medida aprobada por la Gerencia y tramitada a AACID a través de PNUD Bruselas. Respuesta verbal positiva.

persistencia de los impactos de COVID, que afectaron la posibilidad de estar en el terreno como inicialmente planificado.			
---	--	--	--

6. LECCIONES APRENDIDAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Durante este año de implementación se identifican las siguientes lecciones aprendidas y oportunidades de mejora:

- La formulación de cualquier proceso de planificación que integre los ODS debe ser precedido por una formación integral en la materia, que garantice la apropiación de los conceptos y enfoques por los actores llamados a diseñar el desarrollo. Arrancar un proceso de formulación de PMD que capacite en paralelo dificulta el desarrollo y la fluidez del ejercicio, y puede poner en riesgo la viabilidad de la implementación de los planes.
- La Agenda 2030 llama a asumir responsabilidades en su implementación a actores diversos a nivel internacional, nacional y subnacional. En este sentido, las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil en el contexto de Barahona se han detectado débiles. Se hace necesario contemplar un acompañamiento integral para el fortalecimiento de sus capacidades, para, de esta manera, ejercer su rol de pleno y no retrasar las acciones pactadas en el marco del proyecto. Se propone iniciar con una capacitación práctica sobre los procesos administrativos necesarios para cumplir un acuerdo con PNUD.
- La rotación del personal técnico de los ayuntamientos es muy elevada, debido a las precarias condiciones laborales que enfrentan fruto del escaso presupuesto disponible. Estas personas asumen funciones por su vocación de servicio e interés de aportar al bien común, pero sus necesidades personales y familiares a menudo se imponen y abandonan sus puestos de trabajo. Para mejorar sus condiciones laborales y por ende aumentar la calidad de la gestión municipal se debe incidir para la incorporación de estos puestos en la carrera administrativa, entre otras posibles acciones.
- Además, reconociendo que el personal que enfrenta tareas técnicas en los ayuntamientos no siempre tiene la formación académica o experiencia necesaria acorde a sus funciones, se debe establecer un programa de capacitación permanente que permita mejorar la operación de los municipios para el avance hacia los ODS.
- Para implementar la Estrategia de Localización de los ODS propuesta por PNUD que se está llevando a cabo con este proyecto es necesario el involucramiento y los aportes de múltiples especialistas y áreas de la organización. Para que esto ocurra de una manera oportuna, es necesario establecer mecanismos de coordinación y espacios de trabajo formales y periódicos con todo el personal clave vinculado a los procesos de localización (unidad de desarrollo humano, sector privado, género, inclusión, comunicación y gobernabilidad) reconociendo su contribución como parte de sus responsabilidades principales. Si bien esto se ha dado en términos prácticos es recomendable una instrucción al respecto de la gerencia.
- Durante este año de ejecución las acciones han estado centradas en fortalecer la gobernanza local, empoderar a los actores y definir el modelo de desarrollo de cada territorio. Para que efectivamente se escale la iniciativa y se realicen contribuciones contundentes a la Agenda 2030 desde lo local que contribuyan al cierre de las brechas de desarrollo, es necesario incidir más en el nivel central. Esto será una prioridad del año 2022.

7. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

PRODUCTO (Project ID del ATLAS: 00128155)	Monto Total Aprobado para el año	Gasto en el año del informe	% de ejecución
1. Promovida una estrategia de territorialización de la Agenda 2030 que responda a las necesidades surgidas a causa de la pandemia COVID-19 en República Dominicana.	249,736.62 USD	135,720.02 USD	54.35%
Total Proyecto (del año)	249,736.62 USD	135,720.02 USD	54.35%

La extensión del proyecto fue aprobada por el donante en la segunda mitad de 2021 pero el presupuesto no se modificó en ATLAS. Por este motivo la ejecución presupuestaria aparece limitada, no obstante, responde a la programación realizada por el equipo del proyecto. Más información en el Anexo 2. Informe financiero.

8. INDICADORES CORPORATIVOS DE DESARROLLO Y COOPERACIÓN

Área e Indicadores	Valoración	Explicación de la Valoración
Género: En qué medida se manifiestan los avances realizados en las relaciones de género dentro del proyecto? (indicadores desagregados por sexo, necesidades particulares de las mujeres, conciliación laboral, etc.)	<input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> De manera deficiente <input checked="" type="checkbox"/> Medianamente <input type="checkbox"/> Significativamente	<p>Se han generado evidencias sobre el impacto desproporcionado del COVID19 a las mujeres. En este sentido la recuperación prioriza la selección de mujeres en todas las intervenciones e implementa una acción dirigida exclusivamente a ellas para su empoderamiento económico, con una meta de 50 mujeres a apoyar con capital semilla y 100 a capacitar y asesorar. También se ha previsto en 2022 la capacitación a los Consejos Municipales de Desarrollo y a mujeres líderes multiplicadoras en materia de género y prevención de violencia.</p> <p>En cuanto a la participación desagregada por sexo, de forma general la participación de las mujeres en los Consejos Municipales de Desarrollo es un 33% frente a un 67% de hombres, siendo en Polo un 35%, en Vicente Noble un 33% y en Barahona un 29%.</p>
Medioambiente: En qué medida se están tomando precauciones ambientales (protección y conservación del medioambiente, adquisición de	<input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> De manera deficiente <input type="checkbox"/> Medianamente <input checked="" type="checkbox"/> Significativamente	<p>La transversalización de la Agenda 2030 en los procesos de desarrollo implica integrar la sostenibilidad ambiental en la planificación del desarrollo, promoviendo acciones de protección y conservación del medio</p>

<p>materiales y equipos eficientes y ambientalmente certificados, etc.) en el marco del proyecto?</p>		<p>ambiente terrestre y marino. Así se constata en los planes ya avanzados a ese nivel. Por el momento no se han adquirido equipos.</p>
<p>Medios de vida: En qué medida se está contribuyendo con las capacidades de auto subsistencia de los beneficiarios en el marco del proyecto? Se apoyan iniciativas de actividades generadoras de ingreso? Se apoya la sostenibilidad de las actividades económicas de los beneficiarios?</p>	<p><input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> De manera deficiente <input type="checkbox"/> Medianamente <input checked="" type="checkbox"/> Significativamente</p>	<p>El proyecto contempla una componente para la recuperación socioeconómica de la población, reactivando sus medios de vida de forma sostenible. Para ello se han acordado 5 iniciativas (más una para el apoyo a la recuperación socioemocional de personas jóvenes). Se está promoviendo la organización y asociatividad (colectivo de artesanos/as y actividades ecoturísticas), el acompañamiento y la generación de capacidades de negocios para garantizar la sostenibilidad de las iniciativas, integrando variables como el reparto de tareas en el caso de emprendimientos de mujeres.</p>
<p>Resiliencia social: De qué manera el proyecto está apoyando las capacidades de los beneficiarios para hacer frente a riesgos a desastres, situaciones de crisis y shocks externos? Existen planes de respuesta a desastres? Se está brindando apoyo para incentivar el ahorro a nivel doméstico y/o asociativo?</p>	<p><input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> De manera deficiente <input checked="" type="checkbox"/> Medianamente <input type="checkbox"/> Significativamente</p>	<p>Se ha desarrollado una capacitación junto a la Defensa Civil para el fortalecimiento de los comités de prevención, mitigación y respuesta que les brindó herramientas para elaborar sus planes de respuesta y contingencia. Se ha generado una sinergia en campo para que la ONG Cesal, aliada de PNUD en el marco de la recuperación del COVID19, continúe fortaleciendo esta iniciativa.</p>
<p>Derechos: De qué manera se está contribuyendo a garantizar los derechos de los grupos vulnerabilizados y minoritarios, (PVS, poblaciones GLBT, personas con discapacidad, niños, ancianos, etc.) a través del proyecto?</p>	<p><input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> De manera deficiente <input checked="" type="checkbox"/> Medianamente <input type="checkbox"/> Significativamente</p>	<p>La transversalización de la Agenda 2030 en los procesos de desarrollo implica integrar el enfoque de derechos en la planificación del desarrollo, desde un análisis objetivo de la situación actual considerando todos los grupos de personas para no dejar a nadie atrás. Además, de forma particular en los municipios de Polo y Barahona se han realizado acciones de sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad en coordinación con otro proyecto de PNUD. No obstante, se ha marcado como “medianamente” porque el análisis de ciertos grupos puede ser reforzado (ej. Población migrante).</p>
<p>Sinergias a nivel nacional: De qué manera se están llevando a cabo actividades conjuntas de colaboración o coordinación con otras entidades (ONG’s, proyectos,</p>	<p><input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> De manera deficiente <input type="checkbox"/> Medianamente <input checked="" type="checkbox"/> Significativamente</p>	<p>Se han firmado acuerdos de subvención con las ONGs Cesal, Caritas y MUDE, con la universidad UCATEBA y con ASOMURE. Se mantiene una conversación abierta permanente con MEPyD y se están explorando oportunidades de colaboración</p>

<p>instituciones, entidades) en el marco del proyecto?</p>		<p>con FEDOMU y la JAD (proyecto Prorural). Se ha solicitado reunión con JICA. Dentro del sistema ONU se han coordinado acciones con UNICEF y el Servicio Nacional de Salud, y se espera extender esta colaboración con otras AFP para la implementación de los planes de desarrollo. Dentro de PNUD se asesora al proyecto de Paisajes Productivos para la localización de ODS en los territorios del proyecto GEF y se ha coordinado la implementación de acciones con el proyecto RFF para fortalecer las acciones de recuperación en Barahona.</p>
<p>Cooperación Sur-Sur: De qué manera se están realizando esfuerzos de cooperación Sur-Sur en el contexto del proyecto? Se están realizando acuerdos, negociaciones o visitas de campo conjuntamente con otros programas o instituciones extranjeras con el objetivo de replicar las experiencias previas experimentadas en otros países o de exportar el conocimiento ejecutado a nivel nacional?</p>	<p> <input type="checkbox"/> No Aplica <input type="checkbox"/> De manera deficiente <input checked="" type="checkbox"/> Medianamente <input type="checkbox"/> Significativamente </p>	<p>Se ha desarrollado una visita de la AACID y del asesor regional de PNUD-RBALC para la localización de ODS, con el objetivo de analizar oportunidades para replicar la experiencia en otros contextos. Además, se ha mantenido una reunión con el equipo de PNUD-Ecuador para compartir las experiencias de localización de ODS en Ecuador y RD. En 2022 se espera contar con elementos suficientes para fomentar el intercambio de experiencias con países de la región.</p>
<p>Desarrollo de Capacidades: Que tipo de capacidades ha ayudado a desarrollar el proyecto?</p>	<p> <input type="checkbox"/> Acuerdos institucionales <input checked="" type="checkbox"/> Liderazgo <input checked="" type="checkbox"/> Conocimiento <input type="checkbox"/> Rendición de cuentas </p>	<p>Las capacidades generadas en los miembros de los Consejos Municipales de Desarrollo, autoridades locales y organizaciones aliadas han sido aumentar el conocimiento sobre la localización de la Agenda 2030 y las brechas de desarrollo en sus territorios. También capacidades de liderazgo, negociación y búsqueda de consenso entre las personas que forman parte de las plataformas ODS.</p>

9. ANEXOS

- **Anexo 1.** Matriz de cumplimiento de indicadores
- **Anexo 2.** Informe financiero
- **Anexo 3.** Reporte sobre visibilidad del proyecto en medios de comunicación
- **Anexo 4.** Reporte fotográfico

Anexo 1. Matriz de cumplimiento de indicadores

Cumplimiento de los indicadores			
Producto 1. Promovida una estrategia de territorialización de la Agenda 2030 que responda a las necesidades surgidas a causa de la pandemia COVID-19 en República Dominicana.			
Indicador	Nivel de avance (%)	Meta alcanzada	Comentario
I.1 Análisis de brechas realizado	Alcanzado (100%)	Se han realizado dos análisis de brechas ODS (municipios Polo y Vicente Noble) y se han recopilado insumos para el análisis de brechas del municipio de Barahona. Se espera cubrir todo el territorio priorizado en el primer trimestre de 2022.	En análisis de brechas ODS se ha realizado como parte del diagnóstico para la elaboración de los planes municipales de desarrollo, garantizando una visión más amplia, integral y completa de la realidad de los territorios, que permita diseñar y priorizar acciones que reduzcan estas brechas.
I.2 Al menos un (1) plan municipal de desarrollo elaborado	Alcanzado (100%)	Se cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo elaborado (Polo), y dos en fase final (Barahona y Vicente Noble), pendientes de concluir en el primer trimestre de 2022.	
I.3 Al menos un (1) plan de desarrollo implementado	En proceso (8%)	El Plan Municipal de Desarrollo de Polo integra 73 proyectos/ acciones que están siendo ejecutados. 6 de estos son apoyados directamente por PNUD	Este indicador excede el periodo de ejecución del proyecto y depende de múltiples actores externos a la Alcaldía
I.4 Al menos un (1) módulo de capacitación incorporado en los planes municipales	Alcanzado (100%)	El PMD de Polo integra 8 iniciativas de capacitación en los siguientes ámbitos; gestión de riesgos, turismo rural sostenible, gestión de los recursos naturales, cambio climático, producción sostenible con los ecosistemas de montaña, veeduría social, acceso a la información y estadística.	
Act. 1. Apoyo a la respuesta y recuperación socioeconómica frente a los impactos del COVID-19 en los territorios focalizados			
IA1.1 # de actores (desagregados por sexo) y organizaciones consultados e implicados	Alcanzado (100%)	En los talleres para la formulación de los planes de recuperación frente al COVID19 participaron 141 personas (64,55% hombres y 35,45% mujeres) y 34 organizaciones de los tres municipios	
IA1.2. # grupos encuestados	Alcanzado (100%)	Se encuestaron 2 grupos de actores; personas pertenecientes a hogares pobres clasificados	

		como ICV1 e ICV2 según SIUBEN de los tres municipios y Mipymes de la provincia.	
IA1.3 Documento(s) diagnóstico(s) elaborado(s)	Alcanzado (100%)	2 diagnósticos de impacto del COVID19 a nivel municipal, para los municipios de Vicente Noble y Polo, un informe y un tablero sobre el impacto del COVID en las Mipymes de Barahona, y un tablero sobre el impacto del COVID19 en los hogares. (SEIA-Red Actúa)	
IA1.4 Mapeo realizado	Alcanzado (100%)	El mapeo de organizaciones y actores se realizó durante la formulación de los planes de recuperación.	
IA1.5 Fondo conformado	Alcanzado (100%)	Fondo en marcha para financiar iniciativas de recuperación con recursos de diversas fuentes.	A la fecha se han movilizado 19,024 USD de otros proyectos. Pendiente de apalancar 24,300 USD en el primer trimestre del 2022 para financiar el programa En Marcha.
IA1.6 Iniciativas de recuperación apoyadas	En proceso (75%)	Se están apoyando 3 iniciativas de recuperación socioeconómica, y una iniciativa adicional que ya finalizó.	En el primer trimestre de 2022 se espera iniciar el programa En Marcha para la validación y renovación de modelos de negocios de Mipymes de Barahona, a ejecutar directamente por PNUD en colaboración con UCATEBA y el programa para la recuperación socioemocional de jóvenes con la academia Piensa.
IA1.7 # de pequeños negocios apoyados	En proceso (50%)	Se han apoyado 100 Mipymes a través de capacitaciones, y de estas 30 han sido asesoradas para mejorar sus negocios, adaptándose a las nuevas necesidades del COVID19.	Se está apoyando la recuperación socioeconómica de al menos 130 personas más como resultado directo de este proyecto y 175 sumando los recursos apalancados.
Act. 2. Impulso a las estructuras de gobernanza local multiactor y multinivel implementando plataformas territoriales para la localización de ODS			
IA2.1 Documento elaborado	En proceso (75%)	Análisis multidimensional de brechas ODS completado en dos de los tres municipios del proyecto, en el marco de los planes municipales de desarrollo, pendiente de completar en el primer trimestre de 2022.	
IA2.2 Plan municipal de desarrollo elaborado/revisado con lectura ODS	Alcanzado (100%)	Se cuenta con un plan municipal de desarrollo con lectura ODS elaborado (municipio de Polo), y dos con distinto nivel de avance. (Barahona y Vicente Noble)	Indicador alcanzado, pendiente de finalizar 2 planes adicionales en el primer trimestre de 2022.

IA2.3 Tablero de resultados en funcionamiento	En proceso (20%)	Se han realizado reuniones con MEPyD para la conceptualización del sistema y se cuenta con un borrador de términos de referencia para contratación de la consultoría	
IA2.4 Plataforma instalada con los actores correspondientes	Alcanzado (100%)	Los 3 Consejos Municipales de Desarrollo están constituidos y se están fortaleciendo como plataformas ODS.	
IA2.5 # de iniciativas apoyadas	En proceso (50%)	Se ha realizado una misión de la AACID a los territorios y se está proponiendo una ampliación de la intervención para apoyar la ejecución de los planes y la continuidad de la estrategia. Se ha coordinado una acción conjunta entre UNICEF-PNUD-SNS para la atención a niños/as con desnutrición aguda y se ha promovido con CESAL, JAD y actores gubernamentales algunas oportunidades de colaboración.	
IA2.6 Plan de ordenamiento territorial elaborado / revisado	Sin avances	Los municipios objeto de la intervención no cuentan con PMOT.	En la actualidad la Ley de Ordenamiento Territorial está siendo discutida para su aprobación, a partir de la cual se establecerán los lineamientos clave para la formulación de los planes.
Act. 3. Puesta en marcha de una estrategia de sensibilización y capacitación adaptada contexto COVID-19 en la subregión Suroeste			
IA3.1 # de actores que participan en la identificación de prioridades para la estrategia	Alcanzado (100%)	Se han realizado reuniones para identificar prioridades de capacitación con los miembros de los Consejos (49 personas, 67% hombres, y 33% mujeres). Para el diseño de la estrategia de comunicación se hicieron grupos focales en los que participaron 33 personas (58 % hombres y 42% mujeres)	
IA3.2 # de acciones realizadas	En proceso (75%)	29 acciones realizadas (15 reuniones de sensibilización-capacitación a los Consejos Municipales, Consejos Provinciales y autoridades locales y provinciales, 2 talleres formativos, publicación de contenido en la web y en las redes sociales, publicación de un	

		blog) y 9 momentos de difusión de contenido en prensa nacional e internacional.	
IA3.3 # de asistentes	Alcanzado (100%)	110 personas han participado en actividades de formación y/o sensibilización pertenecientes a los Consejos de Desarrollo (Municipales y Provinciales), autoridades locales, personal de las OMPP y personal de FEDOMU	
IA3.4 # materiales elaborados	En proceso (50%)	11 materiales elaborados; Informe de recopilación de experiencias de formación sobre localización de ODS, diseño preliminar de paquete formativo sobre localización de la Agenda 2030 para Gobiernos Locales, 4 presentaciones powerpoint y 5 contenidos de difusión (notas de prensa, blog, web y redes sociales)	
IA3.5 Valoración de los materiales	Alcanzado (100%)	Se elaboró un documento de identificación de mejores experiencias y prácticas internacionales para la localización de la agenda 2030 que incluyó la capacitación como un elemento central para la localización de los ODS	
Act. 4. Apoyo al monitoreo y seguimiento de la estrategia de coordinación.			
IA4.1 # Personal contratado	Alcanzado (100%)	Se cuenta con dos personas contratadas a tiempo completo (coordinadora y consultor de campo), una persona con dedicación de un 50% al proyecto (gestora del conocimiento) y 7 personas especialistas y personal administrativo brindando apoyo parcial. El equipo está completo.	
IA4.2 # Informes de seguimiento x viaje	En proceso (60%)	Se realizaron 18 misiones a terreno. Las 2 más relevantes tienen informe de misión.	Actividad continua durante todo el proyecto.
IA4.3 # Informes de monitoreo por trimestre	En proceso (60%)	Se realizaron 2 informes trimestrales; del primer y tercer trimestre.	Actividad continua durante todo el proyecto.

Anexo 2. Informe financiero

Nombre cuenta	Cuenta Atlas	2020 Gastado	2021 Gastado	Presupuesto total	Porcentaje de ejecución	
					2021	Total
Resultado:						
Promovida una estrategia de territorialización de la Agenda 2030 que responda a las necesidades surgidas a causa de la pandemia COVID-19 en República Dominicana.						
Actividad 1. Apoyo a la respuesta y recuperación socioeconómica frente a los impactos del COVID-19 en los territorios focalizados						
Local Consultants	71300	2,014.96	880.62			
Contractual Services - Individ	71400	-	20,940.07			
Materials & Goods	72300	-	1,362.43			
Supplies	72500	-	275.38			
Grants	72600	17,859.25	25,756.57			
Miscellaneous	74500	-	412.83			
Hospitality/Learning	75700	-	92.75			
Diferencia cambiaria	76100	-	0.08			
Subtotal Act 1		19,874.21	49,720.73	110,375.00	45.05%	63.05%
Actividad 2. Impulso a las estructuras de gobernanza local multiactor y multinivel implementando plataformas territoriales para la localización de ODS						
International Consultants	71200	-	7,650.00			
Local Consultants	71300	-	28,317.79			
Contractual Services - Individ	71400	-	1.32			
Viajes	71600	-	220.14			
Miscellaneous	74500	-	737.64			
Hospitality/Learning	75700	-	172.21			
Diferencia cambiaria	76100	-	(8.93)			
Subtotal Act 2		0.00	37,090.17	73,951.00	50.16%	50.16%
Actividad 3 Puesta en marcha de una estrategia de sensibilización y capacitación adaptada contexto COVID-19 en la subregión Suroeste						
Contractual Services - Individ	71400	-	-			
Materials & Goods	72300	-	-			
Contractual services - company	72100	-	-			

Local Consultants	71300	2686.61	3,367.55			
Viajes	71600	417.89	110.00			
Audio Visual&Print Prod Costs	74200	-	-			
Miscellaneous Expenses	74500	-	-			
Subtotal Act 3		3,104.50	3,477.55	22,075.00	15.75%	29.82%
Actividad 4. Apoyo al monitoreo y seguimiento de la estrategia de coordinación.						
Contractual Services - Individ	71400	4997.26	20,719.93			
Viajes	71600	900.29	7,407.92			
Supplies	72500	-	1,661.59			
Diferencia cambiaria	76100	-	0.77			
Hospitality/Learning	75700	-	3,781.44			
Subtotal Act 4		5,897.55	33,571.65	69,538.00	48.28%	56.76%
Subtotal (Act 1+2+3+4)		28,876.26	123,860.10	275,939.00	44.89%	55.35%
DPC		0.00	2,482.48	22,075.12		
GMS		2,310.09	9,613.66	5,518.78		
Gran total		31,186.35	135,956.24	303,532.90	44.79%	55.07%

Anexo 3. Reporte sobre visibilidad del proyecto en medios de comunicación

Modernizarán sistema de seguimiento de los planes de desarrollo de los gobiernos locales – 7 de mayo 2021

[Modernizarán sistema de seguimiento de los planes de desarrollo de los gobiernos locales | Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo \(MEPyD\)](#)

Gobierno, Fedomu y la ONU socializan sobre la importancia de los ODS en los gobiernos locales – 23 de julio del 2021

<https://www.elgloboindependiente.com/2021/07/gobierno-fedomu-y-la-onu-socializan.html>

<https://www.elcaribe.com.do/destacado/gobierno-fedomu-y-la-onu-socializan-sobre-la-importancia-de-los-ods/>

<https://twitter.com/fedomurd/status/1418242266586550274>

<https://nl-nl.facebook.com/fedomurd/posts/4449385791772581>

Agentes del PNUD socializaron con autoridades, grupos organizados y personalidades de aquí, temas pertinentes a localizar Objetivo de Desarrollo Sostenible – 16 de octubre 2020

<https://ayuntamientopolo.gob.do/polo-barahona-agentes-del-pnud-socializaron-con-autoridades-grupos-organizados-y-personalidades-de-aqui-temas-pertinentes-a-localizar-objetivos-de-desarrollo-sostenible-ods/>

Inician Diplomado En Ordenamiento Territorial En Barahona – 16 de septiembre 2021

<https://dimelotv.com.do/inician-diplomado-en-ordenamiento-territorial-en-barahona/>

<https://www.elfarodelsur.com/2021/09/asomure-inicio-un-diplomado-en.html>

<https://elnuevodiario.com.do/inician-diplomado-en-ordenamiento-territorial-en-barahona/>

<https://www.armariolibre.com.do/asomure-inicia-diplomado-en-ordenamiento-territorial-cambio-climatico-y-localizacion-ods/>

Defensa Civil y PNUD imparten taller de riesgos a alcaldes GSD – 8 de noviembre 2021

[Defensa Civil y PNUD imparten taller de riesgos a alcaldes GSD \(cdn.com.do\)](#)

[DEFENSA CIVIL, PNUD Y UE FORTALECEN LAS CAPACIDADES DE ALCALDES DE SANTO DOMINGO EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES \(noticiasdelcibao.com\)](#)



[Defensa Civil, PNUD y UE fortalecen las capacidades de alcaldes de SD en gestión de riesgos de desastres - Z 101 Digital](#)

[Defensa Civil, PNUD y UE fortalecen capacidades de alcaldes de Sto.Dgo. en gestión de riesgos de desastres \(elnuevodiario.com.do\)](#)

[Alcaldes reciben de la Defensa Civil capacitación en auto emergencias – noticias telemicro \(ntelemicro.com\)](#)

[FORTALECEN CAPACIDADES DE ALCALDES EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES | Bajo Techo Digital](#)

https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/presscenter/articles/2021/defensa-civil--pnud-y-ue-fortalecen-las-capacidades-de-alcaldias.html

Defensa Civil y PNUD capacitan personal técnico de alcaldías y la gobernación de Barahona en gestión de riesgos de desastres – 15 de noviembre 2021

<https://www.polodigital10.com/2021/11/defensa-civil-y-pnud-capacitan-personal.html>

<http://www.vicentenobledigital.com/2021/11/defensa-civil-y-pnud-capacitan-personal.html>

<http://z101digital.com/defensa-civil-y-pnud-capacitan-personal-tecnico-de-alcaldias-y-gobernacion-de-barahona/>

<https://n.com.do/2021/11/15/defensa-civil-y-pnud-capacitan-personal-de-alcaldias-y-gobernacion-de-barahona-en-gestion-de-riesgos-de-desastres/>

https://defensacivil.gob.do/index.php/noticias/item/defensa-civil-y-pnud-capacitan-personal-tecnico-de-alcaldias-y-gobernacion-de-barahona-en-gestion-de-riesgos-de-desastres?category_id=4

[Defensa Civil y PNUD capacitan personal de alcaldías y gobernación de Barahona en Gestión de Riesgos de Desastres - N Digital * RD Virtual](#)

[Capacitan a personal de alcaldías en gestión de riesgos y desastres \(elcaribe.com.do\)](#)

[Defensa Civil y PNUD capacitan personal técnico de alcaldías y Gobernación de Barahona en Gestión de Riesgos de Desastres - El Pregonero \(elpregonerord.com\)](#)

[Defensa Civil y PNUD capacitan personal técnico de alcaldías y Gobernación de Barahona en Gestión de Riesgos de Desastres | Al Tanto Digital](#)

<https://aguajero.com/defensa-civil-y-pnud-capacitan-personal-tecnico-de-alcaldias-y-gobernacion-de-barahona>

<https://noticiasviprd.com/defensa-civil-y-pnud-capacitan-personal-tecnico-de-alcaldias-y-gobernacion-de-barahona-en-gestion-de-riesgos-de-desastres/>

<https://www.elzumbador.net.do/2021/11/defensa-civil-y-pnud-capacitan-personal.html>

<https://lavoordesamana.com/?p=15778>

[Defensa Civil y PNUD capacitan personal técnico de alcaldías y Gobernación de Barahona en Gestión de Riesgos de Desastres – NotasRD.com](#)

<https://www.independiente.com.do/2021/11/defensa-civil-y-pnud-capacitan-personal.html>

<https://notigrafico.com/nacionales/defensa-civil-y-pnud-capacitan-personal-tecnico-de-alcaldias-y-gobernacion-de-barahona-en-gestion-de-riesgos-de-desastres/>

<https://www.noticiasdelcibao.com/2021/11/defensa-civil-y-pnud-capacitan-personal.html>

<https://super7fm.com/pais/defensa-civil-y-pnud-capacitan-personal-de-alcaldias-y-gobernacion-en-gestion-de-riesgos-de-desastres/>

Gobernadora se reúne con directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, equipo del PNUD y autoridades de ASOMURE. - 7 de diciembre del 2021

[BARAHONA: Nuestra Gobernadora se reúne con Directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, equipo del PNUD y autoridades de ASOMURE. Están interesados en el desarrollo local. - Las Actuales RD \(lasactualesrd0001.blogspot.com\)](#)

[\(1\) Gobernación Barahona - Posts | Facebook](#)

<http://diariodigitalbarahona.blogspot.com/2021/12/barahona-gobernadora-se-reune-con.html>

<https://lasactualesrd0001.blogspot.com/2021/12/pnud-municipios-integran-los-objetivos.html>

CON EL APOYO DE LA AACID, PNUD Y MEPYD, MUNICIPIOS DE REPÚBLICA DOMINICANA INTEGRAN LA AGENDA 2030 EN LOS PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO:
<https://www.juntadeandalucia.es/aacid/?p=5339>

Artículo: Localización de la agenda 2030: Los municipios como eje fundamental para el desarrollo sostenible – 14 de diciembre del 2021

[Localización de la agenda 2030: Los municipios como eje fundamental para el desarrollo sostenible | PNUD en República Dominicana \(undp.org\)](#)

Municipios integran los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes de desarrollo - 15 de diciembre del 2021

https://www.do.undp.org/content/dominican_republic/es/home/presscenter/articles/2021/municipios-integran-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-lo.html

[Municipios integran los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes de desarrollo | Acento](#)

[Agenda 2030: Los municipios como eje fundamental para el desarrollo sostenible | Acento](#)

<https://www.elcaribe.com.do/destacado/municipios-integran-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

[Los municipios como eje fundamental para el desarrollo sostenible \(hoy.com.do\)](http://hoy.com.do)

[Municipios integran los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes de desarrollo \(elnuevodiario.com.do\)](http://elnuevodiario.com.do)

<https://super7fm.com/pais/municipios-integran-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-los-planes-de-desarrollo/>

Medios Internacionales:

https://fvdigital.do/2021/12/20/municipios-integran-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-los-planes-de-desarrollo/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=municipios-integran-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-los-planes-de-desarrollo

<https://megadiario.com.do/municipios-integran-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-los-planes-de-desarrollo/>

<https://porelojodelacerradura.com.do/municipios-integran-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-los-planes-de-desarrollo/>

https://invertix.com.do/municipios-integran-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-los-planes-municipales-de-desarrollo/?fbclid=IwAR34eKkScbKR1QxNX_McQzot-vOXxGUxBJmNuY2gbA3DM6Gh_nhHM9ysu0

<https://hechos.com.do/231444/municipios-integran-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible-en-planes-de-desarrollo/>

<https://lasactualesrd0001.blogspot.com/2021/12/pnud-municipios-integran-los-objetivos.html>

<https://primiciasdelsur.blogspot.com/2021/12/municipios-integran-los-objetivos-de.html?m=1>

<https://www.laverdaddeahora.com/2021/12/municipios-integran-los-objetivos-de.html>

Publicaciones en redes sociales sobre localización de ODS

<https://www.instagram.com/p/CXi93K9FEnB/>

<https://www.instagram.com/p/CUpkl71rJt1/>

<https://twitter.com/LFLopezCalva/status/1473687987816910859>

<https://twitter.com/CooperacionAND/status/1473251148958076930>

https://twitter.com/acuna_jairo/status/1471882739796385796

<https://twitter.com/xavierhfpnud/status/1472930546036711430>



<https://twitter.com/CooperacionAND/status/1471041893794557952>

<https://twitter.com/PNUDRD/status/1471479934539419648>

<https://twitter.com/InkaMattila/status/1468961639403700229>

<https://twitter.com/PNUDRD/status/1468920672676204553>

<https://twitter.com/PNUDRD/status/1468920679256969218>

<https://twitter.com/CooperacionAND/status/1467959175871406087>

<https://twitter.com/PNUDRD/status/1467871538745647109>

<https://twitter.com/PNUDRD/status/1463529943921479685>

<https://twitter.com/PNUDRD/status/1463529945918025737>

<https://twitter.com/PNUDRD/status/1418617905974071305>



Informe fotográfico

Anexo 4. Reportaje fotográfico


Reunión del Concejo Municipal del Municipio Vicente Noble – 11 mayo 2021



Reunión del Concejo Municipal de Desarrollo del Municipio de Polo – 11 mayo 2021



Reunión con autoridades de la Universidad Católica de Barahona- UCATEBA- Santa Cruz de Barahona -
12 de mayo 2021

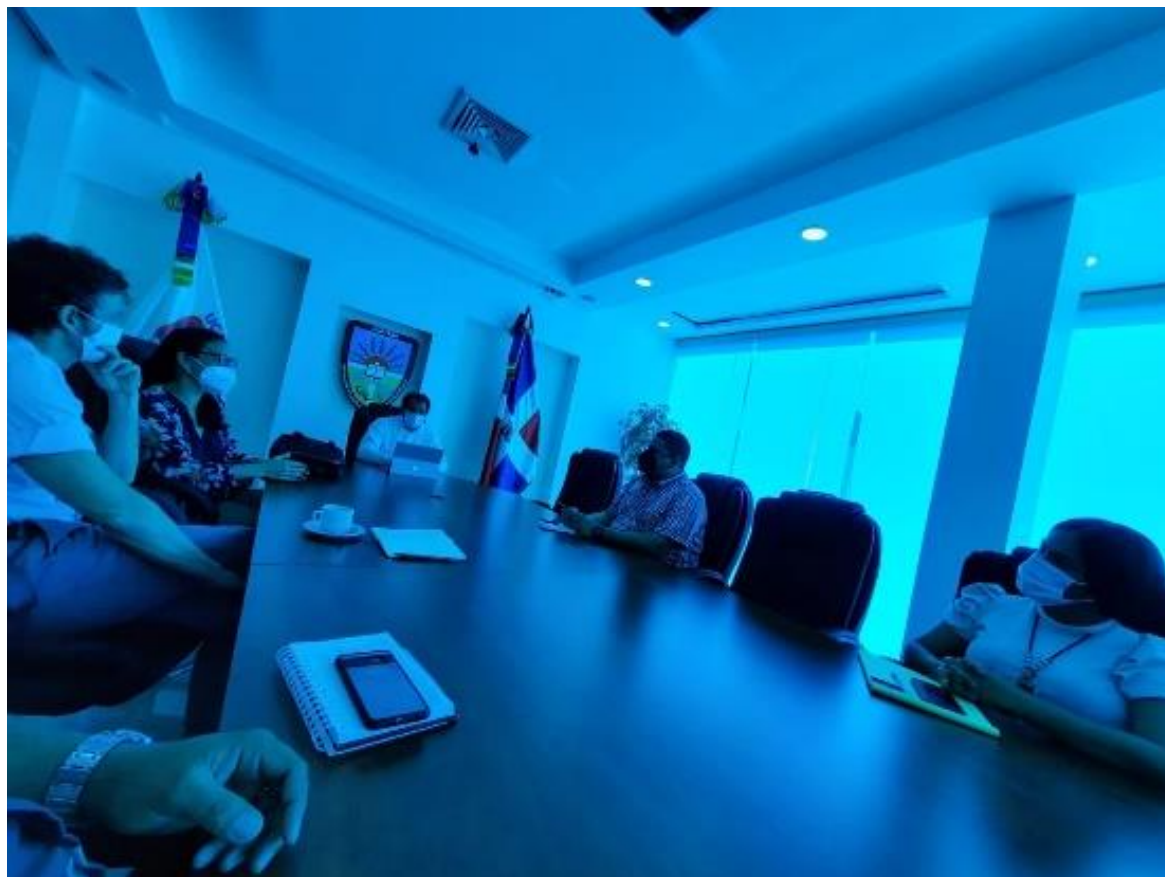

Reunión autoridades del Ayuntamiento de Santa Cruz Municipio de Barahona- 12 mayo 2021



Taller de localización de los ODS al Plan Municipal de Desarrollo, Municipio Vicente Noble – 22 mayo 2021



Visita de recopilación de informaciones educativas del Municipio de Polo al Distrito Educativo 01-04 Cabral – 17 de junio 2021



Visita al Hospital Municipal de Polo para recopilación de informaciones de salud para el PMD – 17 de junio 2021



Reunión de formulación PMD Consejo Municipal de Polo, 26 de mayo 2021



Desarrollo del 1er grupo focal de recuperación de covid-19, Municipio Polo – 29 de junio 2021



Desarrollo del 1er grupo focal de recuperación de covid-19, Municipio: Vicente Noble – 02 de julio 2021



Desarrollo del 1er grupo focal de recuperación de covid-19 Municipio: Santa Cruz, Barahona- 26 julio 2021



Taller de Recuperación de covid-19, Municipio Polo, Barahona 01 julio 2021



Taller de Recuperación de covid-19, Municipio: Vicente Noble 22 julio 2021



Taller de Recuperación de covid-19 Municipio: Vicente Noble – 08 julio 2021



Taller de Apoyo a los Planes Municipales de Desarrollo, Municipio: Polo – 17 julio 2021



Reunión Director de Pastoral Social y Caritas de Barahona - 22 julio 2021



Reunión Encargado Oficina Municipal de Planificación Ayuntamiento de Santa Cruz – 22 julio 2021



Reunión virtual Consejo Municipal de Polo, - 26 julio 2021



Reunión Comité de Recuperación Municipio Vicente Noble, - 16 septiembre 2021



Reunión Comité de Recuperación Municipio Polo, - 11 de septiembre 2021



Reunión Pastoral Social Caritas Obispado Barahona – 10 agosto 2021



Reunión de coordinación con Cesal Barahona – 10 agosto 2021



Reunión de coordinación con ASOMURE,- 10 de agosto 2021



Acompañamiento reunión del programa cooperabanreservas Municipio Vicente Noble 19 agosto 2021



Reunión de Apoyo al PMD del Municipio Vicente Noble, 10 agosto 2021



Reunión de Coordinación Caritas Barahona, - 28 noviembre 2021



Reunión con autoridades de Barahona para la colocación caseta de los artesanos, - 4 noviembre 2021



Reunión con Caritas y artesanos de Barahona, - 11 noviembre 2021



Reunión con artesanos/as de Santa y Vicente Noble Barahona, 4 de noviembre 2021



Acompañamiento a Caritas en el taller de inducción artesanas del Municipio: Vicente Noble, 11 noviembre 2021



Conformación de cooperativa de mujeres artesanas del Municipio Vicente Noble, 23 noviembre 2021



Reunión Consejo M. Recuperación de Polo y Cesal, - 16 noviembre 2021



Presentación de la encuesta SEIA al Consejo Provincia de Barahona, - 16 octubre 2021



Acompañamiento Grupos Focales de comunicación municipio de Vicente Noble, - 27 de octubre 2021



Taller de PMR Barahona, - 15 al 17 noviembre 2021



Taller de PMR Barahona, - 15 al 17 noviembre 2021



Apoyo a la Feria Regional universitaria de Buenas prácticas, Barahona 18 noviembre 2021



Reunión del Consejo Municipal y Asomure, Municipio: Santa Cruz, - 17 noviembre 2021



Grupo Focal de Comunicación Municipio: Santa Cruz,- 27 de octubre 2021



Diplomados en ordenamiento y territorial y localización ODS ASOMURE Barahona, 16 de septiembre 2021



Coordinación de la visita de la junta andaluza, Municipio Polo, 30 de noviembre 2021



Grupo focal de Comunicación Municipio: Polo, - 28 de octubre 2021




Taller a tomadores de decisiones y organizaciones “Atrévete a ponerte en mi lugar” Municipio: Polo, - 07 de septiembre 2021



Reunión de coordinación para la visita de la junta andaluza, Municipio: Vicente Noble, - 15 de septiembre 2021



Presentación al consejo de las acciones de recuperación Covid-19, Municipio Vicente Noble, - 15 septiembre 2021

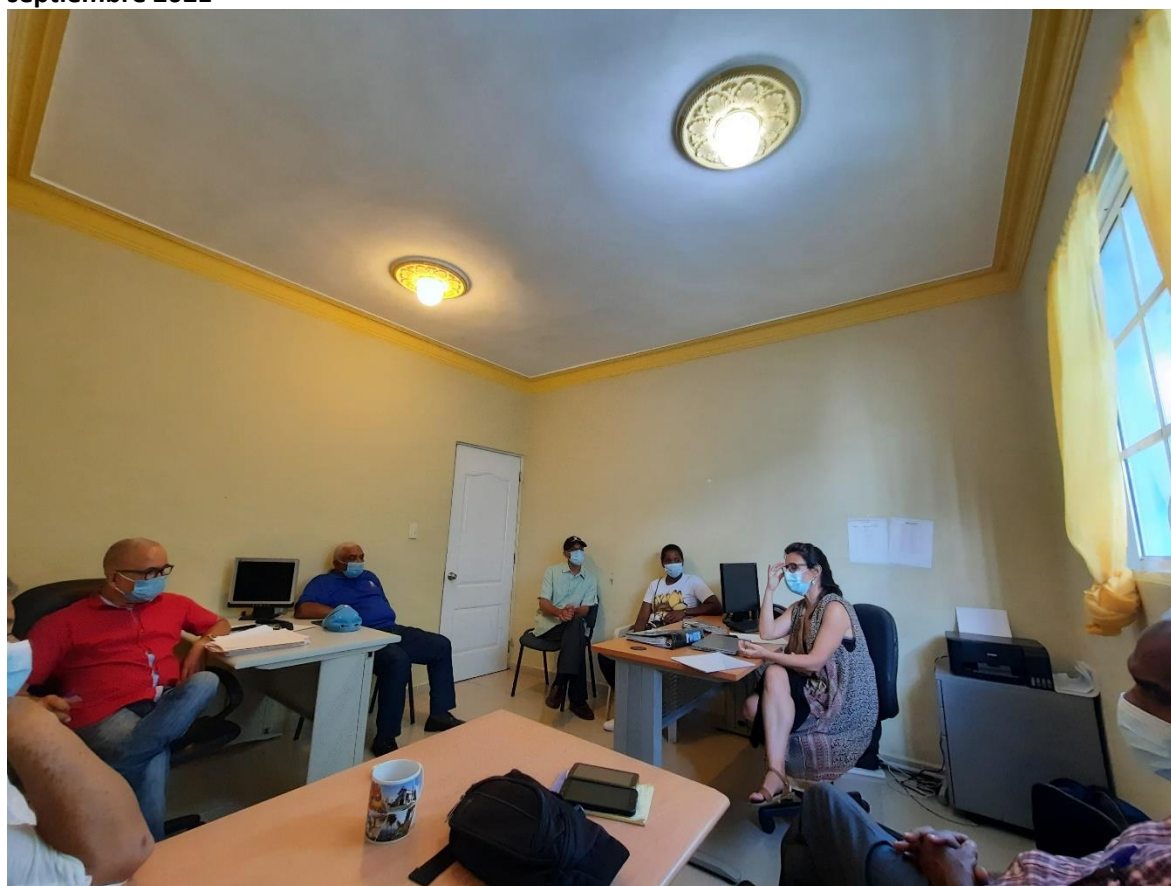

Reunión con la Gobernadora de Barahona, - 30 noviembre 2021



Reunión con la Gobernadora de Barahona, - 22 septiembre 2021



Reunión con UCATEBA “ En Marcha” Municipio: Santa Cruz, Barahona, - 22 septiembre 2021

