

Proyecto Cuarta Comunicación Nacional y Segundo Informe Bienal de Actualización

Informe de Cierre Financiero

22/12/2022

INFORME DE CIERRE FINANCIERO

Proyecto "Cuarta Comunicación Nacional y Segundo Informe Bienal de Actualización (4CN-2IBA)"

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Fecha de inicio	25/11/2019
Fecha de finalización	31/12/2022
Presupuesto	USD \$ 852.000,00 – Administrado por PNUD USD \$ 83.684,00 – Cofinanciamiento MAATE ¹ USD \$ 935.684,00 – Presupuesto Total del Proyecto
Donante	Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés)
Socios Implementadores	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE)
Objetivo	Apoyar al gobierno del Ecuador en la elaboración de la Cuarta Comunicación Nacional de Cambio Climático (4CN) y Segundo Informe Bienal de Actualización (2IBA) en el marco de compromisos asumidos frente a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)

II. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 4CN – 2IBA ACORDE AL PRODOC

Project title: Fourth National Communication (4NC) and Second Biennial Update Report (2IBA)		
Country: Ecuador	Implementing Partner: Ministry of Environment (MAE in Spanish)	Management Arrangements: CO NIM Support
Atlas Project ID/Award ID number: 00112463		Atlas Output ID/Project ID number: 00111009
UNDP-GEF PIMS ID number: 6233		GEF ID number: 10137
Planned start date: 1 Sept 2019		Planned end date: 31 August 2022
FINANCING PLAN		
GEF Trust Fund		USD 852,000.00
UNDP TRAC resources		Not applicable
Cash co-financing to be administered by UNDP		Not applicable
(1) Total Budget administered by UNDP		USD 852,000.00
PARALLEL CO-FINANCING (all other co-financing that is not cash co-financing administered by UNDP)		
Government (in-kind)		USD 83,684.00
(2) Total co-financing		USD 83,684.00
(3) Grand-Total Project Financing (1)+(2)		USD 935,684.00

¹ Cofinanciamiento in-kind proporcionado por el MAATE, comprende: espacio y mobiliario de oficina, servicios básicos, internet, instalaciones para conferencias y reuniones y tiempo parcial del personal de MAATE.

III. DATOS DEL INFORME DE CIERRE FINANCIERO

CÓDIGO DOCUMENTO:		TIPO DE DOCUMENTO:	Confidencial
FECHA DE INICIACIÓN:		FECHA APROBACIÓN:	
DESTINATARIO FINAL:	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)		

IV. PREPARADO POR:

NOMBRES COMPLETOS	INSTITUCIÓN / CARGO
Mauricio Garzón	Proyecto 4CN-2IBA /Asistente Administrativo Financiero
Karla Beltrán	Proyecto 4CN-2IBA /Coordinadora

V. REVISADO POR:

VERSIÓN	FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS	INSTITUCIONES
	22/12/2022	Carla Chacón	PNUD

VI. APROBADO POR:

NOMBRES COMPLETOS	INSTITUCIÓN / CARGO
Fabián Moncayo	Director de Mitigación del Cambio Climático Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE)
<i>Fecha:</i>	<i>Firma:</i>
Mónica Andrade	Coordinadora del Área de Ambiente y Energía Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
<i>Fecha:</i> 22-Dec-2022	<i>Firma:</i>  ED837357F174494...

Tabla de contenido

1	Introducción	6
2	Objetivo del Informe de Cierre Financiero	7
3	Presupuesto asignado al Proyecto	7
4	Ejecución Global del Proyecto 4CN-2IBA periodo 2019 - 2022	8
5	Ejecución Anual del Proyecto 4CN-2IBA	9
5.1	Ejecución año 2019.....	9
5.2	Ejecución año 2020.....	10
5.3	Ejecución año 2021	12
5.4	Ejecución año 2022.....	21
6	Comparación entre monto asignado versus ejecutado.....	22
7	Conclusiones	22
8	Alcance al Informe Financiero del Proyecto 4CN-2IBA.....	22
9	Referencias	23

Acrónimos

2IBA	Segundo Informe Bienal de Actualización
4NC	Cuarta Comunicación Nacional
MAATE	Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica
MRV	Monitoreo, Reporte y Verificación
NAMAs	Acción de Mitigación Nacionalmente Apropriada (por sus siglas en inglés)
NDC	Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (por sus siglas en inglés)
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
CMNUCC	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
GEF	Fondo para el Medio Ambiente Mundial (por sus siglas en inglés)
INGEI	Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero
IVA	Impuesto al Valor Agregado
PLANACC	Proyecto Plan Nacional de Adaptación
PROAmazonía	Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible
PRODOC	Documento de Proyecto
CDR	Reporte Combinado de Gastos (por sus siglas en inglés)
DPC	Costos Directos del Proyecto (por sus siglas en inglés)
UTCUTS	Sector Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura
NIR	Reporte Nacional de Inventarios (por sus siglas en inglés)
SCC	Subsecretaría de Cambio Climático
SRI	Sistema de Rentas Internas

1 Introducción

Desde inicios de la década de los 90, el Gobierno del Ecuador expresó su preocupación por el calentamiento global como un problema ambiental grave. El país ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en el año 1992. Del mismo modo, el país ratificó el Protocolo de Kyoto en el año 1999.

Los avances más notables en términos de gestión del cambio climático han venido ocurriendo desde finales del año 2000. Desde entonces, el gobierno ecuatoriano ha emitido varios instrumentos legales para cumplir con los compromisos de la CMNUCC. Entre los instrumentos legales se destacan la declaración de adaptación y mitigación del cambio climático como política de Estado en el año 2009 y la presentación de la “Estrategia Nacional de Cambio Climático” en el año 2012. Este marco legal ha facilitado la incorporación del cambio climático (mitigación/adaptación) como tema transversal en la administración de los sectores prioritarios para la gestión del cambio climático guiando la disposición, coordinación, planificación y acciones entre las instituciones nacionales.

Dentro de los compromisos adquiridos por el Ecuador ante la CMNUCC, el país tiene la obligación de reportar a la comunidad internacional los avances del país en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. En este sentido, las Comunicaciones Nacionales e Informes Bienales de Actualización constituyen el medio para proporcionar información y evaluar el progreso alcanzado por el país en materia de cambio climático.

La Cuarta Comunicación Nacional (4CN) y el Segundo Informe Bienal de Actualización (2IBA) deben ser informes consistentes, transparentes, completos, precisos y oportunos, ya que representan la línea de base para los procesos de planificación y desarrollo del Estado vinculados a cambio climático. Ambos informes se centran en reportar lo que el país planificó, propuso y ejecutó en materia de cambio climático entre el período 2016-2020. Además, se reporta el progreso del Ecuador con relación a la institucionalización de procesos, regulación legal y planificación territorial orientada al fortalecimiento de la gestión del cambio climático en el país.

El núcleo de ambos reportes nacionales (4CN y 2IBA) incluye principalmente las siguientes temáticas: (a) las circunstancias nacionales y de otro tipo de información relevante, (b) inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI), las iniciativas de mitigación y adaptación (c) clima y (d) los avances en la implementación del sistema de MRV. A través del Proyecto se identificaron también las barreras y limitaciones relacionadas financiera, técnica, capacidad, y las necesidades de apoyo para una gestión óptima del cambio climático. Los informes 4CN y 2IBA se desarrollaron en estrecha colaboración con el Plan Nacional de Adaptación (NAP) y la estrategia de implementación de las acciones de adaptación y mitigación definidas como las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC). Cuarta Comunicación Nacional (4CN) y el Segundo Informe Bienal de Actualización (2IBA) constituirán una herramienta de apoyo a la toma de decisiones para la incorporación de estrategias de cambio climático y el marco de políticas basadas en sectores, fortaleciendo la participación de las partes interesadas con el fin de preparar a la dirección colectiva y transversalmente el cambio climático desde sus propias funciones y competencias, siendo sensibles a las relaciones de poder entre los géneros.

Las actividades del Proyecto 4CN-2IBA se organizaron en torno a los siguientes componentes y/o resultados técnicos principales:

- 1) Circunstancias Nacionales y otra información relevante.
- 2) Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero y Acciones de Mitigación
- 3) Adaptación / Vulnerabilidad y Riesgo Climático
- 4) Monitoreo, Reporte y Verificación
- 5) Compilación del 4CN/2IBA, gestión del conocimiento
- 6) Gestión De Proyectos

2 Objetivo del Informe de Cierre Financiero

Presentar el informe financiero del Proyecto “Cuarta Comunicación Nacional y Segundo Informe Bienal de Actualización” (4CN – 2IBA), a través de un resumen descriptivo de los gastos realizados a lo largo del período de ejecución 2019-2022, acorde a los fondos asignados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés). El Proyecto 4CN-2IBA, fue ejecutado por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador (MAATE) a través de la Subsecretaría de Cambio Climático (SCC), con el soporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en calidad de agencia implementadora.

3 Presupuesto asignado al Proyecto

El presupuesto asignado al Proyecto 4CN-2IBA por parte del GEF fue de \$ 852,000.00. Adicionalmente, el Proyecto contó con \$ 83,684.00 de cofinanciamiento en especie como aporte del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE). Este cofinanciamiento incluyó: espacio de oficina y mobiliario, servicios básicos, internet, instalaciones para conferencias y reuniones, tiempo parcial del personal de MAATE, entre otros.

Acorde al PRODOC, el presupuesto del Proyecto fue distribuido entre los cinco resultados técnicos (output) esperados y el componente de Gestión de Proyecto (Project Management) de la siguiente manera (ver Tabla 1):

Tabla 1. Monto asignado por resultado del Proyecto 4CN-2IBA

Resultado (Output)	Monto (USD \$)
Circunstancias Nacionales y otra información relevante	\$ 36,938.00
Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero y Acciones de Mitigación	\$ 416,000.00
Adaptación / Vulnerabilidad y Riesgo Climático	\$ 126,000.00
Monitoreo, Reporte y Verificación	\$ 71,500.00
Compilación del 4CN/2IBA, gestión del conocimiento	\$ 124,112.00
Gestión de Proyectos (Project Management)	\$ 77,450.00
Total	\$ 852,000.00

Fuente: Presupuesto Proyecto 4CN – 2IBA / PRODOC, 2019.

4 Ejecución Global del Proyecto 4CN-2IBA periodo 2019 - 2022

El 17 de febrero de 2020 se realizó el Primer Comité Directivo en el que se presentó y autorizó el presupuesto global del proyecto y plan operativo 2020, bajo la normativa del donante (GEF) y los lineamientos de PNUD. Así también se informó que el proyecto reflejaba avances en el proceso de construcción de los Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero (INGEI) el cual inició desde mediados del año 2018. Esto debido a que se decidió adelantar la contratación de los técnicos y especialista del equipo INGEI desde agosto del 2018, gracias al apoyo económico y gestión administrativa del Programa Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible (PROAmazonía).

El presupuesto inicial establecido en el PRODOC no contemplaba al Impuesto al Valor Agregado (IVA) como línea de gasto. Al ser una cuenta de gasto frecuente en la ejecución de todas las actividades del proyecto fue incluida en el presupuesto global, asignándose el monto correspondiente para cubrirlo. El IVA fue incluido bajo la categoría de cuenta transitoria del gasto para su futura devolución al Proyecto por parte del Estado.

De acuerdo con el PRODOC, el 31 de agosto de 2022 se estableció como fecha de cierre operativo del proyecto. Sin embargo, una vez que se realizaron las reformulaciones técnicas y financieras necesarias se determinó que el proyecto solo contaba con fondos suficientes para operar hasta junio de 2022. El cambio de fecha de cierre operativo fue informado y aprobado por el Comité Directivo del Proyecto. De la misma manera, se les solicitó la autorización para la creación de líneas de gasto adicionales (Communic & Audio Visual Equip, Local Consultant, Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el presupuesto, de tal manera de facilitar la implementación y ejecución técnica del Proyecto.

Hasta el 30 de noviembre de 2022, se ha ejecutado un 98.18% (USD \$836,467.01) del total del presupuesto asignado. Sin embargo, a la fecha existen pagos en curso y otros gastos que serán reflejados en el sistema hasta diciembre 2022 por un valor de USD \$9,796.42 (ver gráfico 1), a través de los cuales se logrará alcanzar una ejecución total del 99.33% (USD \$846,263.43).


Acorde al monto de cofinanciamiento en especie presupuestado en el PRODOC el MAATE ejecutó 118% (USD \$98,668.70) (ver tabla 2).

Tabla 2. Cofinanciamiento en especie ejecutado Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE)

Institución	Planificado (USD \$)	Ejecutado (USD \$)
MAATE	\$ 83,684.00	\$ 98,668.70

Fuentes: ProDoc Proyecto 4CN-2IBA, 2019
Cartas de Cofinanciamiento MAATE, 2022

Gráfico 1. Gasto Ejecutado versus Gasto por reflejarse

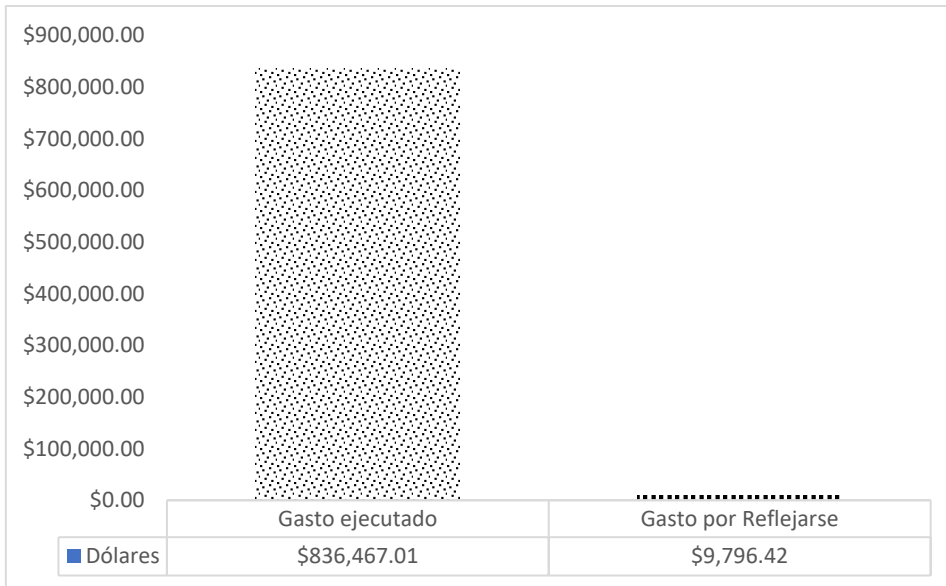

Fuente: Account Activity Analysis periodo 2019 - 2022, Plataforma Atlas PNUD

5 Ejecución Anual del Proyecto 4CN-2IBA

5.1 Ejecución año 2019

En septiembre de 2019 se firmó el “PRODOC” del Proyecto Cuarta Comunicación Nacional y Segundo Informe Bienal de Actualización (4CN-2IBA), a través de lo cual se efectivizaron los fondos del GEF para iniciar la ejecución. Sin embargo, la generación del Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero (INGEI) que es un insumo necesario para la construcción de ambos reportes nacionales, se inició en junio de 2018 con el apoyo económico del Programa PROAmazonía a las actividades ejecutadas por el equipo técnico a cargo de la generación de los Inventarios de GEI.

Con la llegada de fondos del Proyecto 4CN y 2IBA, en el mes de diciembre de 2019, se realizó la devolución de los fondos al Programa PROAmazonía, lo que constituyó el inicio de la ejecución financiera del proyecto. El monto devuelto a PROAmazonía ascendió a USD \$ 254,015.67, equivalente al pago de honorarios de los técnicos del INGEl correspondiente al periodo junio 2018 a noviembre 2019.

Adicionalmente, el técnico de procesos industriales y asistente administrativo del proyecto desempeñaron las actividades correspondientes a los meses de octubre y noviembre del 2019, con el apoyo económico del proyecto “Engagement” a cargo de PNUD. El monto devuelto a este proyecto fue de USD \$ 5,212.57. Los montos devueltos por el concepto de honorarios al Programa PROAmazonía y al Proyecto “Engagement”, más otros gastos administrativos y honorarios del mes de diciembre 2019 permitió al Proyecto finalizar el año 2019 con una ejecución presupuestaria del 33% (USD \$ 281.545,59) con respecto al presupuesto global (ver gráfico 2), correspondiente a la ejecución técnica de los años 2018 y 2019.

Figura 1. Combined Delivery Report (CDR) año 2019

Combined Delivery Report by Activity

UN Development Programme
Report ID: unglcdrb

Page 1 of 3
Run Time: 01-05-2020 04:05:45

Selection Criteria :

Business Unit : ECU10
Period : Jan-Dec (2019)
Selected Project Id : ALL
Selected Fund Code : ALL
Selected Dept. IDs : ALL
Selected Outputs : 00111009

Project Id : 00112463	Cuarta Comunicación Nacional	Period :	Jan-Dec (2019)
Output # : 00111009	Cuarta Comunicación Nacional	Impl. Partner :	01001 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
		Location :	Ecuador
		Govt Exp	UNDP Exp
		UN Agencies Exp	Total Exp

Activity : ACTIVITY2	(National Inventories of Greenh)			
Fund : 62000	(GEF Voluntary Contribution)			
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	231,149.78	0.00	231,149.78
71410 - MAIP Premium SC	0.00	131.72	0.00	131.72
71415 - Contribution to Security SC	0.00	8,121.44	0.00	8,121.44
74515 - Claims and Adjustments	0.00	26,109.09	0.00	26,109.09
74596 - Services to projects -GOE	0.00	0.00	0.00	0.00
Total for Fund 62000	0.00	265,512.03	0.00	265,512.03
Total for Activity ACTIVITY2	0.00	265,512.03	0.00	265,512.03
Activity : ACTIVITY6	(Project Management Unit)			
Fund : 62000	(GEF Voluntary Contribution)			
71405 - Service Contracts-Individuals	0.00	4,136.57	0.00	4,136.57
71410 - MAIP Premium SC	0.00	1.66	0.00	1.66
71415 - Contribution to Security SC	0.00	137.41	0.00	137.41
74515 - Claims and Adjustments	0.00	445.56	0.00	445.56
74596 - Services to projects -GOE	0.00	11,312.36	0.00	11,312.36
Total for Fund 62000	0.00	16,033.56	0.00	16,033.56
Total for Activity ACTIVITY6	0.00	16,033.56	0.00	16,033.56
Total for Output : 00111009	0.00	281,545.59	0.00	281,545.59
Project Total :	0.00	281,545.59	0.00	281,545.59

Signed By : Carlos Viscarra, Director Nacional de Mitigación del Cambio Climático, MAE

Date :

Signed By : Matilde Mordí, Representante Residente, PNUD

Date :

Fuente: Combined Delivery Report (CDR) año 2019. Plataforma Brigde PNUD.

5.2 Ejecución año 2020

Durante el año 2020, el proyecto alcanzó una ejecución del 29% (USD \$ 246,833.62) respecto al presupuesto global asignado (ver gráfico 2). En este año se observa un descenso en el porcentaje de ejecución global en comparación con el año 2019, debido en gran medida al inicio de la pandemia del COVID-19 en el mes de marzo de 2020, y las respectivas dificultades técnicas que

se generaron para ejecutar las actividades presupuestadas. Pese a ello, se reflejó una ejecución del 89 % (USD \$ 246,833.62) con respecto al presupuesto anual asignado para el año 2020 (USD \$ 277,329.50).

Los gastos incurridos en el año 2020 corresponden principalmente a el pago de los honorarios del equipo técnico y administrativo del proyecto, taller de arranque del Proyecto (Inception Workshop), pagos del proceso de contrataciones – Direct Project Cost (DPC) y otros gastos administrativos. Además, también se realizaron los pagos correspondientes a las siguientes consultorías: (a) “Elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) 2016 y 2018 -Sector IPPU”, “Evaluación del avance del MRV doméstico de mitigación y elaboración de una propuesta del Marco Conceptual del Plan Nacional de Mitigación (PLANMICC)” y (b) “Apoyo técnico para la inclusión de observaciones técnicas emitidas por la RedINGEI al Inventario de Emisiones de gases de efecto invernadero año 2018 del sector Agricultura”. En este año, también se adquirieron laptops para al Asistente Administrativo Financiero, la Coordinadora del Proyecto y la Especialista de Mitigación del proyecto, con el fin de dar facilidades técnicas al equipo del Proyecto. Este año se cerró sin montos comprometidos.

Figura 2. Combined Delivery Report (CDR) año 2020

Combined Delivery Report

Project: 00112463 - Cuarta Comunicación Nacional
Country: Ecuador
Period: Quarter 4, 2020
Status: Approved

Report by Output and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: 00111009 - Cuarta Comunicación Nacional		0.00	246,833.62	0.00	246,833.62
Fund: 62000 - GEF Voluntary Contribution		0.00	246,833.62	0.00	246,833.62
71305	Local Consult-Sht Term-Tech	0.00	5,813.75	0.00	5,813.75
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	197,332.57	0.00	197,332.57
71410	MAIP Premium SC	0.00	83.66	0.00	83.66
71415	Contribution to Security SC	0.00	6,690.99	0.00	6,690.99
72440	Connectivity Charges	0.00	155.72	0.00	155.72
72805	Acquis of Computer Hardware	0.00	3,511.00	0.00	3,511.00
74120	Capacity Assessment	0.00	0.00	0.00	0.00
74225	Other Media Costs	0.00	280.00	0.00	280.00
74505	Insurance	0.00	161.95	0.00	161.95
74515	Claims and Adjustments	0.00	23,564.43	0.00	23,564.43
74525	Sundry	0.00	209.78	0.00	209.78
74596	Services to projects-GOE	0.00	6,506.01	0.00	6,506.01
74710	Land Transport	0.00	0.00	0.00	0.00
74725	Other L.T.S.H.	0.00	0.00	0.00	0.00
75705	Learning costs	0.00	2,374.21	0.00	2,374.21
75706	Learning - ticket costs	0.00	149.55	0.00	149.55
Project Total:		0.00	246,833.62	0.00	246,833.62

Report by Activity and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: 00111009 - Cuarta Comunicación Nacional		0.00	246,833.62	0.00	246,833.62
Activity: ACTIVITY1 - National Circumstances		0.00	19,075.90	0.00	19,075.90
Fund: 62000 - GEF Voluntary Contribution		0.00	19,075.90	0.00	19,075.90
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	16,579.40	0.00	16,579.40
71410	MAIP Premium SC	0.00	7.13	0.00	7.13
71415	Contribution to Security SC	0.00	572.07	0.00	572.07
74515	Claims and Adjustments	0.00	1,917.30	0.00	1,917.30
Activity: ACTIVITY2 - Greenhouse gases inventories		0.00	120,327.45	0.00	120,327.45
Fund: 62000 - GEF Voluntary Contribution		0.00	120,327.45	0.00	120,327.45
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	104,939.07	0.00	104,939.07
71410	MAIP Premium SC	0.00	43.99	0.00	43.99
71415	Contribution to Security SC	0.00	3,515.90	0.00	3,515.90
74515	Claims and Adjustments	0.00	11,828.49	0.00	11,828.49
Activity: ACTIVITY3 - Adaptation/Vulnerability/Risk		0.00	26,448.22	0.00	26,448.22
Fund: 62000 - GEF Voluntary Contribution		0.00	26,448.22	0.00	26,448.22
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	23,112.61	0.00	23,112.61
71410	MAIP Premium SC	0.00	9.49	0.00	9.49
71415	Contribution to Security SC	0.00	761.99	0.00	761.99
74515	Claims and Adjustments	0.00	2,564.13	0.00	2,564.13

Activity: ACTIVITY4 - Monitoring, Reporting & Verif.	0.00	34,241.11	0.00	34,241.11
Fund: 62000 - GEF Voluntary Contribution	0.00	34,241.11	0.00	34,241.11
71405 Service Contracts-Individuals	0.00	29,766.73	0.00	29,766.73
71410 MAIP Premium SC	0.00	12.79	0.00	12.79
71415 Contribution to Security SC	0.00	1,022.25	0.00	1,022.25
74515 Claims and Adjustments	0.00	3,439.34	0.00	3,439.34
Activity: ACTIVITY5 - Compilation of the 4NC/2BUR	0.00	35,421.29	0.00	35,421.29
Fund: 62000 - GEF Voluntary Contribution	0.00	35,421.29	0.00	35,421.29
71305 Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	5,813.75	0.00	5,813.75
71405 Service Contracts-Individuals	0.00	22,934.76	0.00	22,934.76
71410 MAIP Premium SC	0.00	10.26	0.00	10.26
71415 Contribution to Security SC	0.00	818.78	0.00	818.78
74120 Capacity Assessment	0.00	0.00	0.00	0.00
74225 Other Media Costs	0.00	280.00	0.00	280.00
74515 Claims and Adjustments	0.00	3,339.53	0.00	3,339.53
75705 Learning costs	0.00	2,224.21	0.00	2,224.21
Activity: ACTIVITY6 - Project Management Unit	0.00	11,319.65	0.00	11,319.65
Fund: 62000 - GEF Voluntary Contribution	0.00	11,319.65	0.00	11,319.65
71405 Service Contracts-Individuals	0.00	0.00	0.00	0.00
71410 MAIP Premium SC	0.00	0.00	0.00	0.00
71415 Contribution to Security SC	0.00	0.00	0.00	0.00
72440 Connectivity Charges	0.00	155.72	0.00	155.72
72805 Acquis of Computer Hardware	0.00	3,511.00	0.00	3,511.00
74225 Other Media Costs	0.00	0.00	0.00	0.00
74505 Insurance	0.00	161.95	0.00	161.95
74515 Claims and Adjustments	0.00	475.64	0.00	475.64
74525 Sundry	0.00	209.78	0.00	209.78
74596 Services to projects -GOE	0.00	6,506.01	0.00	6,506.01
74710 Land Transport	0.00	0.00	0.00	0.00
74725 Other L.T.S.H.	0.00	0.00	0.00	0.00
75705 Learning costs	0.00	150.00	0.00	150.00
75706 Learning - ticket costs	0.00	149.55	0.00	149.55
Project Total:	0.00	246,833.62	0.00	246,833.62

Signed on behalf of UNDP:

Fernando Adames Villamil
fernando.adames@undp.org

Date: Feb 25, 2021

Signed on behalf of Implementing Partner:

Yanira Valencia
Directora Nacional de Mitigación para el Cambio Climático
Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE)

Date: Mar 05, 2021

Comments:

Se procede a la aprobación después de la revisión de nuestro técnico Paúl Melo y el Comité Directivo del Proyecto.

Fuente: Combined Delivery Report (CDR) año 2020. Plataforma Bridge PNUD.

5.3 Ejecución año 2021

Durante el año 2021, el Proyecto 4CN-2IBA alcanza una ejecución del 20% (USD \$ 173,372.78) respecto al presupuesto global asignado al proyecto (ver gráfico 2). El 2021 fue el segundo año que el proyecto tuvo que afrontar las complicaciones de la pandemia del COVID-19, por lo que se continuó trabajando virtualmente. Eso obligó al Proyecto a reformular algunas actividades previstas en función de la nueva realidad y limitaciones impuestas. Por otro lado, desde PNUD se informa que a partir del mes de octubre de 2021 los montos del IVA no serían considerados como gasto para el Proyecto. Ambos factores influyeron para que en el año 2021 el proyecto llegue a una ejecución del 81% (USD \$ 172,372.78) con respecto al presupuesto anual asignado (USD \$ 213,019.61).

Este porcentaje ejecutado en el año 2021 corresponde al pago de honorarios del equipo técnico y administrativo del proyecto, DPC y otros gastos administrativos varios. Además, se realizó el pago de varios productos relacionados con las siguientes consultorías: (a) "Evaluación de avances en la implementación de estrategias e iniciativas de adaptación al cambio climático logrados por el Ecuador durante el período 2016-2020", (b) "Generación de información sobre proyecciones futuras de variables en mares y océanos del Ecuador bajo escenarios de cambio climático", (c) "Elaboración del INGEI 2014, 2016 y 2018 para el Sector Uso de la Tierra, Cambio

de Uso de la Tierra y Silvicultura (UTCUTS) bajo metodología IPCC 2006 y documentos técnicos necesarios para el Segundo Informe Bienal de Actualización (2IBA) y la Cuarta Comunicación Nacional (4CN)”, (d) “Evaluación participativa de barreras, necesidades, oportunidades y el apoyo recibido para la gestión del cambio climático, requerida para la Cuarta Comunicación Nacional del Ecuador, Sistematización de información económica y financiera requerida para el Segundo Informe Bienal de Actualización (2IBA) y la Cuarta Comunicación Nacional (4CN)”, (e) “Técnico para la actualización del Reporte Nacional de Inventarios (NIR por sus siglas en inglés) año 2018 del sector Energía”, y (f) “Técnica para la actualización del Reporte Nacional de Inventarios (NIR por sus siglas en inglés) año 2018 del sector Residuos.”

Este año se cerró con un monto comprometido equivalente a \$23,582.27, debido a que se registraron retrasos en la aprobación de pagos de algunos productos de consultoría por parte del MAATE. Esto debido a que los mismos requirieron de un mayor número de revisiones y ajustes por parte de los/as consultores/as respecto a lo previsto.

Figura 3. Combined Delivery Report (CDR) año 2021



Combined Delivery Report

Project: 00112463 - Cuarta Comunicación Nacional

Country: Ecuador

Period: Quarter 4, 2021

Status: Approved

Report by Output and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: 00111009 - Cuarta Comunicación Nacional		0.00	172,372.78	0.00	172,372.78
Fund: 62000 - GEF Voluntary Contribution		0.00	172,372.78	0.00	172,372.78
71305	Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	16,458.40	0.00	16,458.40
71360	Local Consult-Security	0.00	102.00	0.00	102.00
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	123,824.95	0.00	123,824.95
71410	MAIP Premium SC	0.00	52.15	0.00	52.15
71415	Contribution to Security SC	0.00	3,788.60	0.00	3,788.60
71470	Natl Personnel Srvc Agreement	0.00	6,567.86	0.00	6,567.86
72115	Svc Co-Natural Resources & Env	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
72440	Connectivity Charges	0.00	67.20	0.00	67.20
74505	Insurance	0.00	172.68	0.00	172.68
74510	Bank Charges	0.00	26.00	0.00	26.00
74515	Claims and Adjustments	0.00	6,818.33	0.00	6,818.33
74596	Services to projects -GOE	0.00	4,261.95	0.00	4,261.95
75706	Learning - ticket costs	0.00	32.66	0.00	32.66
Project Total:		0.00	172,372.78	0.00	172,372.78

Report by Activity and Fund

Account	Description	Government	UNDP	UN Agencies	Total
Output: 00111009 - Cuarta Comunicación Nacional		0.00	172,372.78	0.00	172,372.78
Activity: ACTIVITY1 - National Circumstances		0.00	13,481.65	0.00	13,481.65
Fund: 62000 - GEF Voluntary Contribution		0.00	13,481.65	0.00	13,481.65
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	13,959.60	0.00	13,959.60
71410	MAIP Premium SC	0.00	5.82	0.00	5.82
71415	Contribution to Security SC	0.00	311.60	0.00	311.60
74515	Claims and Adjustments	0.00	-795.37	0.00	-795.37
Activity: ACTIVITY2 - Greenhouse gases inventories		0.00	36,978.60	0.00	36,978.60
Fund: 62000 - GEF Voluntary Contribution		0.00	36,978.60	0.00	36,978.60
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	34,508.07	0.00	34,508.07
71410	MAIP Premium SC	0.00	14.46	0.00	14.46
71415	Contribution to Security SC	0.00	1,125.02	0.00	1,125.02
71470	Natl Personnel Srvc Agreement	0.00	1,044.70	0.00	1,044.70
74515	Claims and Adjustments	0.00	286.35	0.00	286.35
Activity: ACTIVITY3 - Adaptation/Vulnerability/Risk		0.00	28,585.48	0.00	28,585.48
Fund: 62000 - GEF Voluntary Contribution		0.00	28,585.48	0.00	28,585.48
71305	Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	13,959.60	0.00	13,959.60
71410	MAIP Premium SC	0.00	5.82	0.00	5.82
71415	Contribution to Security SC	0.00	467.40	0.00	467.40
72115	Svc Co-Natural Resources & Env	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
74515	Claims and Adjustments	0.00	1,572.66	0.00	1,572.66
Activity: ACTIVITY4 - Monitoring, Reporting & Verif.		0.00	37,699.92	0.00	37,699.92
Fund: 62000 - GEF Voluntary Contribution		0.00	37,699.92	0.00	37,699.92
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	33,525.99	0.00	33,525.99
71410	MAIP Premium SC	0.00	14.40	0.00	14.40
71415	Contribution to Security SC	0.00	1,150.02	0.00	1,150.02
74515	Claims and Adjustments	0.00	3,009.51	0.00	3,009.51
Activity: ACTIVITY5 - Compilation of the 4NC/2BUR		0.00	38,800.62	0.00	38,800.62
Fund: 62000 - GEF Voluntary Contribution		0.00	38,800.62	0.00	38,800.62
71305	Local Consult.-Sht Term-Tech	0.00	14,078.40	0.00	14,078.40
71360	Local Consult-Security	0.00	102.00	0.00	102.00
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	18,197.53	0.00	18,197.53
71410	MAIP Premium SC	0.00	7.50	0.00	7.50
71415	Contribution to Security SC	0.00	606.78	0.00	606.78
71470	Natl Personnel Srvc Agreement	0.00	3,989.56	0.00	3,989.56
74515	Claims and Adjustments	0.00	1,734.35	0.00	1,734.35
74596	Services to projects -GOE	0.00	60.25	0.00	60.25
75706	Learning - ticket costs	0.00	24.25	0.00	24.25
Activity: ACTIVITY6 - Project Management Unit		0.00	16,826.51	0.00	16,826.51
Fund: 62000 - GEF Voluntary Contribution		0.00	16,826.51	0.00	16,826.51
71405	Service Contracts-Individuals	0.00	9,674.16	0.00	9,674.16
71410	MAIP Premium SC	0.00	4.15	0.00	4.15
71415	Contribution to Security SC	0.00	127.78	0.00	127.78
71470	Natl Personnel Srvc Agreement	0.00	1,533.60	0.00	1,533.60
72440	Connectivity Charges	0.00	67.20	0.00	67.20
74505	Insurance	0.00	172.68	0.00	172.68
74510	Bank Charges	0.00	26.00	0.00	26.00
74515	Claims and Adjustments	0.00	1,010.83	0.00	1,010.83
74596	Services to projects -GOE	0.00	4,201.70	0.00	4,201.70
75706	Learning - ticket costs	0.00	8.41	0.00	8.41
Project Total:		0.00	172,372.78	0.00	172,372.78

Funds Utilization

Output: 00111009 - Cuarta Comunicación Nacional Implementing Partner: 01001 - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE	UNDP Amount
Outstanding NIM Advances:	0.00
Undepreciated Fixed Assets:	0.00
Unamortized Intangible Assets:	0.00
Inventory:	0.00
Prepayments:	0.00
Commitments:	71,942.27

Signed on behalf of UNDP:

Fernando Adames Villamil
fernando.adames@undp.org

Date: Feb 21, 2022

Signed on behalf of Implementing Partner:

Vicente Fabian Moncayo Perez
Director Nacional de Mitigación del Cambio Climático
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica

Date: Mar 03, 2022

Comments:
OK


Fuente: Combined Delivery Report (CDR) año 2021. Plataforma Bridge PNUD

5.4 Ejecución año 2022

Al 30 de noviembre de 2022, el Proyecto 4CN-2IBA registra una ejecución del 16% (USD \$ 135,715.02), respecto al presupuesto global asignado (ver gráfico 2). A la fecha de cierre del presente informe, los gastos ejecutados en diciembre 2022 aún están siendo procesados al interno de PNUD. Por tanto, el saldo real del Proyecto se verá reflejado en el CDR correspondiente al cuarto trimestre de 2022, el cual estará disponible en el mes de marzo de 2023. Por tanto, posteriormente se realizará un alcance al presente informe financiero para reportar la cifra final de ejecución y el monto a devolver al donante si hubiera.

La ejecución alcanzada a la fecha corresponde a los gastos incurridos en honorarios del equipo y DPC. Además se finalizaron los pagos pendientes de las siguientes consultorías: (a) “Generación de información sobre proyecciones futuras de variables en mares y océanos del Ecuador bajo escenarios de cambio climático”, (b) “Evaluación de avances en la implementación de estrategias e iniciativas de adaptación al cambio climático logrados por el Ecuador durante el período 2016-2020”, (c) “Evaluación de avances en la implementación de estrategias e iniciativas de adaptación al cambio climático logrados por el Ecuador durante el período 2016-2020”, (d) “Evaluación de avances en la implementación de estrategias e iniciativas de adaptación al cambio climático logrados por el Ecuador durante el período 2016-2020”, (e) “Evaluación de avances en la implementación de estrategias e iniciativas de adaptación al cambio climático logrados por el Ecuador durante el período 2016-2020”, (f) “Evaluación participativa de barreras, necesidades, oportunidades y el apoyo recibido para la gestión del cambio climático, requerida para la Cuarta Comunicación Nacional del Ecuador”, (g) “Corrección de Estilo de la Comunicación Nacional y Segundo Informe Bienal de Actualización” y (h) “Realizar la edición de estilo, diseño y diagramación de la 4CN y 2IBA.” Finalmente, se cubrieron los gastos del evento público de “Lanzamiento de la Cuarta Comunicación Nacional y Segundo Informe Bienal de Actualización”.

Gráfico 2. Ejecución Presupuestaria Anual del Proyecto 4CN-2IBA - periodo 2019–2022

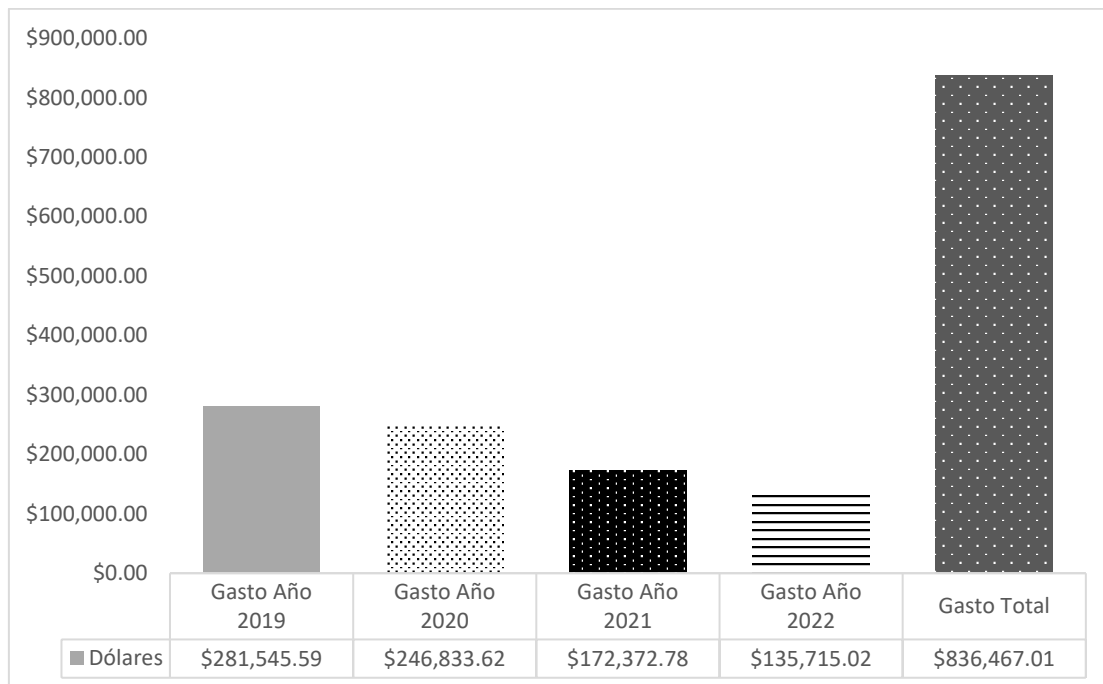

Fuente: Account Activity Analysis periodo 2019 - 2022, Plataforma Atlas PNUD

6 Comparación entre monto asignado versus ejecutado

La ejecución global del proyecto al 30 de noviembre de 2022 fue del 98% (USD \$ 836,467.01), con respecto al presupuesto global de USD \$ 852,000.00.

Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Porcentaje Ejecutado
USD % 852,000.00	USD \$ 836,467.01	98%

7 Conclusiones

- El proyecto administró eficientemente los recursos asignados, siempre bajo la mejor relación calidad-precio, respetando las reglas del donante y las políticas de PNUD para la adquisición de bienes y servicios.
- Los cambios en la dinámica del proyecto ocasionados principalmente por la emergencia sanitaria por COVID-19 obligaron al proyecto a modificar ciertas líneas presupuestarias y a adaptar algunas actividades técnicas a la nueva realidad con el fin de poder garantizar una ejecución adecuada del presupuesto
- El proyecto contó con recurso humano y presupuesto limitados por lo que se gestionó alianzas con el Proyecto PLANACC, el Proyecto de Apoyo a la NDC y el Programa PROAmazonía, para solventar problemas técnicos y financieros ocasionados por retrasos en la entrega de información por parte de terceros, la crisis sanitaria, entre otros.
- Debido al retraso de la finalización de los Inventarios de GEI (ocasionado por razones ajenas al proyecto) y a problemas presentados con la calidad de productos de consultoría, el proyecto tuvo que realizar modificaciones a ciertas líneas presupuestarias de tal manera de implementar soluciones para cumplir con los objetivos del proyecto.

8 Alcance al Informe Financiero del Proyecto 4CN-2IBA

Una vez revisados los montos de ejecución del Proyecto 4CN-2IBA a noviembre 2022 y las transacciones en proceso, se determina que se alcanzará una ejecución del 99% (USD \$ 846,263.43) respecto al presupuesto asignado (US\$ 852,000.00) por el GEF. El monto no ejecutado corresponde al 1% (USD \$5,736.57), el cual será notificado al GEF para su respectiva devolución. De ser el caso, también serán reembolsados al donante los montos correspondientes al IVA, en el caso de que el Sistema de Rentas Internas (SRI) del Ecuador haya realizado la respectiva devolución.

Gráfico 3. Ejecución Presupuestaria Global del Proyecto 4CN-2IBA - periodo 2019–2022



Fuente: Account Activity Analysis periodo 2019 - 2022, Plataforma Atlas PNUD

9 Referencias

- ProDoc del Proyecto 4CN–2IBA - 2019
- Informes Semestrales del Proyecto 4CN–2IBA
- Reportes financieros, Plataforma Atlas PNUD
