



PERÚ

Ministerio del Ambiente

Viceministerio de Gestión Ambiental

Dirección General de Calidad Ambiental

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

San Isidro, 15 de Abril de 2016

Oficio 004-2016-PEI

Señora
MARÍA DEL CARMEN SACASA
Representante Residente de PNUD
Av. Pérez Aranibar N° 750
Magdalena del Mar.-

Asunto : Remito Primer Reporte Trimestral del periodo Enero a Marzo 2016 del Proyecto PEI N°00088355

Me dirijo a usted, para saludarla cordialmente y sobre el asunto, remitir a su despacho el Primer Reporte Trimestral del periodo Enero a Marzo 2016 del Proyecto PEI N°00088355 para su conocimiento.

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,

JAVIER HERNANDEZ CAMPANELLA
Director Nacional
Proyecto PEI N°00088355

Adjunto: Primer Reporte Trimestral del 2016 del Proyecto PEI y 01 Cd - Room



Reg. y Com. / UNDP LIMA -PERU

REG. N°	RECEIVED 19 ABR 2016				
FILE CLASSIF:					
ROUTING	ACTIC.	INFO	ROUTING	ACTION	INFO
RR			OPER		
DRR			UAPP		
PRM			FIN		
COMUNIC			UDA		
IDH			RR.HH.		
UNDSS			SERV. ADM		
IT			OTROS		

www.minam.gob.pe
webmaster@minam.gob.pe

Av. Javier Prado Oeste 1440
San Isidro, Lima 27, Perú
T: (511) 611 6000

Peru Country trimestral Report QPR (January 2016 – March 2016)



Empowered lives.
Resilient nations.



**Integrated Management of Solid Waste for
Sustainable and Inclusive Development**

January 01st 2016 to March 31th 2016



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

1. BASIC PROJECT DESCRIPTION

Project title	Poverty and Environment Initiative “Integrated Management of Solid Waste for Sustainable and Inclusive Development”
Project Award Number	#75132
Project ID	00088355
Executing Agency	UNDP
Implementing Partner	MINAM
Donors	PEI, UNV, MINAM
Project Duration	November 2013- November 2017
Total Budget	Fase 1: Fase 2: USD 1.062.000
Annual Breakdown 2016	USD 212.000
Revision	TOC Dic 2015
Reporting Period	January 01 st 2016 to March 31 th 2016

2. PROJECT OVERVIEW:

La Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente, (PEI en inglés), en el Perú busca la transformación hacia un Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos pro-pobres, incorporando la dimensión de pobreza, género en las políticas públicas de Medio ambiente, a nivel nacional a través del Ministerio del Ambiente y a nivel local junto con la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). Los principales ejes de trabajo son:

1. Integración de variables sociales de pobreza y género en las Políticas/Planes y Programas Nacionales de Gestión de residuos sólidos del Perú por parte el Ministerio del Ambiente (MINAM).
2. Fortalecimiento de la Municipalidad Provincial de Arequipa para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos incorporando las variables sociales en políticas, instrumentos y herramientas locales de gestión de Residuos, Plan Integral de Gestión ambiental Residuos sólidos (PIGARS).
3. Fortalecimiento de Asociaciones de recicladoras/es y generación de las condiciones favorables para la sostenibilidad financiera.
4. Sensibilización de la población para cambio patrones de consumo y cultura de reciclaje, con apoyo de acciones de voluntariado.
5. Sistematización de las experiencias del proyecto para su réplica.

En la Provincia de Arequipa, área piloto del Proyecto PEI se promueve el desarrollo de un mercado de reciclaje más accesible y competitivo que mejore el bienestar de los/as recicladores/as, con especial énfasis en el empoderamiento de las mujeres recicladoras. Además, crea una cultura ambiental promoviendo la segregación en la fuente y el reciclaje a través de acciones de voluntariado.

Plan Operativo Anual 2016

CRONOGRAMA POA/ TRIMESTRE 1 AÑO 2014	PLAN		Q1			Q2			Q3			Q4		
	EXECUTED		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Actividad 1: Fortalecimiento de capacidades institucionales del Ministerio del Ambiente a partir de la integración de las variables sociales, de pobreza y de género en el sistema de gestión de residuos sólidos del Perú														
Acción 1.1 Fortalecer las capacidades, instrumentos de planeación e inversión, herramientas, asistencia técnica y capacitación e información del Ministerio de Ambiente (MINAM) para la toma de decisiones reforzadas para la gestión integral de residuos sólidos incorporando las dimensiones sociales, de pobreza, de género, y de medio ambiente (PLANRES; SIGERSOL; programa de inversiones).	PLAN													
	EXECUTED													
Acción 1.2 Promover la participación, la coordinación y movilización de otros ministerios a partir del intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre la incorporación de enfoques de pobreza y de género en políticas transversales ambientales.	PLAN													
	EXECUTED													
Acción 1.3 Contribuir al desarrollo del modelo de articulación con municipios en el tema de gestión de RSU.	PLAN													
	EXECUTED													
Acción 1.4 Realizar el seguimiento y la coordinación efectiva del proyecto en Arequipa	PLAN													
	EXECUTED													
Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos a partir de la incorporación de las variables sociales, de pobreza y de género en políticas, instrumentos y herramientas locales.														
Acción 2.1 - Desarrollo y socialización de una evaluación del mercado de reciclaje, incluyendo una línea de base socio-económica y análisis de género de recicladores.	PLAN													
	EXECUTED													
Acción 2.2 Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico de la Municipalidad de Arequipa (SGGA) y desarrollo de instrumentos y herramientas para la toma de decisiones reforzadas para la gestión integral de residuos sólidos, incorporando las dimensiones sociales, de pobreza, de género y medio ambiente.	PLAN													
	EXECUTED													
Acción 2.3 Desarrollo de un sistema de gestión de información piloto para la gestión de Residuos Sólidos de origen municipal bajo lineamientos del MINAM;	PLAN													
	EXECUTED													
Acción 2.4 Actualización participativa (incluyendo a mujeres y a varones jóvenes) del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS), incluyendo una incorporación de aspectos sociales, de pobreza, de género y participación cívica con los indicadores pertinentes y monitoreables que orientan la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible.	PLAN													
	EXECUTED													
Acción 2.5 Desarrollo de propuestas técnicas, financieras y/o normativas para la promoción de prácticas innovadoras y sostenibles con equidad de género, aprovechando de oportunidades económicas, incluyendo acceso al crédito con enfoque pro-pobres;	PLAN													
	EXECUTED													
Acción 2.6 Acompañamiento al Grupo Técnico de Residuos Sólidos (CAM)	PLAN													
	EXECUTED													

CRONOGRAMA POA/ TRIMESTRE 1 AÑO 2014													
	PLAN	Q1			Q2			Q3			Q4		
		EXECUTED	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Acción 2.7 Actualización de plan técnico Operativo del programa AQP Recicia (Domiciliario, comercial, empresarial, Industrial e Instituciones)													
	PLAN												
	EXECUTED												
Actividad 3: Fortalecer asociaciones de recicladores pro-pobres y un entorno favorables hacia una sostenibilidad financiera a largo plazo													
Acción 3.1. Elaboración e implementación de programa de fortalecimiento de capacidades de asociaciones de recicladores pro-pobres en i) capacidades sociales, operativas e institucionales; ii) empoderamiento y mejora de capacidades de negociación con enfoque social, igualdad de género y liderazgo de mujeres y aumentando su visibilidad; y iii) facilitación de acceso al mercado y de mejor posicionamiento para la creación de valor añadido en la cadena de valor del reciclaje													
	PLAN												
	EXECUTED												
Acción 3.2 Asistencia técnica y financiera para la elaboración de planes de negocio y de desarrollo local (Incluyendo iniciativas económicas sustentables directamente enfocadas al empoderamiento de las mujeres recicladoras)													
	PLAN												
	EXECUTED												
Acción 3.3 Asistencia técnica y financiera para la mejora de los activos físicos de las asociaciones beneficiarias													
	PLAN												
	EXECUTED												
Acción 3.4 Elaboración de una estrategia para la consolidación organizacional del trabajo de las MP con las asociaciones de recicladores													
	PLAN												
	EXECUTED												
Actividad 4: Movilización de la sociedad peruana a través de voluntariado para cambiar la actitud pública y el comportamiento hacia los residuos sólidos													
Acción 4.1: Diseño e implementación de una campaña de sensibilización en colaboración con actores relevantes para el cambio de actitud pública y el aumento de visibilidad de asociaciones de reciclaje.													
	PLAN												
	EXECUTED												
Acción 4.2: Capacitación a actores relevantes principalmente de la sociedad civil en los enfoques del proyecto, incluyendo replicación de la capacitación a sus redes, miembros y su base de voluntarios potenciales.													
	PLAN												
	EXECUTED												
Actividad 5: Gestión de proyecto y promoción de oportunidades de replicación de la experiencia sistematizada a municipios a nivel local y nacional con un scaling-up de la metodología.													
Acción 5.1. Sistematizar, publicar y distribuir la metodología, instrumentos, buenas prácticas y lecciones aprendidas del proyecto.													
	PLAN												
	EXECUTED												
Acción 5.2. Revisión y asesoría técnica a los productos esperados del proyecto (análisis, indicadores, estrategias, planes, incorporación efectiva del enfoque de género en todas las actividades desarrolladas, etc.).													
	PLAN												
	EXECUTED												
Acción 5.3. Asesoría en la formulación del trabajo anual													
	PLAN												
	EXECUTED												

3. PROGRESS AND ACHIEVEMENTS

Durante el primer trimestre del 2016 los esfuerzos se han centrado principalmente en la reestructuración organización y del enfoque de la intervención en la ciudad de Arequipa y en la elaboración participativa del Plan Anual de trabajo. Este proceso es el resultado de los hallazgos de la evaluación de a Fase I - según la metodología de teoría de cambio, en ese sentido, el proyecto ha modificado algunas de sus actividades y la estructura- organigrama de equipo de terreno en Arequipa. Estos cambios han requerido de procesos de consulta y negociación entre MINAM- MPA- PNUD.

Referente al componente nacional, el MINAM ha iniciado 02 consultorías para la elaboración y actualización de instrumentos de gestión de residuos sólidos que permitan complementar al PLANRES hacia el cumplimiento de las metas del sector; asimismo el PLANRES 2016-2024 ha sido revisado por diversas direcciones del MINAM y se encuentra próximo a ser presentado formalmente para su revisión y aprobación de parte del Ministerio del Ambiente según el instrumento legal que se considere pertinente.

Por otro lado en el componente local, las labores estuvieron centradas en la sistematización de Fase 1 y en la planificación de las actividades del periodo 2016, dados los cambios organizacionales, sin embargo se ejecutaron también algunas actividades asociadas a la implementación de equipamiento adquirido por la MPA en las rutas de recolección selectiva, el diseño de propuestas para el fortalecimiento de las asociaciones de recicladores, el seguimiento de sus actividades y un evento para el reconocimiento de la labor de los recicladores en el marco del Día Internacional de la Mujer

3.1. Outcome level

Durante el presente el proyecto se centró en la planificación participativa MINAM/MPA/PNUD de las actividades para el periodo 2016, presupuesto y Plan Operativo Anual del Proyecto 2016, en particular los componentes de ejecutados en la ciudad de Arequipa, en el contexto de la reorganización del proyecto para la Fase II. Se dieron también inicio a ciertos procesos que lograran productos concretos durante los siguientes trimestres tales como las consultorías de instrumentos de gestión para el MINAM.

3.2. Output level

A nivel de resultado durante el periodo de reporte se han desarrollado las siguientes acciones:

Actividad 1: Fortalecimiento de capacidades institucionales del Ministerio del Ambiente a partir de la integración de las variables sociales, de pobreza y de género en el sistema de gestión de residuos sólidos del Perú.

En Enero, se finalizó la revisión del último producto de la consultoría de “Actualización del plan nacional de residuos sólidos con enfoque social, reducción de la pobreza, género y juventud que orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos socialmente inclusivo y sostenible” generándose el documento preliminar del PLANRES 2016-2024.

Posteriormente el documento fue derivado a 05 direcciones del MINAM para su revisión y la recepción de comentarios al documento. Las direcciones consultadas fueron las siguientes:

- Dirección de Dirección General de Investigación e Información Ambiental
- Dirección General de Investigación e Información Ambiental

- Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental
- Dirección General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos.
- Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Se recibieron según lo solicitado, los comentarios de estas direcciones los cuales han sido incorporados en el borrador final del PLANRES 2016-2024.

Por otro lado, continuando con el fortalecimiento institucional del MINAM y en coordinación con el PNUD, se han desarrollado los Términos de Referencia y contratos para 2 servicios de consultoría de una gran relevancia hacia el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA) 2011-2021 y del PLANRES. Estos servicios son los siguientes:

*Servicio de Consultoría para el **Diseño del Manual de Operación del Programa de Inversiones en Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales**:*

Este servicio tiene como objetivo la elaboración de los documentos necesarios para la propuesta de creación de un Programa de Inversiones en Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales con el fin de establecer el marco orgánico al interior del MINAM que permita atender la demanda y déficit de los gobiernos locales en la gestión integral de residuos, y en particular, poder reducir la brecha de infraestructura e inversión para la gestión integral de residuos sólidos en la gestión municipal. Este programa de inversiones es una parte fundamental de la implementación del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2015-2024, en particular del “Tercer eje estratégico: Fomento de las inversiones en gestión integral de residuos sólidos” y finalmente, del cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021.

*Servicio para la actualización e implementación de nuevas funcionalidades en aplicativo informático del **sistema de información para la gestión de residuos sólidos “SIGERSOL”**:*

Este servicio tiene como objetivo la actualización del SIGERSOL, incorporando nuevas funcionalidades e indicadores que permitan al MINAM y los gobiernos locales contar con información confiable que pueda ser usada como base para la toma de decisiones y de seguimiento de la gestión de residuos sólidos a nivel nacional, con enfoque social, de pobreza, género y ambiente, en vistas del desarrollo sostenible. Esta mejora al sistema SIGERSOL es una parte fundamental de la implementación del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2015-2024, en particular del “Segundo eje estratégico: Desarrollo Institucional” y finalmente, para el seguimiento del cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021.

Finalmente durante el primer trimestre de este año se dieron coordinaciones con otras instituciones, entre las que destacan:

- Se respondió a una solicitud del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo referida a información de recicladores en algunas regiones del país, el marco de una iniciativa de fortalecimiento de capacidades de asociaciones de recicladores en 05 regiones del país.
- Se diversos diversas reuniones y coordinaciones entre la Dirección Nacional del Proyecto y la Municipalidad del Provincial de Arequipa como parte de la incorporación de algunos cambios al enfoque del Proyecto, a razón de los resultados del ejercicio de Teoría de Cambio. Estas coordinaciones, han involucrado no solo la discusión de cambio a la organización del Proyecto, sino también del Plan Operativo Anual y al presupuesto del Proyecto los cuales ya han sido definidos.

Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos a partir de la incorporación de las variables sociales, de pobreza y de género en políticas, instrumentos y herramientas locales.

Dado el proceso de reorganización del Proyecto PEI, la intervención directa del mismo se ha visto limitada durante este periodo, centrándose en las siguientes acciones:

Propuesta de entrega de bolsas de larga duración.

Durante el 2015 a iniciativa de la MPA entregaron bolsas de mayor duración a los vecinos que participan del programa AQP Recicla, por tal motivo se confeccionaron 3.000 bolsas de malla raschel que tendrán una duración de más de 2 años y serán reutilizados por los vecinos a ser entregadas durante el año 2016. Para ello se elaboraron los términos de referencia para la entregar las bolsas y que estas sean utilizadas adecuadamente por los domicilios, asimismo esta actividad es una de las acciones que se deben de implementar para optimizar las operaciones de los recicladores en sus rutas de recolección.

Propuesta de Recolección con vehículos recientemente adquiridos.

Esta propuesta tiene por objetivo mejorar la recolección selectiva del Programa AQP Recicla con la incorporación de vehículos motorizados (01 camión y 04 motocars) a la recolección selectiva domiciliaria y de la ruta comercial, además permitirá analizar y optimizar las operaciones bajo el contexto actual e internalizar los gastos operativos del uso de vehículos en el flujo de ingresos y egresos de las asociaciones de recicladores.

Identificación de un Centro de Acopio para el programa AQP Recicla.

Durante este trimestre la MPA informo que el área de limpieza pública se trasladaría a la zona que actualmente es ocupada por el centro de acopio de residuos del programa AQP Recicla y se tiene un plazo de tres meses para desocupar el área. A razón de esto se elaboró un presupuesto para la construcción de un nuevo centro de acopio (S/. 301 278,6 nuevos soles) y se iniciaron gestiones para buscar una nueva zona de otras municipalidades (Municipalidad Provincial de Arequipa, Municipalidad de Selva Alegre, Municipalidad de Cerro Colorado), sin embargo a la fecha no se tiene aún una

Actividad 3: Fortalecer asociaciones de recicladores pro-pobres y un entorno favorables hacia una sostenibilidad financiera a largo plazo

Durante este trimestre se han ejecutado y diseñado algunas propuestas de trabajo para el periodo 2016, enfocado hacia el fortalecimiento de las asociaciones de recicladores. Vale la pena mencionar que el proceso de reorganización de las actividades del Proyecto busca también acotar y enfocar mejor los esfuerzos del proyecto hacia un grupo más reducido de recicladores con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las iniciativas realizadas con ellos.

Propuesta para la consolidación organizacional de las asociaciones de recicladores de AQP Recicla


Con la finalidad de fortalecer el proceso de consolidación organizacional de la Asociación Recicla Vida y Nuevo Mundo en el Programa AQP RECICLA se ha diseñado una propuesta que consta de realizar talleres de capacitación motivacional, a nivel personal y asociativo de Recicladores(as) de las asociaciones que participan en el Programa AQP RECICLA, con el objetivo de mejorar:

- La planificación conjunta de actividades entre las Asociaciones de Recicladores y la Municipalidad;
- Motivar a los recicladores retos personales y asociativos

- Fortalecer y mejorar las capacidades de las juntas directivas de las asociaciones en aspectos de organización y gestión.

Seguimiento y monitoreo de las asociaciones de recicladores(as) en la ruta domiciliaria y comercial.

Se realizó el seguimiento y monitoreo a las asociadas de las Asociación Recicla Vida los días 02, 03 y 09 de marzo, donde recicladoras dieron a conocer ciertas dificultades encontradas en la ruta y se verificó la ejecución de la ruta de recolección de las asociaciones de recicladores. En este monitoreo se logró constatar la participación en la ruta domiciliaria de las 8 recicladoras quienes realizaron actividad los días 2 y 3 de marzo. El día 09 de marzo, se ejecutó el monitoreo de las actividades del pesaje de residuos por parte de la compradora.

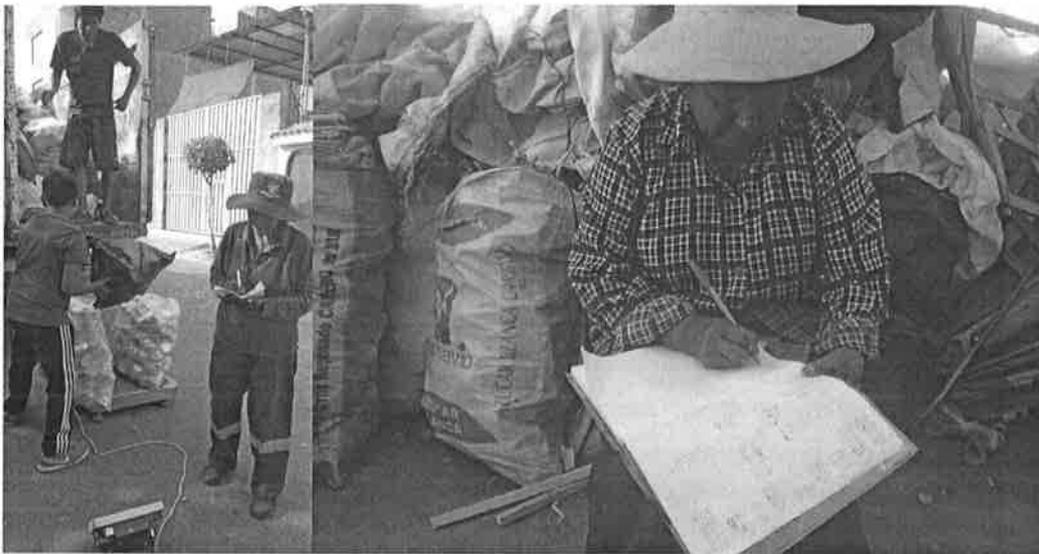

Propuesta de valor agregado a los residuos mediante elaboración de artesanías

Con la finalidad de fortalecer la comercialización de los productos elaborados con material de reúso y reciclado es que se ha elaborado una propuesta para habilitar el espacio para la instalación de un taller de artesanías así como el diseño de un plan de marketing para la producción de papel reciclado; que permita promocionar los productos en ferias ambientales nacionales, regionales y locales.

Visibilización del trabajo de las Recicladoras

En actividades por el Día de la Mujer, promovidas por la Municipalidad Provincial de Arequipa y en coordinación con la Gerencia de Desarrollo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, se reconoce la labor de las recicladoras a la ciudad en tal sentido la señora Dorotea Chalco Galeano, presidenta de la Asociación de Recicladores Nuevo Mundo, recibió el reconocimiento de Mujer Ilustre por su aporte invaluable al cuidado ambiental de la ciudad.



Actividad 4: Movilización de la sociedad peruana a través de voluntariado para cambiar la actitud pública y el comportamiento hacia los residuos sólidos.

Durante este periodo se ha evaluado el nuevo enfoque de intervención de este componente para la Fase II del Proyecto, tomando en consideración las lecciones aprendidas de la Fase I, encontrándose aún en proceso.

Actividad 5: Gestión de proyecto y promoción de oportunidades de replicación de la experiencia sistematizada a municipios a nivel local y nacional con un scaling-up de la metodología.

Durante este trimestre se recibió el reporte del proceso de evaluación de la Fase I el Proyecto PEI mediante la metodología de Teoría de Cambio. Este proceso resalto los logros FASE1, sin embargo, también reflejo una serie de debilidades y oportunidades de mejora a considerar en la Fase II.

En ese sentido, durante este trimestre y en estrecha coordinación con PEI Regional, se han establecido algunos cambios en la estructura, organización y objetivo del proyecto, con el fin de mejorar la apropiación con los beneficiarios del proyecto y alinear de forma más adecuada los objetivos y resultados al enfoque de la Iniciativa PEI Global. Entre los cambios propuestos destacan los siguientes:

- ✓ Reformulación de los componentes del Proyecto PEI hacia la un nuevo objetivo final del proyecto “Promover la transformación del sistema de gestión de residuos sólidos hacia un sistema integral pro-pobres, desarrollando un mercado de reciclaje más accesible y competitivo en AQP, con especial atención a las mujeres recicladoras, incidiendo en cambio de hábitos hacia una cultura del reciclaje” (ver Anexo2)
- ✓ Apropiación de la Municipalidad de Arequipa como responsables de la planificación y ejecución de las actividades del proyecto en la ciudad de Arequipa, esto supone la reestructuración organizacional y la firma de Acuerdos de compromisos entre MINAM-MPA
- ✓ Renfoque de intervención, dando un mayor énfasis en la elaboración de políticas públicas locales y nacionales que incorporen aspectos de reducción de pobreza y género; y disminuyendo la asistencia económica directa hacia los beneficiarios/as, con miras a la sostenibilidad y escalabilidad de las acciones del proyecto.

Debido a estos cambios organizacionales para el Proyecto, durante el primer trimestre se sostuvieron diversas reuniones con funcionarios de la MPA para la elaboración del Plan Anual Operativo 2016, el cual se encuentra ya elaborado.

Se revisado el documento final del Plan de Acción de Género y Cambio climáticos, donde la experiencia de PEI es uno de las Acciones identificadas por si potencial de escalabilidad.

Se ha remitido una crónica de PEI Perú a PEI Global en el contexto del día Internacional de Mujer para dar la visibilidad a la experiencia.

4. EXITOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

Durante este trimestre a la luz de los resultados de la auditoria de la Fase I del proyecto según la metodología de teoría de cambio, el proyecto se ha encontrado en una fase de reorganización y reformulación de actividades, estas cambios se han visto reflejado en al Plan de Trabajo para el año 2016 así como en cambios organizacionales del equipo de campo de la ciudad de Arequipa, donde la MPA tomara un rol más protagónico en la coordinación y ejecución de las tareas del Proyecto para su fase II.

5. LECCIONES APRENDIDAS

LECCIÓN APRENDIDA	FECHA DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
Es vital para el funcionamiento del proyecto que las instituciones públicas se vean involucradas directamente en las actividades hacia la Fase II del Proyecto PEI	Enero 2016	La relación entre los órganos y las instituciones públicas participantes han tenido dificultades a diverso nivel, sin embargo el que más resalta es la ausencia de comunicación adecuada y de involucramiento de la MPA en la definición de las tareas. Se espera que con los cambios administrativos este problema se vea superado.
El proyecto tiene un ámbito e intervención muy amplio y sus beneficiarios directos no están claramente definidos	Enero 2016	Se identificó que el proyecto tiene un objetivo final que requiere de demasiados supuestos y que su público beneficiario está muy disperso como consecuencia de que la zona de intervención geográfica es también bastante grande.
El proyecto no ha centrado suficientes esfuerzos enfocados en la sostenibilidad de sus acciones	Enero 2016	Si bien el proyecto ha ejecutado diversas actividades junto a los gobiernos locales y recicladores, sus esfuerzos no han considerado lo suficiente los aspectos de sostenibilidad de dichas acciones, como consecuencia el proyecto ha ejecutado algunas acciones, limitadas a asistencia económica directa y no hacia la consolidación del capacidades fortalecidas de sus beneficiarios.
El proyecto ha virado hacia actividades de asistencia directa y no hacia el desarrollo de políticas públicas, como era su mandato inicial.	Enero 2016	El proyecto, dadas diversas condiciones a nivel nacional y local, ha visto limitada su capacidad de generar políticas públicas articuladas; si bien la generación de instrumentos y herramientas ha sido prolífica estas no han logrado ser articuladas coherentemente en las políticas de trabajo de las organizaciones beneficiarias (MINAM y MPA)
Los miembros del proyecto	Enero 2016	Si bien todos los miembros del proyecto tiene

<p>carecen de herramientas objetivas que permitan incorporar los aspectos de género en sus productos.</p>		<p>capacidades técnicas ejemplares en sus respectivos ámbitos, la forma en que el “enfoque de género” se integra en las políticas públicas ambientales y de residuos es bastante subjetiva y heterogénea. Esto podría verse mejorado cierto nivel de mejoramiento de capacidades a sus miembros.</p>
---	--	--

6. RIESGOS

DESCRIPCIÓN	TIPO	IMPACTO & PROBABILIDAD (1-5)	CONTRAMEDIDAS / RESPUESTA DE GESTIÓN	RESPONSABLE
Limitada capacidad de ejecución de la MPA	Operacional	I-4 P-3	Seguimiento más frecuente del nivel de implementación de las actividades del proyecto y de la ejecución del presupuesto asignado a la MPA	Director Nacional Proyecto
Acuerdos de Implementación	Organizacional	I-5 P-5	Se tienen acuerdos entre el MINAM y MPA que no fueron firmados oportunamente debiendo ejecutarse en tanto haya acuerdo entre las partes.	Director Nacional Proyecto
Cambio de Gobiernos Nacional	Político	I-3 P-5	Si bien no se estima un cambio significativo a los cuadros del MINAM por el cambio de gobierno, si se espera que los procesos a nivel del MINAM se dirijan hacia la transferencia al nuevo gobierno y no a la generación de nuevos instrumentos. Se recomienda por ello que se establezcan límites para la presentación de los instrumentos que requieran ser aprobados por el MINAM	Director Nacional Proyecto
Liderazgo y compromiso de los recicladores	Estratégico	I-3 P-2	Diseñar una estrategia para la consolidación de grupos cohesionados, que ya recibieron asistencia durante la Fase I del Proyecto. En ese sentido se requiere que se acote el ámbito de intervención de proyecto y se definan las asociaciones con las que se trabajara de forma más directa durante la fase II	Municipalidad Provincial de Arequipa
Disponibilidad de Fondos PEi para la ejecución	Financiero	I-5 P-2	Se están facilitando COAs temporales. Atender las solicitudes de las los proyectos y Oficinas País	PNUD/ PNUMA

7. ESTRATEGIA A SEGUIR PRÓXIMO TRIMESTRE

A continuación se detallan las principales líneas de trabajo que serán implementadas durante el siguiente trimestre.

Actividad 1: Fortalecimiento de capacidades institucionales del Ministerio del Ambiente

- Finalización del Programa de Inversiones.
- Inicio del proceso de aprobación del PLANRES 2016-2024
- Actualización de indicadores del SIGERSOL del ámbito municipal.

Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa

- Revisión final y difusión del Estudio de Mercado de Residuos Sólidos
- Inicio de proceso de actualización de gestión de residuos de la instrumentos de la MPA (Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos, Programa de Recolección AQP Recicla)
- Elaborar un estudio de consolidación comercial de una iniciativa de reciclaje junto a las asociaciones de reciclaje (Modulo de Papel Reciclado)

Actividad 3: Fortalecer asociaciones de recicladores pro-pobres

- Actualización y revisión de la Línea de Base Asociaciones de Recicladores beneficiarias del Proyecto y aquellas en las que se centraran los esfuerzos del Proyecto durante la fase II
- Diseño y ejecución de capacitación y entrenamiento organizacional a asociaciones beneficiarias del Proyecto.
- Implementación de zona para módulo de producción de Papel Reciclado, según estudio de consolidación comercial.
- Definición y búsqueda de zona para el funcionamiento del centro de Acopio.
- Seguimiento y supervisión de rutas comerciales, industriales y de instituciones educativas ejecutadas por las asociaciones de recicladores.
- Optimización de las rutas de recolección domiciliaria de los recicladores para hacerlas más eficientes y homogéneas.

Actividad 4: Movilización de la sociedad peruana a través de voluntariado

- Diseño de estrategia de comunicaciones y educación ambiental del Proyecto PEI para la fase II.
- Sistematización de la contribución del voluntariado al Proyecto PEI

Actividad 5: Gestión de proyecto y promoción de oportunidades de replicación de la experiencia

- Seguimiento y Monitoreo de las acciones,
- Llevar a cabo el intercambio de experiencias entre el Proyecto PEI Uruguay y el Proyecto PEI Perú, con el objetivo de incorporar lecciones aprendidas del primero hacia la Fase II
- Capacitación a la Municipalidad Provincial de Arequipa para la gestión financiera
- Revisión Financiera del Proyecto PEI (Marzo 2015)
- Culminar y presentar el Plan Acción Genero y CC
- Elaboración de informes periodos del Proyecto.

Además durante el siguiente periodo se buscara también la revisión de los aspectos de seguimiento y metas establecidas para el Proyecto PEI en su Fase II, a la luz de los resultados de la evaluación de la Fase I.

8. HEADINGS FOR ANNEXES

Anexo 1.1 Propuesta de Plan Nacional De Gestión Integral de Residuos Solidos 2016-2024

Anexo 2.1 Informe de Evaluación del centro de acopio.

Anexo 2.2 Presupuesto para la instalación de equipos.

Anexo 2.3 Costo para la construcción de un centro de acopio

Anexo 2.4 Términos de referencia para la entrega de bolsas de larga duración

Anexo 2.5 Propuesta de Recolección Selectiva del Programa AQP Recicla haciendo uso de vehículos motorizados

Anexo 2.6 Informe sobre identificación de un Centro de Acopio para el programa AQP Recicla

Anexo 2.7 Análisis de la comercialización de residuos del programa AQP Recicla 2015

Anexo 2.8 Planos del Centro de acopio

Anexo 3.1 Reporte de comercialización ruta empresarial.

Anexos 3.2 Propuesta para la consolidación organizacional de las asociaciones de recicladores.

Anexos 3.3 Propuesta de valor agregado mediante la elaboración de artesanías

Anexo 5.1: Plan de Acción de Genero y CC



REPORTING MATRIX TEMPLATE (ANNEX TO THE NARRATIVE SECTION)

ANNEX 2:

#75132	#75132	Reporting from:	January 2014	Reporting to:	March 2016
TITLE	Integrated Management of Solid Waste for Sustainable and Inclusive Development				

PEI GLOBAL	INDICATORS	BASELINE	TARGETS
<p>OutPut 1: Enfoques y herramientas de Pobreza y Medio Ambiente aplicados para políticas, planes y mecanismos de coordinación para el desarrollo integral.</p>	<p>Número de políticas sectoriales claves y planes que integran objetivos Pobreza y Medio Ambiente e indicadores en los países;</p>	<p>Número de productos de conocimientos de PEI compartidos con redes regionales y globales.</p>	<p>Indicador 1: El Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PLANRES) actualizado, incluyendo dimensiones sociales, de reducción de la pobreza y de género ;</p> <p>Número de autoridades nacionales (y % de mujeres participando) capacitadas en la gestión integral de residuos sólidos, incorporando dimensiones sociales, de reducción de la pobreza y de género ;</p>
	<p>Número de países que integran los indicadores Pobreza y Medio Ambiente en sistemas nacionales y subnacionales de M&E;</p>		
<p>OutPut 2: Procesos intersectoriales de presupuesto y gastos y sistemas de contabilidad ambiente - económico institucionalizados.</p>	<p>Número de procesos presupuestarios y gasto nacional que integran los objetivos Pobreza y Medio Ambiente en los países.</p>		<p>Número de ministerios y socios clave incorporan objetivos Pobreza y Medio ambiente y el enfoque de género en las políticas del sector;</p>
<p>OutPut 3: Enfoques Pobreza y Medio Ambiente y experiencias documentadas y compartida para informar sobre la programación de desarrollo país, regional y mundial de parte de las Naciones Unidas y estados miembros.</p>	<p>Número de ministerios y socios clave incorporan objetivos Pobreza y Medio ambiente y el enfoque de género en las políticas del sector</p>		<p>MINAM, MIDIS- Qaliwarma, MIMPV-MTPE</p>
	<p>Número de documentos de sistematización de experiencias locales, de la metodología, de instrumentos y de buenas prácticas del proyecto elaboradas y difundidos a nivel regional, nacional y supra-nacional. (Meta: 4 al final de la fase II PEI Perú)</p>		

DESCRIPTION OF RESULTS ACHIEVED AGAINST INTENDED OUTCOMES AND CORRESPONDING INDICATORS.	QUANTITATIVE INFORMATION ON RESULTS ACHIEVED DURING THE REPORTING PERIOD IN RELATION TO INDICATORS AND BASELINE	SOURCE OF INFORMATION	
<p>Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PLANRES) en proceso de actualiza con un enfoque social, de reducción de la pobreza y enfoque de género con los indicadores pertinentes y monitoreables, y orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos de manera socialmente inclusiva y sostenible.</p> <p>El Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de Arequipa actualizado con un enfoque social de reducción de la pobreza con los indicadores pertinentes y monitoreables y orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos de manera socialmente inclusiva y sostenible.</p> <p>Sistema de información de la Municipalidad Provincial de Arequipa para la gestión de residuos sólidos (SIGERSOL) de origen municipal actualizado y un SIGERSOL de residuos sólidos de origen no-municipal elaborado incluyendo indicadores de Pobreza y Medio Ambiente y de género.</p>	<p>PLANRES: Se finalizó con el proceso de actualización y socialización del PLANRES según lo establecido en los contrato, quedando el documento pendiente de presentación al MINAM para su revisión y puesta en marcha del proceso de aprobación.</p> <p>Como parte de la actualización del I de Arequipa, se ha actualizado el Estudio de Caracterización de RRSS a ser usado como parte del proceso de actualización, así como las fichas de información a ser usadas.</p>	<p>PLANRES</p> <p>PIGARS</p>	
OUTCOME 1: PEI PERU	INDICADORES	BASELINE	TARGETS
<p>Promover la transformación del sistema de gestión de residuos sólidos hacia un sistema integral pro-pobres, desarrollando un mercado de reciclaje más accesible y competitivo en AQP, con especial atención a las mujeres recicladoras, incidiendo en cambio de hábitos hacia una cultura del reciclaje</p>	<p>I.1: Número de políticas, instrumentos y herramientas de gestión integral de residuos sólidos a nivel nacional y local con un enfoque social, de género y de reducción de la pobreza</p>	<p>LB: Falta de datos nacionales y regionales sobre el desempeño y realidad social del sector (formal e informal) de residuos sólidos impiden la comprensión del sector y la elaboración de políticas eficaces;</p> <p>LB: Falta de conocimiento nacional y regional sobre dimensiones y oportunidades sociales, de pobreza, ambientales y de género, y cómo traducirlas en políticas inclusivas e inversiones de residuos sólidos;</p> <p>Políticas, planes y estrategias a nivel nacional y local del sector residuos sólidos no incorporan el enfoque social, de pobreza y de género (Plan Nacional de Residuos Sólidos (PLANRES) a nivel nacional, Plan Integral de Gestión Ambiental de</p>	<p>FASE I: Evaluación del mercado de reciclaje de Arequipa, incluyendo línea de base socio-económica y análisis de género de la población recicladores.</p> <p>Estudio de mercado de reciclaje Arequipa inicio en Mayo de 2015, estará finalizando en Diciembre de 2015</p> <p>FASE 1: Propuesta Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PLANRES) Actualizado con un enfoque social de reducción de la pobreza y de género.</p> <p>Proceso de Validación del PLANRES ya se encuentra finalizado a nivel de contrato quedando la presentación hacia la Dirección General de Calidad Ambiental</p> <p>FASE 1: Capacidades fortalecidas de 3 asociaciones de recicladores y 70 recicladores, incluyendo enfoque de género. 04 asociaciones,</p> <p>FASE 1: Plan integral de gestión ambiental de residuos sólidos (PIGARS) Arequipa Actualizado con enfoque social, de reducción de la pobreza y de género</p> <p>El PIGARS será actualizado en 2016.</p> <p>FASE 1: Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos (SIGERSOL) de origen municipal actualizado y de residuos sólidos de origen no-municipal elaborado;</p> <p>SIGERSOL será Actualizado conforma a los indicadores que tiene que identificar en PLANRES</p>

		<p>Residuos Sólidos (PIGARS) a nivel local), lo que limita los avances que el país pueda lograr en el desarrollo inclusivo de este sector.</p>	<p>FASE 1: : 30.000 hogares alcanzados con campaña de sensibilización; Sensibilización de 6000 hogares en 2014 y 9200 hogares en 2015</p>
	<p>I.2: Mejora de bienestar (% de aumento de ingresos y condiciones de vida) de recicladores y recicladoras, diferenciando por sexo;</p>	<p>Falta de cooperación interinstitucional y cooperación nacional-regional-local sobre políticas e inversiones de residuos sólidos, desaprovechando un potencial de conocimiento importante;</p>	<p>FASE 1: 150 líderes de organizaciones comunitarias locales capacitados (y % de mujeres participando), incluyendo replicación de capacitación a sus redes; 94 recicladores y 10 recicladoras capacitados (10% de participación de mujeres).</p> <p>FASE 1: 350 personas voluntarias que participan con actividades del proyecto, desagregado; Se cuentan con 98 voluntarios (63% mujeres y 27% hombres)</p> <p>FASE 1: Evaluación primera fase del proyecto (2013 – 2014) Se realizó una sistematización de la FASE y TOC</p> <p>FASE 2: El Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PLANRES) actualizado con un enfoque social, de reducción de la pobreza y enfoque de género con los indicadores pertinentes y monitoreables; y orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos de manera socialmente inclusiva y sostenible.</p> <p>FASE 2:: 70 representantes de autoridades nacionales y actores relevantes capacitados en la gestión integral de residuos sólidos, incorporando dimensiones sociales, de reducción de la pobreza y de género;</p> <p>FASE 2:: 150 representantes de autoridades locales y actores relevantes capacitados en la gestión integral de residuos sólidos, incorporando dimensiones sociales, de reducción de la pobreza y de género;</p> <p>FASE 2:: El Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de Arequipa actualizado con un enfoque social, de reducción de la pobreza con los indicadores pertinentes y monitoreables; y orienta la asignación de recursos públicos para la gestión de residuos sólidos de manera socialmente inclusiva y sostenible;</p> <p>FASE 2:: El sistema de información de la Municipalidad Provincial de Arequipa para la gestión de residuos sólidos (SIGERSOL) de origen municipal actualizado y un SIGERSOL de residuos sólidos de origen no-municipal elaborado incluyendo indicadores de Pobreza y Medio Ambiente y de género.</p> <p>FASE 2: 5 propuestas técnicas, financieras y normativas preparadas apoyando a la sostenibilidad financiera de asociaciones de recicladores a largo plazo;</p>
		<p>Asociaciones de recicladores y recicladoras generalmente no cuentan con activos físicos (local de trabajo y maquinaria sencilla para agregar valor a lo recolectado), no cuentan con conocimiento sobre mercados locales, y no disponen de estrategias de negocios para mejorar ingresos/calidad de vida del colectivo; las mujeres en las asociaciones son a menudo excluidas de decisiones o de tener el liderazgo;</p>	

<p>I.3: Calidad del proceso participativo (número de instituciones</p>	<p>Bienestar (ingreso y condiciones de vida y de trabajo) de recicladoras y recicladores insuficiente para tener una vida digna; Recicladoras y recicladores formalizados tienen débiles capacidades organizacionales, de negociación y visibilidad del colectivo para defender sus intereses con un fin social.</p>	<p>FASE 2: 150 recicladoras y recicladores capacitados y empoderados; FASE 2: 100 recicladoras y recicladores formalizados; FASE 2: 4 asociaciones de recicladores promueven liderazgo mujeres;</p>
--	--	---

<p>DESCRIPTION OF RESULTS TOWARDS OUTPUT IN RELATION TO INDICATORS AND RESULTS FROM ACTIVITIES UNDERTAKEN</p>	<p>QUANTITATIVE INFORMATION ON CHANGE ACHIEVED DURING THE REPORTING PERIOD IN RELATION TO INDICATORS AND BASELINE</p>	<p>LEVEL OF ACHIEVEMENT OF OUTPUT (INSERT A TICK IN A BOX)</p>	
<p>Actividad 1: 1. Propuesta de PLANRES actualizado. (F1) 2. PLANRES aprobado. (F2) 3. 70 representantes de autoridades nacionales entrenados en PLANRES (F2)</p>	<p>1. 95%: Se cuenta con el PLANRES revisado por las direcciones del MINAMM listo para ser presentado para su aprobación.</p>		<p>Fully completed or very likely. On track.</p>
<p>Indicador de Actividad 2: 1. Propuesta de PIGARS de Arequipa (F1) 2. 1 estudio de Línea Base Socioeconómica (F1) 3. 150 representantes de autoridades locales (F2) 4. 1 SIGERSOL Local/Actualizado (F2) 5. PIGARS de Arequipa Aprobado (F2) 6. 5 propuestas técnicas, financieras y normativas apoyando al sostenibilidad financiera. (F2)</p>	<p>1. 20%: En 2015 se ha realizado un Estudio caracterización de Residuos Sólidos en de Arequipa, sin embargo el PIGARS no ha sido actualizado a la fecha. 2. 100%: En 2014 se levantó una Línea Socioeconómica de población recicladores AQP, en 2015 en colaboración con MINTTRA y la iniciativa PAGE se ha actualizado alcanzando a 4 ciudades principales. 3. 100%: Funcionarios/as capacitados a nivel de MPA - 319 funcionarios capacitados (109 Funcionarios capacitados en el Programa de Incentivos Municipales y PPR 0036 realizado por la Directora del Proyecto PEI, 38 funcionario de 14 municipios realizado por la directora del proyecto PEI y especialista de género, 64 entre Alcaldes, Gerente y funcionarios de 29 distritos capacitados en Programas Sociales, 02 Funcionarios de la MPA capacitados en taller del PPR 036 en la Ciudad de Tacna, 07 Funcionarios de las municipalidades distritales de Socabaya, JLBYSRiviero, Paucarpatá de intervención capacitados y con asistencia técnica, 99 funcionarios capacitados en Género durante el proceso de socialización del PLANRES en Arequipa) 4. 30%: Se cuenta con los términos de referencia para elaboración de la plataforma de la MPA que administre la información de todos los programas de segregación en la fuente y se reporte al SIGERSOL del MINAM. 5. 0%: No se han hecho avances referidos a este indicador hasta la fecha. 6. 100%: Ocho Propuestas Técnicas de Negocio: ○ Plan de Recolección Selectiva de programa Nacional de Qali Warma – Zona Urbana de la provincia de Arequipa ○ Plan de recolección selectiva para instituciones públicas-</p>	<p>XX</p>	<p>Partially completed or likely to be. Largely on track</p>

<p>Indicadores Actividad 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programa de fortalecimiento de capacidades elaborado. (F1) 2. 150 recicladores/as capacitados (F2) 3. 100 recicladores/as formalizados (F2) 4. 4 asociaciones de recicladores promueven liderazgo de mujeres (F2) 5. 10 planes de negocio y de desarrollo local. (F2) 	<p>Gobierno Regional.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Plan de Recolección Selectiva y análisis costo beneficio de residuos generados en Hoteles. o Plan de negocio para la adquisición del camión. o Plan de negocio implementación de Centro de Acopio(Faja clasificadora, picadora de PET y camión que transporte sus residuos al centro de acopio). o Plan de negocio para la producción de compostaje. o Plan de negocio para la producción de papel reciclado y artesanías. o Plan de recolección de residuos reaprovechable de las empresas del parque industrial de Arequipa-ADEPIA 	
<p>Indicadores Actividad 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 30,000 hogares sensibilizados (F1) 2. 150 líderes de organizaciones comunitarias locales capacitados (F1) 3. 350 voluntarios que participan en el Proyecto. (F1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100%: Se tiene habilitado el módulo de habilidades Sociales articulado por el MIMP. 2. 95%: 141 recicladores de 11 Asociaciones de recicladoras(es). 141 recicladoras(es) siendo el 74.5% (105 mujeres 105) y el 25.5% 36 varones). 11 asociaciones de recicladoras(es) 9 insertadas en PSF y 02 que trabajan en el botadero del Cebollar y Quebrada Honda de las 15 que existen en Arequipa. 3. 25%: 25 recicladores formalizados en 02 asociaciones (Recicla Vida y Nuevo Mundo). 4. 100%: Se cuentan con 7 asociaciones lideradas por mujeres (Sofia Taco Sánchez – Recicla Vida, Dorotea Chalco Galeno- Nuevo Mundo, Rosa Alcami Huanca- Vida Sana, Sugei Vera Flores-Musuq Pacha, Epifanía Jahuirá López- Protora del Ambiente y promotoras, Daniela Huanca Apaza-Mistianos, Martha Esther Arias Paullo-Centinelas del Planeta.) 5. 80%: 8 Planes de Negocio Diseñados aplicables a las asociaciones de recicladores (Unidad de producción de papel reciclado; Ruta Comercial del Centro Histórico de Arequipa; Residuos Generados del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma; Los residuos generados por los hoteles en el distrito de Arequipa; Los residuos generados en la asociación de empresas del Parque Industrial de Arequipa “Ruta Empresarial”; Plan de negocio para la adquisición de un camión; Equipamiento del Centro de Acopio del Programa AQP Recicla; Elaboración de compostaje). 	
<p>Indicadores Actividad 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 30,000 hogares sensibilizados (F1) 2. 150 líderes de organizaciones comunitarias locales capacitados (F1) 3. 350 voluntarios que participan en el Proyecto. (F1) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100%: 71578 Hogares sensibilizados (6.000 hogares en 2014, 70 978 en 2015), mediante sensibilización puerta a puerta, módulos itinerantes, campañas masivas, presentaciones en medios de comunicación TV y difusión de jingel en vehículos compactadores y vehículos del programa de segregación. 70 millares de material de sensibilización. 15 presentaciones en televisión en dos canales de televisión (ATV Sur 	<p>Limited completion. Unlikely to be completed. Revisions required.</p>

	<p>y Panamericana Televisión)</p> <p>Difusión de Jingle de sensibilización en 3 municipalidades distritales.</p> <p>2. 12%: 29 líderes de organizaciones sociales que conforman la RAV se capacitaron en el 2014.</p> <p>3. 60%: Se cuentan con 208 voluntarios que participaron en diferentes actividades del proyecto (60% mujeres y 40% hombres)</p>		
<p>Actividad 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se cuenta con una evaluación de la fase I – PEI (F1) 2. 15 gobiernos locales y 250 actores relevantes han sido socializados con el enfoque del Proyecto (F2) 3. 4 documentos de sistematización. (F2) 4. Se cuenta con evaluación final. (F2) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se ejecutó una evaluación con la metodología de ToC, durante Diciembre de 2015, estando a la espera de los resultados. Equipo de formado por Directora MINAM, Coordinadora AQP- PNUD, 1 UNV MINAM, 4 UNV AQP, UNV- PNUD. 2. 100%: (29 Municipios de la Provincia de Arequipa 256 líderes de organización en 2014) 		

ACTIVIDADES	ANNUAL BUDGET	PERIOD EXP	TOTAL EJECUTADO	% SPEND (MINAM)	DESCRIPTION OF PROGRESS	EXPLANATION FOR PLANNED ACTIVITIES NOT COMPLETED
Actividad 1: Fortalecimiento de capacidades institucionales del Ministerio del Ambiente a partir de la integración de las variables sociales, de pobreza y de género en el sistema de gestión de residuos sólidos del Perú.	55,998.00	Ene-Mar	0.00	0	<ul style="list-style-type: none"> Se iniciaron dos consultorías sobre la actualización y elaboración de instrumentos de gestión necesarios para la mejora de la gestión de residuos sólidos a nivel nacional. (Programa de Inversiones y SIGERSOL) Se revisó el PLANRES 2016-2024 de parte de la dirección del MINAM y se encuentra en proceso de revisión final para su envío a aprobación. 	<ul style="list-style-type: none"> Se espera contar con los 2 instrumentos ya completos para el siguiente trimestre. Se espera que el proceso de aprobación del PLANRES haya iniciado y se encuentre en marcha al siguiente trimestre.
Actividad 2: Fortalecimiento de capacidades institucionales de la Municipalidad Provincial de Arequipa para mejorar la gestión integral de los residuos sólidos a partir de la incorporación de las variables sociales, de pobreza y de género en políticas, instrumentos y herramientas locales.	43,491.60	Ene-Mar	0.00	0	<ul style="list-style-type: none"> Se elaboraron propuestas para la mejora y ejecución de iniciativas para el programa de segregación en fuente AQP recicla como el uso de bolsas reutilizables en el programa AQP Recicla, el diseño de rutas con nuevo equipamiento y la evaluación de costos de operación del Centro de Acopio de Residuos. 	<ul style="list-style-type: none"> Se espera poner ya en marcha el Plan Operativo Anual diseñado en conjunto con la MPA, ejecutando la actualización del Programa AQP Recicla, iniciando las labores para la actualización del PIGARS de la MPA y la optimización de rutas de recolección. .
Actividad 3: Fortalecer asociaciones de recicladores pobres y un entorno favorable hacia una sostenibilidad financiera a largo plazo	28,436.00	Ene-Mar	0.00	0	<ul style="list-style-type: none"> Se elaboraron propuestas referidas a la consolidación de los recicladores de programa AQP Recicla, y una actividad de reconocimiento de la labor de los recicladores en la ciudad 	<ul style="list-style-type: none"> Se espera poner ya en marcha el Plan Operativo Anual diseñado en conjunto con la MPA ejecutando las capacitaciones a las asociaciones beneficiarias, la implementación de módulos de artesanías de papel reciclado y de otras iniciativas como la Ruta Comercial y Qali Warma
Actividad 4 : Movilización de la sociedad peruana a través de voluntariado para cambiar la actitud pública y el comportamiento hacia los residuos sólidos	12,000.00	Ene-Mar	0.00	0		<ul style="list-style-type: none"> Se espera iniciar una consultoría para un diseño de una estrategia de comunicación que responda al nuevo enfoque del proyecto y se sistematicen las experiencias de los voluntarios y su impacto en el Proyecto PEI
Actividad 5: Gestión de proyecto y promoción de oportunidades de replicación de la experiencia sistematizada a municipios a nivel local y nacional con un scaling-up de la metodología.	72,057.60	Ene-Mar	0.00	0	<ul style="list-style-type: none"> Se dio soporte continuo al proceso de reestructuración del Proyecto a razón de la evaluación de la fase I 	<ul style="list-style-type: none"> Se espera que el siguiente periodo se continúe con el seguimiento a las actividades del POA, así como brindar asistencia en aspectos económicos financieros a la MPA a razón de su nuevo rol en la organización del proyecto.

