



Au service des  
peuples et des  
Nations

## RAPPORT TRIMESTRIEL D'AVANCEMENT DE PROJET

**Business Unit: MDG10**

**Award ID: 58335**

**Titre du Projet / Programme :** Stabilisation des populations rurales à travers des systèmes de gestion durable et de gouvernance locale des terres dans le sud de Madagascar (SLM)

**Partenaire de mise en œuvre :** WWF MWIOPO

**Date de début du projet :** 05/07/10

**Période du rapport De :** Janvier

**à :** Mars 2013

**Date de fin du projet:** 31/12/2014

**Budget total du projet/programme (USD):** 1 357 000 USD (GEF : 907 000 USD – UNDP : 300 000 USD – WWF : 150 000 USD)

### Section 1. Mise en œuvre du projet

#### A. Mise à jour des risques du projet

Type	Date d'identification	Description	Date de mise à jour	Reponses du management / contre mesure	Statut critique (Oui / Non)	Responsable du suivi
Environnemental	Juillet 2010	Perturbations climatiques majeures comme la sécheresse et les cyclones extrêmes avec ses lots de pénuries et dégâts: aliments, semences, inondation, etc.	15/03/13	Diffuser au niveau local les prévisions climatiques officielles – installer dans les importants champs-écoles un pluviomètre simple (juin 2013) - transmettre régulièrement les données climatiques relevées dans la station climatique d'Androka à la DGM (opérationnelle depuis 2011)	Oui	Nosy Ranalisolofo

					pour améliorer la précision des prévisions - promouvoir les techniques agricoles plus adaptées aux sécheresses et encourager/soutenir les paysans victimes des inondations pour réinstaller les champs				
	Mars 2013		L'attaque acridienne fait très souvent rage après le passage des cyclones qui ont emmené beaucoup d'eau	30/03/13	Prendre contact avec le CNA pour intensifier la surveillance et la contre-attaque - le PCA serait en visite dans la zone du projet en fin avril 2013	Oui		Nosy Ranalisolofo	
Financier	Juillet 2010		Non disponibilité à temps et en lieu du fonds alloué au Projet: les fonds pour le trimestre 1 a été disponible chez WWF à Antananarivo le 22 février 2013 et à la banque à Toliara le 08 mars 2013	15/04/13	Tenir une séance de travail entre l'équipe des opérations (WWF & PNUD) pour voir ensemble comment améliorer les choses (20 février 2013) Informier / sensibiliser l'équipe du projet pour assurer chacun leur rôle pour réduire au minimum les retards dans les différentes étapes des opérations les concernant (début mars 2013). Mettre en oeuvre les stratégies proposées par WWF pour améliorer la gestion opérationnelle du projet (discuté avec PNUD le 22 février 2013). Période de lancement: avril et mai	Oui		Tahiry Rakotomamo nny	
Sécuritaire	Juin 2012		L'insécurité règne sur la Route Nationale 10	30/03/13	Les informations sur la sécurité sont mises à jour régulièrement et les mesures de sécurité renforcées. La majorité des opérations financières du projet seront désormais traitées au niveau de Toliara pour réduire le	Oui		Nosy Ranalisolofo	

288

Politique	Novembre 2011	2011-2013 pourront être des années électorales et verrait encore probablement la prolongation des perturbations socio-économiques nationales, pas d'interlocuteurs stables pour les décisions stratégiques avec les responsables locaux			montant des cash détenus par les employés	Non	Nosy Ranalisolofo
					Renforcer la collaboration avec les services techniques au niveau local et régional et renforcer la responsabilisation de la société civile (association intercommunale, etc.)		

### B. Mise à jour des problèmes du projet

Type	Date d'apparition	Description	Date de mise à jour	Commentaires ou réponses de gestion (préciser la date de mise en œuvre)	Situation actuelle du problème (en cours / résolu)	Responsable du suivi
01_Demande_de_changement	Juillet 2012	1- Prolongement du projet avec le cofinancement de PNUD: Après deux années de mauvaises performances dues aux différents problèmes financiers, le projet compte demander une prolongation de la durée de mis en œuvre de deux années supplémentaires. Le problème est que le projet a déjà atteint un décaissement d'environ 34% du budget total offert par GEF.	30/03/13	En mars 2009, le PNUD s'est engagé à cofinancer le projet à raison de 300 000 USD et commençant cette année, une partie du cofinancement a été alloué au budget annuel du projet. WWF aussi à commencer en avril 2013 a trouvé un cofinancement de 150 000 USD pour jusqu'en fin juin 2015 pour des actions spécifiques à Maniry. Le projet demande alors l'aide du PNUD et du MEF pour aider le projet à lever des fonds complémentaires pour permettre au projet de continuer et finaliser les activités planifiées pour deux autres campagnes agricoles supplémentaires.	En attente de réponse	Nosy Ranalisolofo

2  
RBA

		<p>2- L'équipe de gestion du projet ne maîtrise pas les procédures de gestion de projet de PNUD et de GEF. Il aurait été préférable que les lignes les plus importantes aient été abordées et les modes de collaboration aient été mieux définies durant la phase de démarrage</p>	15/03/13	<p>Le projet demande à ce que les interlocuteurs du projet au sein de PNUD et de GEF soient plus explicatifs et informatifs concernant les procédures en vigueur ou nouvellement établies. Dans la mesure du possible, le projet demande aussi à ce que les requêtes de gestion provenant de PNUD et de GEF soient plus anticipées (donner le temps nécessaire à l'équipe de gestion du projet de répondre à la requête avec qualité) et si possible consultatives. Renforcer les communications constructives et faire participer le PMU à des sessions de renforcement de capacités sur les modes de travail / procédures de PNUD</p>	En cours	Nosy Ranalisolofo
Janvier 2013	<p>3- L'établissement des budgets annuels depuis l'inception workshop du projet jusqu'à présent n'a pas suivi le budget global et les instructions du Document du projet tel que le budget alloué à la gestion du projet est maintenant en dépassement de plus de 285% du budget total alloué. Le problème vient d'une mauvaise affectation des dépenses depuis le début et aussi que les taux salariaux ont beaucoup augmenté après les inflations entre 2009 et maintenant</p>	15/04/13	<p>Le projet a demandé à ce que les rapports financiers soumis soient corrigés conformément au document du projet mais les données qui sont maintenant enregistrées dans l'Atlas ne sont plus modifiables. Alors le projet demande à quand même établir un rapport financier corrigé pour la période 2010-2012 et que ce rapport corrigé sert de référence pour le suivi budgétaire du projet. Le projet aussi demande aussi à ce que ce budget soit réajusté pour intégrer les hausses des salaires et aussi le coût de fonctionnement du COPIL.</p>	En attente de réponse	Nosy Ranalisolofo	

	<p>Décembre 2012</p>	<p>4- Les indicateurs du M&amp;E plan ont été revus avec Fabiana Issler lors du PIR 2012 (cf. PIR envoyé par Fabiana). Il a été question de finaliser, voire revoir le M&amp;E Plan lors de la revue conjointe à Mantasoa. L'expert en M&amp;E du PNUD a revu les indicateurs dans le PTA 2013 en décembre 2012 et le projet a sollicité cet expert pour appuyer le projet à finaliser ce M&amp;E Plan mais la requête est restée sans réponse.</p>	<p>15/04/13</p>	<p>A la demande de PNUD, un tableau récapitulatif des indicateurs a été établi. Chacun réfléchira sur ce document et partagera son feedback. Pour GEF, ces indicateurs sont désormais les indicateurs pour lesquels la performance du projet est mesurée. Le PMU demande à ce que les indicateurs finaux retenus soient régularisés de manière officielle</p>	<p>En cours</p>	<p>Nosy Ranalisolofo</p>
<p>02_Problème</p>	<p>Septembre 2012</p>	<p>1- Les communautés qui ont offert les terrains pour les centres d'échanges pour les paysans (CEP) ont demandé à ce qu'une cérémonie traditionnelle soit tenue pour le don du terrain. Le DRDR et les communes concernées se sont engagés à faire cette ritualisation depuis novembre 2012. Cela est reporté aux calendes grecques depuis décembre 2012 (date proposée). Or, le projet ne peut pas lancer les actions pour la mise en place des CEP tant que ces ritualisations ne soient pas faites.</p>	<p>30/03/13</p>	<p>Le DRDR et les communes ont eu à faire face à dépenses imprévues après le passage du cyclone. Un terrain de 7,5 Ha a été offert pour la zone littorale dans le fokontany de Zamasy d'Androka tandis qu'un terrain de moins de 2,5 Ha seulement, se trouvant dans le fokontany de Bemioitro, fera l'affaire pour Ampanihy Ouest</p>	<p>Résolu</p>	<p>Nosy Ranalisolofo</p>
	<p>Septembre 2011</p>	<p>2- Gardiennage et entretien des stations climatologiques: le projet a maintenu appuyé la DGM pour installer deux stations climatologiques dans la zone du projet (Androka et Ampanihy Ouest). Etant donné que les stations climatologiques deviennent des patrimoines de l'Eta à travers la DGM, le gardiennage et l'entretien des stations leur reviennent de responsabilité. La DGM a confié cela aux communes de manière</p>	<p>15/03/13</p>	<p>Le projet a demandé à la DGM de déplacer les stations au sein des CEP pour que la personne en charge de chaque CEP s'occupe aussi de la station climatologique. En attendant la construction du local des CEP et le recrutement des ACL en charge des CEP, des gardiens temporaires, recrutés localement, assurent le gardiennage et l'entretien des stations. La station d'Androka est maintenant installée dans le CEP de Zamasy. Celle d'Ampanihy attend sa réinstallation dans le CEP de Bemioitro.</p>	<p>En cours</p>	<p>Nosy Ranalisolofo</p>

	<p>peu spécifique et qui ne garantit pas leur durabilité</p>				
<p>Janvier 2013</p>	<p>Conformément aux procédures en vigueur au WWF, le projet ne peut engager aucune dépense sans que le budget y afférent soit disponible. Pour certaines activités dont la mise en œuvre et le paiement traversent 2 PTA (2012-2013), nous avons demandé les fonds en 2012 sachant que cela sera payé en totalité en 2013 pour pouvoir engager les actions concernées (confection d'équipements agricoles et autres achats, construction de CEP, etc.). Le projet comptait demander en début 2013 l'autorisation d'utiliser les reliquats 2012 comme ce qu'on a fait en 2012. De ce fait, ces dépenses n'ont plus été incluses dans le budget 2013. Or, en janvier 2013, PNUD a demandé à ce que les reliquats de 2012 soient entièrement retournés au PNUD. Les impayés de 2012 ne sont plus alors couverts par aucun budget.</p>	<p>30/03/13</p>	<p>PNUD a recommandé au projet de soumettre dans les meilleurs délais une proposition de révision de budget qui inclut ces dépenses afin de pouvoir les honorer dans le meilleur délai.</p>	<p>En cours</p>	<p>Tahiry Rakotomamonjy</p>

7 000

13/03/13	Les appels d'offres pour la sélection de deux entreprises pour réaliser les travaux de construction dans les 2 centres d'échanges pour les paysans (CEP) et pour recruter un sociologue / anthropologue ont été tous deux infructueux	30/03/13	L'AO pour les travaux sera relancé (3 CEP dont Maniry, Androka et Ampanihy) en avril en calculant à ce que les travaux se passent pendant la saison sèche - le comité de sélection pour le recrutement du sociologue / anthropologue est en train de constituer une liste restreinte pour la sélection du consultant.	En cours	Nosy Ranalisolofo
Mars 2013	Il a été constaté que le projet, dans sa mise en œuvre et gestion, s'est écarté à plusieurs reprises du document du projet pour différentes raisons dans différents contextes. Ces écarts n'ont pas été effectués conformément à la cause "Legal Context" du document du projet. Le projet doit impérativement remédier à ceci.	15/04/13	Consulter le Comité du pilotage dans le meilleur délai pour avoir leur approbation sur ces modifications avant de demander un accord officiel du PNUD	En cours	Nosy Ranalisolofo
03_Autres 05 octobre 2012	1- L'Agent de Contact Local (ACL) du projet dans la commune d'Androka a été accidentellement tué par balle	30/03/13	L'ACL remplaçant est maintenant recruté	Résolu	Nosy Ranalisolofo

## Section 2. Progression des produits

**Project ID :** 4.4.2.1

**Description :** Un nouveau système de gestion durable des terres est mis en place dans le Sud (Androy et Anosy)

**Longue description :**

**Baseline [Année]:** 0 (2010)

**Indicateurs 1 :** Nombre de localités où un système est mis en place et opérationnel

**Cibles 2013 :** Réalisation des tests sur les cinq communes cibles: Androka, Marolinta, Ampanihy, Ankilizato, Maniry

**Etat d'avancement:** Le test du modèle SLM est effectué dans les 5 communes pour les différentes actions prévues pour la grande saison agricole

**Indicateurs 2 :** Superficie exploitée suivant le SLM pendant la phase test

**Cibles 2013 :** 29 Ha

**Etat d'avancement:** 29 ha de parcelles de test ont été mises en place – la culture est en cours

**Indicateurs 3:** Nombre de fermes école mises en place pendant la phase test

**Cibles 2013 :** 4

**Etat d'avancement:** 4 fermes écoles installées – test en cours

### Section 3. Réalisation des activités

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.1.1

Longue description : Des modèles reproductibles de SLM sont développés pour les communes cibles, qui sont représentatives des principales sous-régions agroécologiques du Sud de Madagascar

Pour 2013, l'objectif est la publication, la diffusion et la mise en œuvre des modèles et les techniques clé dans les communes concernées.

Cette année, le projet testera pour la première fois les modèles développés en 2011 et procédera au premier affinage. Un guide méthodologique sera élaboré pour montrer comment les modèles SLM contribueront à l'amélioration de l'Agriculture, la diminution de l'insécurité alimentaire notamment durant les périodes de soudure et à l'adaptation des modes d'agriculture au changement climatique et la diminution du taux de migration humaine dans les communes ciblées. Ces modèles devront être soutenus par des données et scénarios quantitatifs.

Date de début : Mai 2010

Date de fin : Mai 2015

% Progression jusqu'à ce jour : 55%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Contribution des paysans dans la mise en œuvre du test que ce soit au niveau	15/03/13	15 groupements de paysans composés de 542 personnes dont 182 femmes ont participé aux tests du modèle SLM cette année. Les testeurs et les autorités locales sont tous très satisfaits : ce qu'ils	Conforme au budget date : 30/03/13 score : 4	Date : 30/03/13 Score : 7

7 RMA



groupement ou niveau individuel		démontrent par leur zèle dans la réalisation des actions planifiées bien que celles-ci sont très dures. Date: 11/03/13 – score : 7	
Les bénéficiaires ciblés auront plus de rendement avec les nouvelles pratiques promues	Juillet 2013		
<p>Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.1.2</p> <p>Longue description : Identification et mise en œuvre d'au moins 3 AGR par commune ciblée pour accroître les activités économiques au niveau commune</p> <p>Pour ce résultat, un consultant national sera recruté pour un mois pour établir un business plan et un plan de renforcement de capacités pour chaque AGR priorisée. Les AGR identifiées en 2012 seront priorisées officiellement par le staff communal et les chefs fokontany. Le projet commencera alors la promotion de ces AGR en mettant en œuvre les plans de renforcement de capacités et les business plans. Dans la mise en œuvre des AGR les femmes et les groupes vulnérables doivent être priorisés.</p> <p>Date de début : Octobre 2011      Date de fin : Fin 2016</p> <p>% Progression jusqu'à ce jour : 30.55%</p>			
<b>Résultats des activités</b>			
<b>Critères de qualité</b>	<b>Date de mesure de la qualité</b>	<b>Avis des bénéficiaires (date et score)</b>	<b>Utilisation des ressources (date et score)</b>
Les paysans développent l'esprit d'entreprenariat	19/02/13	A travers les ateliers de concertation pour la priorisation des AGR, les bénéficiaires ont pu émettre leur avis et choisir eux-mêmes les AGR qu'ils veulent mettre en œuvre en partant des analyses techniques effectuées par le projet.  Date : 19/02/13 – score:7	Inférieur au budget Date: 28/02/13 Score : 4
<p>Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.1.3</p> <p>Longue description : Des techniques performantes et rentables pour la stabilisation des dunes de sables blancs Littoral AEZ (zone agroécologique) sont développées</p> <p>Pour 2013, l'objectif est de contribuer à la fois à la stabilisation des terres sablonneux à travers la culture de Ricin (un des AGR promu) en combinaison avec d'autres cultures (céréales, légumes, patates douces etc.) et de mettre à la disposition des différents acteurs et décideurs politiques un outil d'aide à la décision concernant la stabilisation des dunes vives.</p> <p>En se basant sur les résultats des études sur la filière ricin effectuées en collaboration avec ISTOM Paris et l'Université de Toliara, le projet accompagnera</p>			

les groupements de paysans testeurs qui testeront la stabilisation de petites dunes par la plantation de ricin associé à la culture vivrière ciblée. La société Phileol est un des partenaires privés pour cette action mais le projet restera ouvert à toute autre opportunités de mis en marché jugées pertinentes et durables. WWF établira une convention de collaboration spécifique avec Phileol pour la culture du ricin (AGR) sur les terres sable blanc. Des leçons apprises sur la stabilisation de ces terres sables blanc, à travers la culture de Ricin, seront diffusé. Etant donné qu'un programme de lutte contre la pauvreté (MSDLSP) mis en œuvre par PNUD dans la région Androy a beaucoup avancé dans l'accompagnement de paysans producteurs de ricin (appui technique, matériel, organisationnel), le projet capitalisera les acquis d ce programme et envisagera selon sa pertinence une collaboration avec ce programme et/ou avec ces partenaires de mis en œuvre.

L'étude scientifique sur la dynamique des dunes vives effectuée par une équipe d'étudiants en troisième cycle et des enseignants experts sera poursuivie et finalisée. Cette étude indiquera si les actions de stabilisation de dunes vives proposées dans le document du projet sont pertinentes et coût-efficaces et si ce sera le cas, l'étude donnera des recommandations pratiques sur les manières et les conditions de mis en œuvre des actions de stabilisation de dunes. Ainsi, cette année, le projet focalisera les tests sur les terres sables blancs des paysans et planifiera les actions futures selon les résultats de cette étude.

Date de début : Janvier 2012 Date de fin : Fin 2016  
 % Progression jusqu'à ce jour : 75%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Les autorités locales, régionales et représentants des communautés de base disposent d'un outil d'aide à la décision concernant les problématiques sur les dunes	Juillet 2013			
Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4-4.2.1.4				
Longue description : Les PCD sont révisés ou développés pour intégrer les meilleures techniques, pratiques, principes et les expériences spécifiques acquises durant le développement du modèle de SLM				
Pour 2013, les objectifs de ce résultat sont de finaliser les cartes d'occupation du sol et d'élaborer 5 plans d'aménagement de terroirs de référence qui seront complétés jusqu'en 2015 en 15 plans d'aménagement de terroir de référence. Les plans d'aménagement de terroir orienteront les PCD. Le projet sollicitera l'appui technique et méthodologique de institutions/personnes ressources ayant acquis des expériences probantes en la matière (CRS, COGESFOR, Etc.)				
Date de début : Juillet 2010 Date de fin : Juillet 2016				
% Progression jusqu'à ce jour : 25%				

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Implication et prise de responsabilité des communautés et autorités pour planifier l'aménagement de leur terroir	Septembre 2013			

## Section 2. Progression des produits

**Project ID :** 4-4.2.2 **Description :** Des politiques locales et nationales facilitant le SLM sont formulées et adoptées d'une manière participative à tous les niveaux

**Longue description :**

**Baseline [Année]:** 2010

**Indicateurs :** Nombre de régions qui font la promotion du SLM

**Cibles 2013 :** Les 2 régions sont outillées pour l'intégration du SLM

**Etat d'avancement:** Des outils d'aide à la décision sont développés et en cours de développement pour les 2 régions

## Section 3. Réalisation des activités

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4-4.2.2.1

Longue description : Développement / révision des Plan Communal de Développement (PCD) pour chaque commune pilote, mainstreaming les préoccupations du model SLM et développement d'une législation favorable

Pour 2013, l'objectif sera la collecte et l'analyse de données sur les règles, les pratiques, l'organisation socio-organisationnelles et des inventaires

↶ 2 PM

biologiques et socio-économiques des ressources naturelles nécessitant une légalisation plus favorable et aussi de développer des propositions d'amélioration des législations et des *dina* au niveau local. En outre le projet visera aussi à mettre à la disposition des autorités communales un outil d'intégration de SLM dans le processus de planification du développement (PCD).

Collecte et analyse de données sur les règles, les pratiques, l'organisation socio-organisationnelles et des inventaires biologiques et socio-économiques des ressources naturelles nécessitant une légalisation plus favorable. Analyse de l'aspect genre dans les 5 communes en vue de mieux intégrer cet aspect dans la planification des actions de développement. Proposition d'amélioration de la législation et des *dina*. Développement d'un outil qui intègre SLM dans les PCD.

Date de début : Janvier 2012 Date de fin : Mai 2015

% Progression jusqu'à ce jour : 10%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Implication des différents groupes d'acteurs dans les processus d'analyse et d'amélioration des <i>dina</i> pour intégrer la dimension SLM	Septembre 2013			
<p>Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4-4-2.2-2</p> <p>Longue description : Des liens étroits sont établis entre la gouvernance du SLM dans les communes et le programme de mise en œuvre des PCD</p> <p>L'objectif est que les PCD deviennent des outils de pilotage du développement durable pour les communes et ces documents intègrent les principes de gouvernance SLM à travers des mis à la disposition des outils (stratégies) de bonne gouvernance de terres et un programme de renforcement de capacité pour les présents et futurs acteurs de SLM.</p> <p>Il s'agit pour cette année de mettre à la disposition des acteurs une stratégie efficace pour l'élaboration et la mise en œuvre des PCD en s'assurant que les programmes de mis en œuvre des PCD sont liés aux principes SLM.</p> <p>Le projet œuvrera aussi pour que les institutions de formation agricole qui existent dans les régions Sud (EASTA Bezaha et IST Toliara) intègrent dans leurs programmes de formation les principes SLM. Pour ceci, le projet collaborera avec le Service de la formation agricole du Ministère de l'Agriculture et le programme de renforcement de la formation agricole financé par le FIDA.</p>				
Date de début : Janvier 2013				Date de fin : Mai 2016

% Progression jusqu'à ce jour : 30%

Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Les acteurs clés du PCD adoptent le PCD comme outil de développement communal et s'impliquent dans le processus d'amélioration du PCD	Novembre 2013			
Les responsables et les formateurs au sein des institutions de formation des régions Sud s'approprient des principes SLM	07/02/13	L'étape pour Q1/Q2 consiste à faire le bilan diagnostic des institutions de formation agricole. Les parties prenantes sous le lead du Minagri ont pu émettre leur avis concernant l'état actuel et l'efficacité de l'EASTA Bezaha et leurs recommandations pour la réforme.  Date : 07/02/12 – score : 7	Conforme au budget 28/02/13 7	28/02/13 5

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.2.3

Longue description : Les normes sociales et les règles pour la gestion des ressources au niveau local sont améliorées à tous les niveaux  
 Mise à jour des normes sociales et les règles sociales pour améliorer la gestion des ressources naturelles.

Le projet, à travers la prestation d'un consultant expert en sociologie et/ou en anthropologie, inventoriara/analysera les normes sociales et règles de gestion des ressources naturelles et des terres et l'aspect genre. Un accent particulier sera mis sur la transhumance dans les zones de départ et à Maniry et la gestion des ressources forestières de Marolinta et d'Androka. Sur la base de ces travaux, un plan stratégique sera élaboré pour améliorer / renforcer ces normes afin de renforcer la gestion durables des terres et des ressources naturelles : ce plan inclura les recommandations pour cadrer les interventions du projet et les futurs interventions mais aussi proposera des actions de formalisations des normes et des règles sociales.

Date de début :

Janvier 2013

Date de fin : Mai 2016

% Progression jusqu'à ce jour : 10%

Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)

L'analyse des normes sociales reflètera le mieux possible les réalités	28/02/13	L'analyse des normes sera effectuée en Q3 mais toutefois les bénéficiaires qui ont été consultés lors de l'établissement des TdR ont déjà exprimé leur satisfaction. Date : 10/02/13 – score : 5	Inférieur au budget 30/03/13	30/03/12 2
Les acteurs clés sont conscients et adoptent les propositions d'amélioration / formalisation des normes	Décembre 2013			

## Section 2. Progression des produits

**Project ID : 4.4.2.3**

**Description :** Les institutions et les individus ont les capacités pour soutenir et appliquer le SLM au niveau local, régional et national

**Longue description :**

**Baseline [Année]: 0 (2012)**

**Indicateurs :** Existence et opérationnalité d'un Centre d'échange pour les paysans (CEP)

**Cibles 2013 : 2**

**Etat d'avancement:** Les terrains pour les CEP sont identifiés – transfert en cours – la sélection des entreprises pour les travaux est lancée

## Section 3. Réalisation des activités

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.3.1

Longue description : Les paysans locaux au sein des cinq communes pilotes ont la capacité pour l'application de SLM et des modules de formation adéquate pour d'autres régions pertinentes à Madagascar sont développés

Pour 2013, l'objectif de ce résultat est de développer des conditions adéquates pour faciliter les formations des paysans et des communautés locales sur les différents constituants d'un bon système de gestion durable des terres. Un programme de renforcement de capacité des paysans et des acteurs locaux sera mis en œuvre.

Sur la base du bilan diagnostic institutionnel lancé en 2012, un programme de renforcement de capacité sera élaboré et mis en œuvre avec l'appui du département « renforcement de capacité de la société civile » de WWF.

Développer des conditions adéquates pour faciliter les formations des paysans dans le SLM. Les formations seront faites à travers l'animation des champs écoles, les talking books, etc.

Date de début : Janvier 2011

Date de fin : Mai 2015

% Progression jusqu'à ce jour : 40%

Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Implication des paysans et acteurs locaux dans l'élaboration/validation de leur plan de renforcement de capacité (RC)	30/03/13	Le plan de renforcement de capacité des groupements des paysans testeurs a été établi avec les groupements et tiennent aussi compte des nombreuses demandes en RC parvenues aux CSA. Ils en sont tous très satisfaits.  Date : 30/03/13 – score : 7	Conforme au budget 7	30/03/13 5
Implication/participation des acteurs locaux dans la mise en opération des CEP	30/03/13	Les CEP ne sont pas encore opérationnels dans l'attente des cérémonies de ritualisation des donations des terrains. Mais les bénéficiaires ont été très participatifs et impliqués dans la recherche et la donation des terrains  Date : 15/03/13 - Score : 7.5	Supérieur au budget 6	30/03/13 2
Appropriation des acteurs locaux des CEP et outils de RC	Novembre 2013			

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.3.3

Longue description : Le mainstreaming, la génération et le partage des savoirs et connaissances sur le SLM sont promus

Pour 2013, l'objectif est qu'un système de gestion des savoirs, alimenté localement et en lien avec les systèmes régionaux, nationaux et internationaux,

assure le mainstreaming de SLM.

Cette année, il s'agit pour le projet d'évaluer l'état des connaissances en SLM et en LD à travers un sondage sur les connaissances. Le projet mettra en œuvre les actions de communication prioritaires dans le plan de communication présenté au COPIL 2012. Le plan de gestion des savoirs sera affiné et enrichi avec les connaissances récoltées durant la première année de test du modèle et cette année, le projet cherchera à établir des liens plus concrets entre le système de gestion des savoirs du projet avec les autres systèmes au niveau régional (à identifier), au niveau national (WWF et PNUD) et au niveau international (TerrAfrica).

Date de début : Juillet 2010 Date de fin : Mai 2015

% Progression jusqu'à ce jour : 30%

Résultats des activités				
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Des opportunités sont offertes aux paysans et acteurs locaux pour produire et échanger les savoirs en matière de SLM	30/03/13	L'échange de savoirs se passe surtout entre les membres des groupements de paysans. Au moins 2 fois par semaine, ces paysans ont ce genre d'échange. En mai, des séances d'animations seront organisées autour des parcelles de test et démonstration pour des échanges externes. Date : 15/03/13 – score : 7	Conforme au budget 30/03/13 6	30/03/13 7.5
Des opportunités sont offertes pour que les paysans et acteurs locaux bénéficient des savoirs d'ailleurs à leur portée	30/03/13	Les paysans sont satisfaits car depuis l'existence du projet, ils ont appris beaucoup de choses/technologies nouvelles sur l'Agriculture à travers les agents de terrain, les documents, les projections de films, etc. Date : 30/03/13 – score : 7	Conforme au budget 30/03/13 3	30/03/13 7.5

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4-4.2-3-4

Longue description : Les programmes de vulgarisation sont révisés pour intégrer des pratiques agricoles et gestion d'élevage améliorées et les capacités pour diffuser les programmes révisés sont renforcées

Disposer d'un inventaire analytique des programmes de vulgarisation agricole et d'élevage dans les régions et développer des actions pour y intégrer les principes SLM et les techniques d'agriculture et d'élevage améliorées.

Il s'agit d'inventorier et d'analyser les différents programmes de vulgarisation qui peuvent exister dans la zone du projet et éventuellement dans les 2 régions touchées et s'il y a lieu de les améliorer, proposer aux responsables et acteurs de vulgarisation les actions d'amélioration à travers le renforcement



de capacité.

Date de début : Janvier 2013 Date de fin : Mai 2015  
% Progression jusqu'à ce jour : 10%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Les responsables et acteurs de vulgarisation présentent une bonne volonté de collaborer avec le projet	Juillet 2013			

## Section 2. Progression des produits

**Project ID :** 4-4-2.4

**Description :** Le projet est géré avec efficience et un bon ratio coût/efficacite grâce à une gestion adaptative et un bon système de suivi-évaluation

**Longue description :**

**Baseline [Année]:** 0 (2012)

**Indicateurs :** Taux de réalisation physique et financière

**Cibles 2013 :** 100%

**Etat d'avancement:** Réalisation physique : 34.2% - Taux de réalisation financière : 11.8%

### Section 3. Réalisation des activités

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.4.1

Longue description : L'unité de gestion est opérationnelle.

Il s'agira pour le projet de recruter un 3<sup>ème</sup> consultant agent de terrain à baser à Marolinta, de continuer à rendre l'unité de gestion opérationnelle, de tenir la réunion du COPIL en septembre 2013, d'analyser dès le premier trimestre les résultats obtenus en relation au coût du projet afin d'améliorer et mettre en œuvre la gestion efficace et adaptative du projet.

Date de début : Juillet 2010 Date de fin : Fin du projet

% Progression jusqu'à ce jour : 25%

Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Résultats des activités		
		Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Le staff dispose des moyens (matérielles, connaissances, temps, etc.) pour mettre en œuvre les actions planifiées pour cette année	30/03/13	Le staff est satisfait des moyens matériels à leur disposition sauf le temps de réaliser les activités car il y en beaucoup trop Date : 30/03/13 – score : 7	Conforme au budget 7	30/03/13 6
Le projet est coût-efficient, sinon adapte sa gestion vers la coût-efficience	30/03/13	Le projet cherche toujours à améliorer sa manière de mener le projet pour que celui-ci soit coût-efficient Date : 15/03/13 – Score : 7	Supérieur au budget 5	30/03/13 7
Les membres du COPIL visitent les actions sur terrain au moins une fois dans l'année	Septembre 2013			

Identifiant de l'activité (Activity ID) : 4.4.2.4.2

Longue description : Un système d'apprentissage global est développé et utilisé pour appuyer la gestion adaptative du projet

Les aspects genre et les personnes vulnérables dans la zone d'action sont identifiés et analysés et considérés dans la mise en œuvre du projet. Le projet dispose d'une stratégie d'apprentissage claire et d'un plan de suivi évaluation adapté.


Considérant les propositions lors du PIR, la revue conjointe et le COPIL 2012, le plan de suivi évaluation du projet (ainsi que le cadre logique) sera finalisé.

Les actions de suivi évaluation planifiées pour cette année seront menées (Evaluation à mi-parcours, PIR, etc.).

Le projet finalisera l'identification des personnes vulnérables en établissant une typologie basée sur la sécurité alimentaire et un consultant sociologue travaillera sur les aspects genre.

Date de début : Juillet 2010 Date de fin : Mai 2015  
 % Progression jusqu'à ce jour : 52%

		Résultats des activités		
Critères de qualité	Date de mesure de la qualité	Avis des bénéficiaires (date et score)	Utilisation des ressources (date et score)	Respect des délais (date et score)
Des indicateurs réalistes qui cadrent avec ce que le projet fait seront suivis à travers le plan de suivi évaluation du projet	30/03/13	La confusion sur les indicateurs finaux pour évaluer le projet n'est pas toujours levée. Seulement, les parties prenantes s'entendent maintenant que les indicateurs doivent être revus une fois (au démarrage du projet). Le projet peut proposer au COPIL les indicateurs pour approbation  Date : 30/03/13 – score : 4	Conforme au budget 30/03/13 6	30/03/13 2
L'évaluation à mi-parcours est menée de manière constructive et apporte les orientations stratégiques nécessaires pour l'atteinte des objectifs	Mai 2013			
Le projet tient compte de l'aspect genre et intègre les personnes vulnérables parmi ses bénéficiaires	30/03/13	La typologie des paysans ciblés sont par leur capacité de subvenir à leur alimentation et par genre. Le projet offre une opportunité aux vulnérables, aux femmes et aux jeunes de bénéficier du projet  Date : 30/03/13 – score : 8	Inférieur au budget 5	30/03/13 7

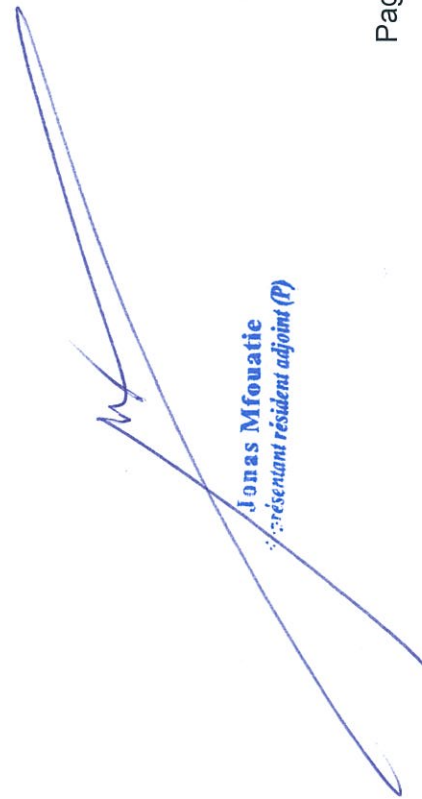

**Jonas Mfouatie**  
 Présentant résident adjoint (P)



**Simon RAFANOMEZANTSOA**  
 Terrestrial Programme Coordinator
