

# Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD

País: Nicaragua

## Documento de Proyecto

**Título de Proyecto:**

**Respuesta a Emergencia Huracán Ida**

**Resultados UNDAF:**

El Estado, la comunidad, los agentes económicos y las personas han mejorado sus capacidades para reducir las vulnerabilidades y revertir la degradación ambiental y promover el DHS.

**Resultados esperados CP:**

Fortalecidas las capacidades institucionales, sectoriales y de la población, a todos los niveles, para la prevención, mitigación, atención y rehabilitación por desastres y emergencias (gestión de riesgos)

**Productos Esperados:**

Durante las fases de respuesta a desastres y/o emergencias y rehabilitación, familias y comunidades afectadas reciben tratamiento integral de emergencia, considerando sus necesidades particulares, la protección de sus derechos y asegurando un enfoque de derecho humanitario (apoyo alimentario, atención de salud, servicios escolares de emergencia, agua potable, entre otros).

**Socios:**

SE SINAPRED-Gobiernos Regionales RAAN y RAAS

**Breve descripción del proyecto**

El proyecto atenderá las funciones de coordinación, evaluación de necesidades, planificación de la recuperación y logística para la respuesta a la emergencia causada por el huracán Ida, que afectó la Costa Caribe de Nicaragua.

Período del Programa:	2008-2012	Presupuesto AWP 2010:	\$110,791.50
Componente del Programa:	Ambiente, Energía y Gestión de Riesgos	USD	
Identificación del proyecto:	Award 58772	Total recursos requeridos:	\$119,000 USD
Fecha de inicio:	20-11-2009	Total de recursos asignados:	\$119,000 USD
Fecha de finalización:	30-11-2010	Presupuesto total:	<b>\$119,000 USD</b>
Duración del proyecto:	1 año	• UNDP Trac 3:	\$100,000 USD
Acuerdo de gestión:	DIM	• UNFPA:	\$ 19,000 USD
		Presupuesto no financiado:	
		Contribuciones en especie:	

Acordado por:  
PNUD:

  
**Claudio Tomasi**, Representante Residente Adjunto

Fecha: 3 FEB 2010





Award id 00058772  
Proyecto NIC10-00073167

## ***Respuesta a Emergencia Huracán Ida***

### *Breve descripción del proyecto*

El proyecto atenderá las funciones de coordinación, evaluación de necesidades, planificación de la recuperación y logística para la respuesta a la emergencia causada por el huracán Ida, que afectó la Costa Caribe de Nicaragua.

Diciembre 2009


## GLOSARIO

<b>CCF</b>	Country Cooperation Framework
<b>CERF</b>	Central Emergency Response Fund
<b>EMNV</b>	Encuesta Medición de Nivel de Vida
<b>IDH</b>	Informe de Desarrollo Humano
<b>OPS/OMS</b>	Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud
<b>RAAN</b>	Región Autónoma del Atlántico Norte
<b>SINAPRED</b>	Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres
<b>SNU</b>	Sistema de Naciones Unidas
<b>SUMA</b>	Sistema de Manejo Suministros Humanitarios (Humanitarian Supply Management System)
<b>UNCT</b>	United Nations Country Team
<b>UNDMT</b>	United Nations Disaster Manager Team
<b>UNETE</b>	United Nations Emergency Team
<b>MYFF</b>	Multi Year Funding Framework


## SECCIÓN I—CONTEXTO GENERAL

### Parte I. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

El Huracán Ida de Categoría 1 impactó el día 6 de noviembre a las 09:00 hora local aproximadamente en las coordenadas 13.1° Latitud Norte y 83.7° Longitud Oeste, aproximadamente a 126 km al Norte de Bluefields y a 112 km al Sur de Puerto Cabezas, con una presión central de 987 HPa y vientos máximos sostenidos de 120 kph con ráfagas mayores.

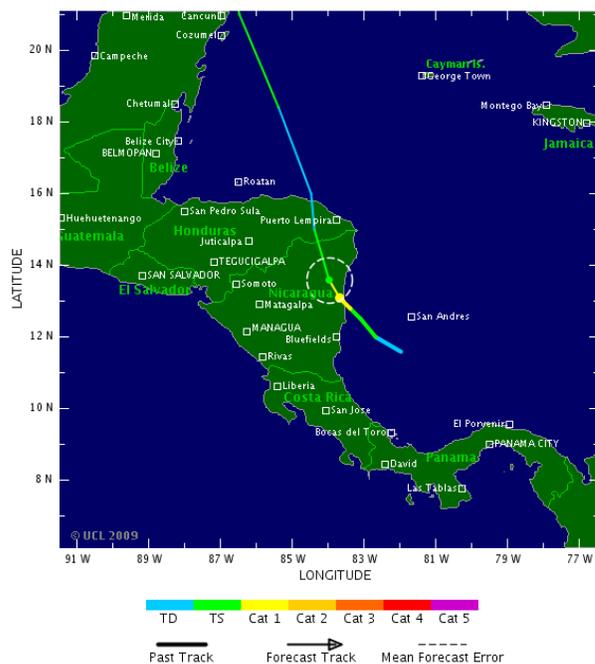

Las zonas afectadas por el fenómeno se localizan en la Región Autónoma del Atlántico norte y sur, principalmente en los municipios de la desembocadura de la Cruz de río grande, Corn Island, el Tortuguero, Laguna de Perlas, Kukra Hill en la región del atlántico sur y los municipios de Puerto Cabezas, Prinzapolka y Rosita en la región del atlántico norte.

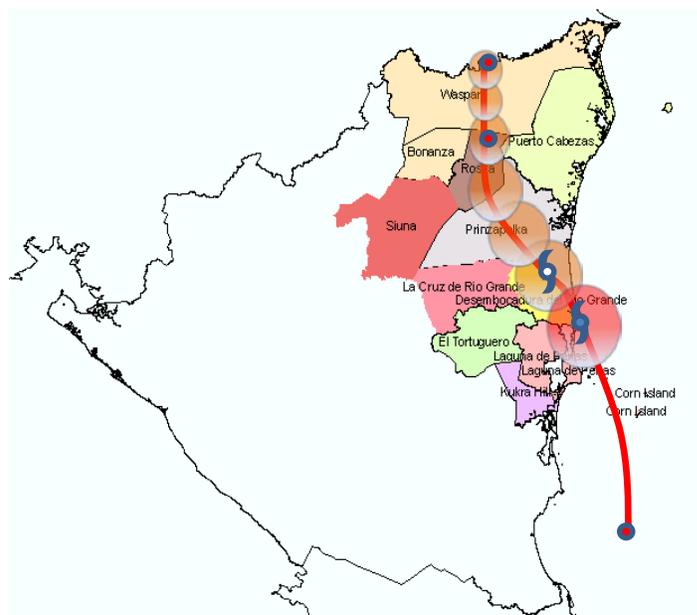

Trayectoria del Huracán Ida

El transporte aéreo fue suspendido y activaron 13 albergues con un total de 1,521 personas albergadas en las Comunidades de Los Cayos Miskitos, Sandy Bay, Kara, Walpa y Corn Island.

El Gobierno de Nicaragua decretó los distintos niveles de alerta que permitieron preservar la vida de muchos ciudadanos. El 23 de noviembre se declaró Estado de Desastre en los siguientes municipios de la Región Autónoma del Atlántico Sur (**RAAS**): Municipio de Desembocadura del Río Grande de Matagalpa, Laguna de Perlas y de El Tortuguero. Y en la Región Autónoma del Atlántico Norte (**RAAN**), en los municipios de Prinzapolka, Rosita, Waspan, (Comunidades de Río Coco Abajo y Llanos aledaños y La parte Sur-Oeste del municipio de Bilwi Comunidades de Tasba Pri, y Llano Sur)

Los datos de Evaluación de Daños preliminares realizado por el SINAPRED estima una población de 30,000 personas afectadas.

El SINAPRED activó los Grupos de Trabajo Sectorial que se articularon con las agencias que conforman el Sistema de Naciones Unidas para abordar las necesidades demandadas del territorio en materia de suministros humanitarios, nutrición y alimentación, agua y saneamiento, viviendas, albergues e infraestructura.

En coordinación con el Gobierno de Nicaragua, se convocó a la red humanitaria para compartir la evaluación de daños y las necesidades de las comunidades.

El Coordinador Humanitario activó al UNCT, UNDMT y el UNETE para coordinar la respuesta necesaria ante el evento. Se sostuvieron reuniones de coordinación, monitoreo e información del evento y el análisis de los daños esperados en la zona de impacto en cada una de las alertas emitidas por el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED).

Para la atención a la emergencia ocasionada por el Huracán Ida, se implementó el Plan Interagencial de Respuesta a Emergencias y se inician las reuniones Sectoriales (Clusters) como Agua y Saneamiento, Albergues, Salud, Telecomunicaciones y Logística. Desde el momento de las declaratorias de alertas el Coordinador Humanitario realizó visita a las instalaciones de SINAPRED para brindar su apoyo en la respuesta y para realizar las coordinaciones necesarias para la respuesta por sectores (Clusters) con los Grupos de Trabajo Sectorial.

El Sistema de Naciones Unidas y otros socios, prepararon una propuesta para el Fondo Central de Respuesta a las Emergencias (CERF) obteniéndose un monto de cerca de 2 millones de dólares.

## **Parte II. ESTRATEGIA**

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del SINAPRED ha asumido el liderazgo en la respuesta nacional a la emergencia. El Sistema de las Naciones Unidas apoya los esfuerzos del Gobierno en la coordinación de la respuesta, así como de la cooperación internacional.

Durante la primera fase de la respuesta a la emergencia, el PNUD apoyará los esfuerzos de coordinación, así como la logística necesaria para asegurar el transporte del personal de gobierno y del SNU, de insumos de emergencia a las comunidades afectadas. Igualmente apoyará las capacidades para la respuesta y la rehabilitación en la región.

### **OBJETIVO GENERAL:**

Facilitar la coordinación de la respuesta del Sistema de Naciones Unidas y del Gobierno de Nicaragua a la emergencia ocasionada por el huracán Ida en las comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua y sentar las bases para el proceso de recuperación.

### **RESULTADOS:**

1. Facilitado el trabajo de coordinación de la cooperación internacional y el Gobierno de Nicaragua para la gestión de recursos para la atención a la emergencia.
2. Fortalecidas las capacidades de respuesta en las zonas afectadas.

### **ACTIVIDADES**

1.1 Acciones de coordinación del Sistema de las Naciones Unidas, el Gobierno de Nicaragua y la comunidad cooperante

1.2 Transporte de personal e insumos a las regiones afectadas

1.3 Atención puntual a necesidades demandadas por las autoridades regionales y nacionales (proveer de insumos, transporte, etc.)

1.4 Evaluación de daños y necesidades

2.1 Evaluación de vacíos e implementación de un plan de fortalecimiento de capacidades

## **Parte III. ACUERDOS DE GESTIÓN**

El proyecto, tendrá una duración de un año y será ejecutado bajo la modalidad de ejecución directa (DEX). El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se responsabilizará por la dirección del proyecto, el cumplimiento de los objetivos y resultados previstos y el uso eficaz y eficiente de los recursos asignados de acuerdo con este documento de proyecto.

El PNUD, en su rol de administrador de fondos, se responsabilizará ante el Administrador de la Organización por asegurar el uso de los recursos de acuerdo con los objetivos del documento de proyecto y respetando los principios rectores del PNUD: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y competitividad.

#### **Parte IV. MONITOREO Y EVALUACIÓN**

El proyecto presentará un informe final al concluir, conteniendo una descripción detallada de las actividades realizadas, así como un informe financiero.

#### **Parte V. CONTEXTO LEGAL**

Este documento de proyecto suscrito entre el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), constituye un acuerdo legal obligatorio entre las partes y será el instrumento a que se refiere el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo de Asistencia Básica firmado entre el Gobierno de Nicaragua y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el día 4 de mayo del 1978.

Así mismo, como estipulado en los Artículos I y II del Convenio Básico, ratificado por medio de Nota Verbal del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 24 de enero de 2003, a solicitud del Organismo de Ejecución, el PNUD podrá brindar servicios de apoyo para actividades de ejecución e implementación.

## SECCIÓN II – MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS

<b>Resultado:</b> Fortalecidas las capacidades institucionales, sectoriales y de la población, a todos los niveles, para la prevención, mitigación, atención y rehabilitación por desastres y emergencias (gestión de riesgos)			
<b>Línea de servicio MYFF que se aplica:</b> 4.5 Gestión de riesgos			
<b>Estrategia de asociación:</b> Se realizará en estrecho contacto con SINAPRED			
<b>Nombre e identificación del Proyecto:</b> Respuesta a la emergencia huracán Ida			
<b>OBJETIVOS</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>Actividades</b>	<b>Aportes</b>
Facilitar la coordinación de la respuesta del Sistema de Naciones Unidas y del Gobierno de Nicaragua a la emergencia ocasionada por el huracán Ida en las comunidades de la Costa Caribe de Nicaragua y sentar las bases para el proceso de recuperación.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Facilitado el trabajo de coordinación para la gestión de recursos para la atención a la emergencia.</li> <li>2. Fortalecidas las capacidades de respuesta en las zonas afectadas.</li> </ol>	1.1 Acciones de coordinación del Sistema de las Naciones Unidas, el Gobierno de Nicaragua y la comunidad cooperante	US\$35,000
		1.2 Transporte de personal e insumos a las regiones afectadas	US\$35,000
		1.3 Atención puntual a necesidades demandadas por las autoridades regionales y nacionales (proveer de insumos, transporte, etc.)	
		1.4 Evaluación de daños y necesidades	
		2.1 Evaluación de vacíos e implementación de un plan de fortalecimiento de capacidades.	US\$30,000
