

**Background:** This country reporting framework has been developed following the structure of the FCPF Monitoring and Evaluation Framework, its logical framework and Performance Measurement Framework (PMF), so as to facilitate and systematize the data analysis. The semi-annual country reporting should provide the FCPF's Facility Management Team (FMT) with indications of REDD+ countries' progress towards the achievement of their readiness activities and the implementation of their Emission Reductions programs overtime, in a way that data are easily consolidated and provide indications on the level of achievement of the FCPF output, outcome and impact indicators as defined in the FCPF M&E Framework.

**Report preparation:** Submitted country reports should draw upon the country M&E system for REDD + (component 6 of R-PP) and should be prepared in consultation with members of REDD task force or equivalent body. Inputs from stakeholders including IPs and CSOs should be integrated into national reporting, and divergent views indicative of lack of consensus on specific issues should be recorded in the country report.

**Reporting schedule:** It is expected that the annual progress country reporting will be submitted to the FMT by August 15<sup>th</sup> each year. The reporting should be based on a self-assessment of progress. An update of this country reporting will also be submitted by March 15<sup>th</sup> each year.

---

## 1. SUMMARY OF REPORT

This section should provide a short description of FCPF support in country (bullets on FCPF-financed activities only). Information should summarize progress, key achievements with a focus on higher level results and important issues/problems that arose during the reporting period. Highlights of next steps in following period should also be provided (key bullets only).

**SUMMARY:**

El presente informe reporta la implementación y ejecución presupuestaria durante el último periodo anual que comprende de enero a diciembre de 2017. Los avances, y resultados reportados en el marco de la "Propuesta de Preparación" (R-PP) como informe de país, se elaboró siguiendo la estructura indicada por el FCPF. El informe de país anual proporcionará a los Equipos de Gerencia del FCPF (FMT) los progresos realizados por REDD+ Panamá, hacia el logro de sus resultados en la ejecución de sus programas de reducción de emisiones.

Este informe reporta los avances y cumplimientos de los siguientes componentes, que conforman la propuesta de preparación REDD+ (R-PP):

- Componente 1: Organización y realización de consultas (Procesos de participación y consulta con actores clave, en especial, pueblos indígenas).
- Componente 2: Preparación de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá
- Componente 3: Desarrollo de Nivel Nacional de Referencia Forestal de Panamá.
- Componente 4: Diseño del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques y del Sistema Nacional de Información sobre las Salvaguardas.

A continuación, se resumen los avances de la preparación de REDD+ Panamá en este período:

1. *La participación activa de los actores clave, incluyendo once (11) de las doce (12) estructuras de los Congresos y Consejos Indígenas de Panamá, en la segunda fase de consolidación de REDD+ en Panamá, ha facilitado el proceso de consulta con actores clave de los 5 grupos diferenciados (pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, mujeres e instituciones públicas y privadas) hacia la elaboración del Borrador avanzado de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá.*
2. *En 2017 se apoyó la creación de la Comisión Técnica Indígena REDD+” que representan las Once (11) Estructuras de Congresos y Consejos de los Pueblos Indígenas de Panamá. La misma está integrada por 7 comisionados (as), que representan al Consejo Naso Tjerdi, Nación Emberá (Comarca Emberá-Wounaán, Tierras Colectivas Emberá-Wounaán y Tierras Colectivas Emberá de Alto Bayano), Comarca Ngäbe, Territorio Bribrí, Nación Guna (Comarca Madugandí, Comarca Wargandí y Territorio Tagargunyala), Comarca Buglé, y Territorio Wounnán. Su función es identificar los mecanismos de coordinación interinstitucional y las acciones que podrán ser atendidas a corto y mediano plazo, en el contexto de las aspiraciones de los pueblos indígenas en el tema REDD+, para la incorporación de sus aspiraciones en el Borrador avanzado de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá. Se elaboró un Plan de trabajo interinstitucional con el Ministerio de Ambiente y otras dependencias gubernamentales.*
3. *Como parte del proceso de consulta de REDD+ para el 2017 se realizaron 33 talleres a nivel nacional, regional y local en donde participaron 894 personas de los cuales 411 son mujeres (46%) y 483 a hombres (54%).*
4. *Se aplicaron mil Doscientas (1,200) encuestas a nivel nacional, “Sobre conocimientos de la población nacional en Cambio Climático, Estrategia Nacional REDD+, y la Alianza por el Millón de Hectáreas”.*
5. *Durante el año 2017 se establece y se ejecuta la hoja de ruta para transversalizar los temas de género en el proceso de REDD+ mediante tres fases para su futura implementación: Fase: preparándonos para incorporar género en REDD+; Fase 2: Desarrollando capacidades en REDD+ para la igualdad de género y Fase3: Gestionando conocimiento de igualdad de género y REDD+.*
6. *En junio de 2017 se realizó la Junta de Proyecto Anual, con la participación de los actores clave que tienen voz y voto: Dos representantes de los pueblos indígenas designados por las máximas autoridades de las comarcas y territorios indígenas, un (1) representante regional de las comunidades campesinas, afrodescendientes y los regionales.*
7. *Las actividades contempladas en la Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas coinciden plenamente con las 5 actividades de REDD+, **y como parte del Fondo Reforesta Panamá se cuenta con recursos financieros de 15 millones de dólares anuales, para iniciar una fase de implementación de acciones REDD+. El administrador fiduciario es el Banco Nacional de Panamá.***
8. ***Se aprueba la Ley 69 de 30 de octubre de 2017, que crea un programa de incentivos para la cobertura forestal y la conservación de bosques naturales, y dicta otras disposiciones.***
9. *Trece (13) Directores Regionales y 26 enlaces técnicos de REDD+ conocen de los resultados y avances en el marco del proceso de consolidación de la fase de preparación y la Estrategia Nacional REDD+, e incorporan acciones regionales al plan de trabajo 2017.*

10. Panamá procedió con la contratación de consultor de apoyo para el desarrollo de los Niveles de Referencia Forestal bajo el liderazgo de los técnicos de MIAMBIENTE, y con el apoyo de expertos de la Coalición de Países con Bosques Tropicales, y acompañamiento de los Gobiernos de Italia y Noruega, además de la asistencia de PNUD. Se definió la hoja de ruta para la construcción, presentación y evaluación técnica del Nivel de Referencia Forestal de Panamá, en el marco de la Convención.
11. En materia de capacitación técnica en temas de REDD+ se tiene lo siguiente:
- Seis (6) Técnicas y 14 Técnicos de MIAMBIENTE fortalecieron sus capacidades en el uso de metodologías, presentación y evaluación técnica del Nivel de Referencia Forestal de Panamá. Veinte (20) técnicos regionales, académicos, ONG y Gubernamental realizan la recolección de datos UTCUTS 1990-2016 para el proceso de construcción del NRF de Panamá, denominado localmente MAPATON1.
  - Dos (2) técnicos de MIAMBIENTE cuentan con conocimientos técnicos en el uso de herramientas Collect Earth para el inicio de la construcción de los Niveles de Referencia Forestal, el proceso de capacitación se realizó en FAO – ROMA.
  - Cinco (5), representantes de los pueblos indígenas fortalecen sus capacidades sobre el uso de software SIBP2 para aplicarlos en el desarrollo del Inventario Nacional Forestal y de carbono.
  - Treinta y un (31) guardaparques de MIAMBIENTE cuentan con nuevos conocimientos para el monitoreo del uso y cambio de uso de la tierra a nivel regional y nacional en Panamá.
  - Treinta y siete (37) técnicos de MIAMBIENTE cuenta con nuevos conocimientos para el monitoreo del uso y cambio de uso de la tierra a nivel regional y nacional en Panamá.
  - Diecisiete (17) funcionarios(a) de MIAMBIENTE cuentan con nuevos conocimientos para el levantamiento de inventarios forestales y de carbono.
12. Se han finalizado y sistematizado 54 unidades de muestreo levantadas en el marco del inventario nacional forestal y de carbono, con el concepto favorable de los propietarios de fincas. También se ha planificado el levantamiento de las parcelas de muestreo del inventario nacional forestal y de carbono en los territorios indígenas, con la debida coordinación con las autoridades comarcales.
13. Panamá avanza en la implementación del Programa “Bosques de Vida” a través del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) de PNUD-Panamá, que inició con un fondo semilla del Programa ONUREDD en 2015, para apoyar a pueblos indígenas y comunidades que viven en los bosques a participar en los procesos nacionales para frenar la deforestación y degradación de los bosques. Quince organizaciones de base comunitaria trabajan en cuatro comarcas indígenas y cuatro provincias en Panamá con un objetivo en común: ser guardianes de los bosques y revertir la deforestación en sus territorios, pues dependen de ellos como medios de vida y sustento. Mediante el programa se promueven técnicas sostenibles donde la agroforestería complementa la protección de las fuentes de agua y las riberas de los ríos, y el rescate de técnicas tradicionales que se transforman en agricultura orgánica y soberanía alimentaria. En octubre de 2017 se firmó un Grant con la Fundación Almanaque Azul para el **“Fortalecimiento de capacidades de organizaciones de base comunitaria en temas REDD+ prioritarios para Panamá en el marco de la consolidación de la fase de preparación REDD+ en Panamá, con fondos del FCPF**. El proyecto abarca cuatro áreas y trabaja con cuatro organizaciones de base comunitaria que ya participaron en el Programa Bosques de Vida con el PPD. En la Provincia Bocas del Toro con Coobana, la organización Klujitra (médicos botánicos) y en las comunidades de Nueva Esperanza y en la Finca El Águila en Renacimiento. En la Comarca Ngäbe-Buglé trabaja con ACUN en la comunidad de Cerro Flores. En Darién trabaja en la comunidad de Jaqué con el Grupo de Conservación de Jaqué. En la Comarca Emberá-Wounaan trabaja con el Comité de Agua de la comunidad de Puerto Indio.

---

<sup>1</sup> Conjunto de datos, mapeo colectivo a través del Collect Earth.

14. Se cuenta con un diagnóstico y las recomendaciones concretas para la adopción de un enfoque nacional de salvaguardas y el diseño de un sistema de información de salvaguardas (SIS); se revisan los esquemas actuales de flujo de información para la contratación de consultorías para establecer el sistema.
15. La Asamblea Nacional de Diputados de Panamá ratificó el Acuerdo que constituye el Centro Internacional para la Implementación de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (ICIREDD), mediante la ley 44 del 4 de octubre de 2016. El Centro Internacional ICIREDD es inaugurado oficialmente el 31 de marzo del 2017, con la presencia de la Señora Patricia Espinoza, Secretaria Ejecutiva de UNFCCC y del Presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela. ICIREDD será la sede del Panamá Emission Trading Facility.

Vale indicar que el proyecto de “Consolidación de la Fase preparatoria de REDD+ Panamá” fue sometido a la evaluación de medio término en agosto de 2017 resultando 15 recomendaciones que fueron atendidas e implementadas, y en octubre 2017 se preparó el Reporte de Medio Término de REDD+ Panamá que permitió analizar los avances de la preparación REDD+ en Panamá, los problemas persistentes, los riesgos y las oportunidades; encontrando un avance en la implementación del mismo en un 55%. Posteriormente, se elaboró una Hoja de Ruta hacia la finalización de la fase de preparación de REDD+ Panamá y se presentó ante el Banco Mundial el R-PP actualizado al 2017, recibiendo el visto bueno por parte del Banco y del FCPF para avanzar en el proceso con una extensión sin costo del proyecto, hasta diciembre de 2018.

## 2. MAIN ACHIEVEMENTS AND RESULTS DURING THE PERIOD

The section below should provide qualitative and quantitative data on the progress towards expected results along the following subsections. Information is to be provided cumulatively. If the information requested is not available or not relevant at the time of the reporting, mention “does not apply – n/a”.

Desde el año 2009 el Ministerio de Ambiente (anteriormente ANAM) lidera y se apoya con diferentes iniciativas, durante la fase de preparación de REDD+ Panamá; desarrollando estudios específicos que sirven de línea base para la toma de decisiones, el desarrollo de capacidades y el proceso de consulta para la elaboración y validación de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá.

| Amount of non-FCPF investments received under R-PP process (FCPF M&E Framework Indicator I.2.B.i.): |                                    |
|---|------------------------------------|
| Source: Ministerio de Ambiente contrapartida 2016.  | Amount provided: USD 250, 000.00   |
| Source: Ministerio de Ambiente contrapartida 2017.  | Amount provided: USD 250,000.00    |
| Source: Ministerio de Ambiente contrapartida 2018.  | Amount provided: USD 230,000.00    |
| Source: UNREDD  | Amount Provided: USD 5,300,000.00  |
| Source: GoP (contrapartida del Ministerio de Ambiente durante programa UN REDD).                    | Amount Provided: USD 2, 164,783.00 |

| Amount of non-FCPF investments received under R-PP process (FCPF M&E Framework Indicator I.2.B.i.):   |  |
|---|--|
| <u>Source: PNUMA (apoyo específico)</u>   | Amount Provided: USD 250, 000,00.00        |
| <u>Source: FAO (apoyo específico)</u>   | Amount Provided: USD 180, 000,00.00        |
| <u>Source: Others</u>   | Amount Provided: USD 2, 0923,000           |
| <u>Bosques de Vida (Fondo Pequeñas Donaciones)</u>  | Amount Provided: USD 400,000.00            |
| <u>Fondo REFORESTA PANAMA</u>   | Amount Provided: USD 15,000,000.00 anuales |
| <u>Proyecto de Gobernanza Forestal de Panamá (OIMT, WWF, Panamá, Ministerio de Ambiente de Panamá)</u>  | Amount Provided: USD 616, 163.00           |
| <u>FAO</u>  | Amount Provided: USD 181,000.00            |
| <u>Source: Ministry for the Environment, Land and Sea of the Republic of Italy</u>  | Amount Provided: USD 450, 000.00           |
| Source: Gobierno de Noruega por medio de NORAD[1]<br>[1] Proyecto Reporting for Results-based REDD+ (RRR+), organismo ejecutor MIAMBIENTE y Coalición de Países con Bosques Tropicales (CFRN)       | Amount Provided: USD 381, 000.00           |
| Amount of non-FCPF investments received for implementation of activities relevant to ER Programs (e.g. FIP, bilateral donors, private sector), if relevant (FCPF M&E Framework Indicator I.2.B.i.): |  |
|   |  |
|   |  |

Describe how stakeholders are participating and engaging in REDD+ decision making processes (FCPF M&E Framework Indicator I.3.A):

Provide examples of how IPs and CSOs are represented in institutional arrangements for REDD at the national level.

1. Como parte del proceso de consulta de REDD+ para el 2017 se realizaron 33 talleres a nivel nacional, regional y local en donde participaron 894 personas de los cuales 411 son mujeres (46%) y 483 a hombres (54%).
2. En 2017 se realizaron 7 talleres de consulta con los actores clave pertenecientes a las organizaciones afrodescendientes y campesinos de 12 regiones del país, con un total de 268 personas.

El objetivo de estos talleres era identificar, de primera fuente, las necesidades de capacitación en temas de REDD+. Los resultados obtenidos que se muestran a continuación por región:

| Capacitaciones Priorizadas por Actores Clave y Región |                     |                            |                             |
|---|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Provincia/Región                                      | Priorización        |                            |                             |
|   | 1                   | 2                          | 3                           |
| Bocas del Toro  | Manejo de fincas    | Reforestación              | Viveros/abono orgánico      |
| Chiriquí  | Reforestación       | Manejo de viveros          | Recursos hídricos           |
| Herrera y Los Santos                                  | Educación ambiental | Manejo de desechos solidos | Sistemas silvopastoril      |
| Coclé y Veraguas                                      | Educación ambiental | Reforestación              | Conservación de bosques     |
| Panamá Metro, Oeste                                   | Seguridad hídrica   | Reforestación              | Educación ambiental         |
| Colon, Panamá Norte                                   | Leyes ambientales   | Conservación de cuencas    | Educación ambiental         |
| Darién y Panamá Este                                  | Educación ambiental | Aprovechamiento hídrico    | Manejo sostenible de fincas |

Los actores clave realizaron la ponderación de distintos temas en los talleres, agrupados de acuerdo con las regiones de planificación del país; resaltando que **la Educación Ambiental** es la capacitación más relevante, seguida de la **Reforestación, la Seguridad Hídrica y acciones de Manejo de Fincas**, como resalta en el cuadro siguiente:

| Capacitaciones Priorizadas por Actores Clave y Región |                     |                         |                             |
|---|---------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Región  | Priorización        |                         |                             |
|   | 1                   | 2                       | 3                           |
| Occidental  | Manejo de Fincas    | Reforestación           | Manejo de Viveros           |
| Central   | Educación ambiental | Reforestación           | Sistemas silvopastoril      |
| Metropolitana   | Seguridad hídrica   | Reforestación           | Educación ambiental         |
| Oriental  | Educación ambiental | Aprovechamiento hídrico | Manejo sostenible de fincas |

3. El Comité Técnico Indígena en conjunto con el personal técnico del proyecto desarrolló una nueva propuesta con 12 puntos y lineamientos para ser integrados dentro de la Estrategia Nacional REDD+. A continuación, se nombran los 12 puntos a saber:
- a. Seguridad jurídica territorial-documento de lineamiento
  - b. Fortalecimiento de los congresos y consejos generales indígenas.
  - c. Capacitación de Técnicos profesionales indígenas y científicos tradicionales
  - d. Plan de participación de pueblos indígenas en todos los procesos REDD+
  - e. Consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas, utilizando sus mecanismos propios.
  - f. Administración de los bosques: actividades forestales deben tener el aval de los PPII.
  - g. Establecer monitoreo y evaluación permanente de las acciones que se vayan a desarrollar sobre REDD+ en los pueblos indígenas.
  - h. Valorar los derechos colectivos a la tierra y a los recursos naturales de los PPII en la ENREDD+.
  - i. El desarrollo del buen vivir/Distribución equitativa de los beneficios
  - j. Gestión ambiental/Protección de la madre tierra y recursos naturales
  - k. Brindar especial atención al tema de la Protección de las Plantas Medicinales
  - l. Reconocimiento y validación de los instrumentos metodológicos de Balu Wala para el proceso de los pueblos indígenas.

Examples of stakeholder engagement platforms in country which meet regularly to discuss and provide inputs to the REDD+ readiness process (FCPF M&E Framework 3.2.a.):

|  |  |
|--|--|
| <p><u>Frequency:</u> Mensualmente, se realizan reuniones del Comité Nacional de Cambio Climático, donde se aborda el tema de REDD+ en reuniones específicas.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avances de la ENREDD+ Panamá son analizados y presenta la agenda climática del País, en el marco de las reuniones del Comité Nacional de Cambio Climático de Panamá (CONACCP), con el propósito de asegurarse en el cumplimiento y la finalización de esta segunda etapa de consolidación de REDD+ Panamá. El Comité aborda diferentes tópicos en sus reuniones mensuales y la Reunión 21 de septiembre de 2017</li> </ul> <p>Asistentes: 28 personas (19 miembros el CONACCP)</p> <p>La Unidad de Cambio Climático presentó los avances de la Estrategia Nacional REDD+, donde se espera que para fines del año 2017, el país cuente con los cuatro elementos fundamentales de REDD+ para optar por el pago por resultados: a) un documento de Estrategia Nacional REDD+, elaborado de manera participativa, integrando la visión de los diferentes actores, en la cual se consideren las particularidades de las diferentes regiones y territorios del país; b) un Sistema de Monitoreo de Bosques implementado, que permita informar periódicamente, de manera robusta y transparente, sobre la dinámica de la cobertura boscosa y uso del suelo en el territorio nacional; c) un Sistema de Información de Salvaguardas operando, para reportar la forma cómo se atienden y respetan las salvaguardas ambientales y sociales; y d) un Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) o un Nivel de Referencia Forestal (NRF), presentado ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, como punto de referencia para evaluar el rendimiento del país en sus esfuerzos de implementación de sus actividades REDD+.</p> |
| <p>Comité Técnico Indígena</p> <p>Mesa Nacional REDD+ Panamá</p>   | <p>El Comité Técnico Indígena participó a lo largo de un proceso diseñado específicamente para que pudieran trabajar sus prioridades hasta entregar el documento con los 12 puntos consensuados que resumen las aspiraciones de los pueblos indígenas, respecto al contenido de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá.</p> <p>Se planea convocar la Mesa en junio de 2018 para la validación de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá.</p>   |

**Examples of resources made available to enable active participation of IPs, CSOs and local communities in national REDD+ readiness:**

Ochenta y seis mil ochocientos setenta y siete dólares con cincuenta y tres centavos (USD 86, 877.53) se han invertido a la fecha, en los procesos de diálogo, acuerdos, y planificación con las 11 Estructuras indígenas para el proceso de consolidación de la Estrategia Nacional REDD+ en Panamá, en las siguientes actividades:

| NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  | FECHAS     | LUGAR  | EVIDENCIAS   |
|---|------------|--|--|
| 4ª Reunión con la comisión técnica indígenas: planificación del proceso metodológico de los 19 puntos             | 17/02/2017 | Salón de reuniones de la Unidad de Cambio Climático, MiAMBIENTE, Albrook | Minuta, lista de asistencia y fotos.                     |
| 5ª Reunión con la comisión técnica indígenas: integración de 12 de los 19 puntos a la ENREDD+                     | 22/03/2017 | Country Inn & Suites by Radisson, Panamá                                 | Minuta, lista de asistencia y fotos.                     |
|   | 23/03/2017 |  |  |
| 6ª Reunión con la comisión técnica indígenas: planificación y monitoreo   | 11/03/2017 | HOTEL WYNDHAM, ciudad de Panamá.   | Minuta, lista de asistencia y fotos.                     |
|   | 12/03/2017 |  |  |
| 7ª Reunión con la comisión técnica indígenas: elaboración de cronograma de trabajo de los 12 lineamientos         | 10/05/2017 | HOTEL WYNDHAM, ciudad de Panamá.   | Minuta, lista de asistencia y fotos.                     |
| <b>1ª Reunión con las autoridades tradicionales y la comisión técnica indígena: reporte de avances.</b>           | 11/05/2017 | HOTEL WYNDHAM, ciudad de Panamá.   | Nota de invitación, minuta, lista de asistencia y fotos. |
| 8ª Reunión con la comisión técnica indígenas: desarrollo del primer documento de lineamiento                      | 22/05/2017 | Salón de reuniones de ICIREDD, Parque Metropolitano                      | Minuta, lista de asistencia y fotos.                     |
|   | 23/05/2017 |  |  |
|   | 24/05/2017 |  |  |
| 9ª Reunión con la comisión técnica indígenas: desarrollo del segundo y tercer documento de lineamiento            | 31/05/2017 | Salón de reuniones de ICIREDD, Parque Metropolitano                      | Minuta, lista de asistencia y fotos.                     |
|   | 01/06/2017 |  |  |
| <b>1ª Reunión Interinstitucional de las autoridades tradicionales y la CTI con altas autoridades del gobierno</b> | 02/06/2017 | HOTEL WYNDHAM, ciudad de Panamá.   | Nota de invitación, minuta, lista de asistencia y fotos. |
| 10ª Reunión con la comisión técnica   | 12/06/2017 | Salón de reuniones de ICIREDD,   | Minuta, lista de asistencia y fotos.                     |

|  |            |   |  |
|--|------------|---|--|
| indígenas: desarrollo del 4º, 5º, 6º, 7º y 8º documento de lineamiento   | 13/06/2017 | Parque Metropolitano                                |  |
|  | 14/06/2017 |   |  |
| <b>1ª Reunión de la CTI Ampliada con altas autoridades del gobierno</b>  | 15/06/2017 | Salón de reuniones de ICIREDD, Parque Metropolitano | Minuta, lista de asistencia y fotos.                     |
|  | 16/06/2017 |   |  |
| 11ª Reunión con la comisión técnica indígenas: desarrollo del 9º, 10º, 11º y 12º documento de lineamiento  | 26/06/2017 | Salón de reuniones de ICIREDD, Parque Metropolitano | Minuta, lista de asistencia y fotos.                     |
|  | 27/06/2017 |   |  |
|  | 28/06/2017 |   |  |
| <b>2ª Reunión con las autoridades tradicionales y la comisión técnica indígena</b>   | 05/07/2017 | HOTEL WYNDHAM, ciudad de Panamá.                    | Nota de invitación, minuta, lista de asistencia y fotos. |
|  | 06/07/2017 |   |  |
| 12ª Reunión con la comisión técnica indígenas: revisión de 5 documentos de lineamiento.  | 19/07/2017 | Salón de reuniones de ICIREDD, Parque Metropolitano | Minuta, lista de asistencia y fotos.                     |
| <b>3ª Reunión con las autoridades tradicionales y la comisión técnica indígena: revisión, consenso y aprobación de los 12 documentos de lineamiento para ser incluidos en la ENREDD+</b> | 20/07/2017 | HOTEL WYNDHAM, ciudad de Panamá.                    | Nota de invitación, minuta, lista de asistencia y fotos. |
|  | 21/07/2017 |   |  |


Proceso cronológico REDD+ Pueblos Indígenas:



Actividades realizadas con los Pueblos Indígenas

Consolidación de la fase de preparación para la Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques (REDD+) en

Panamá

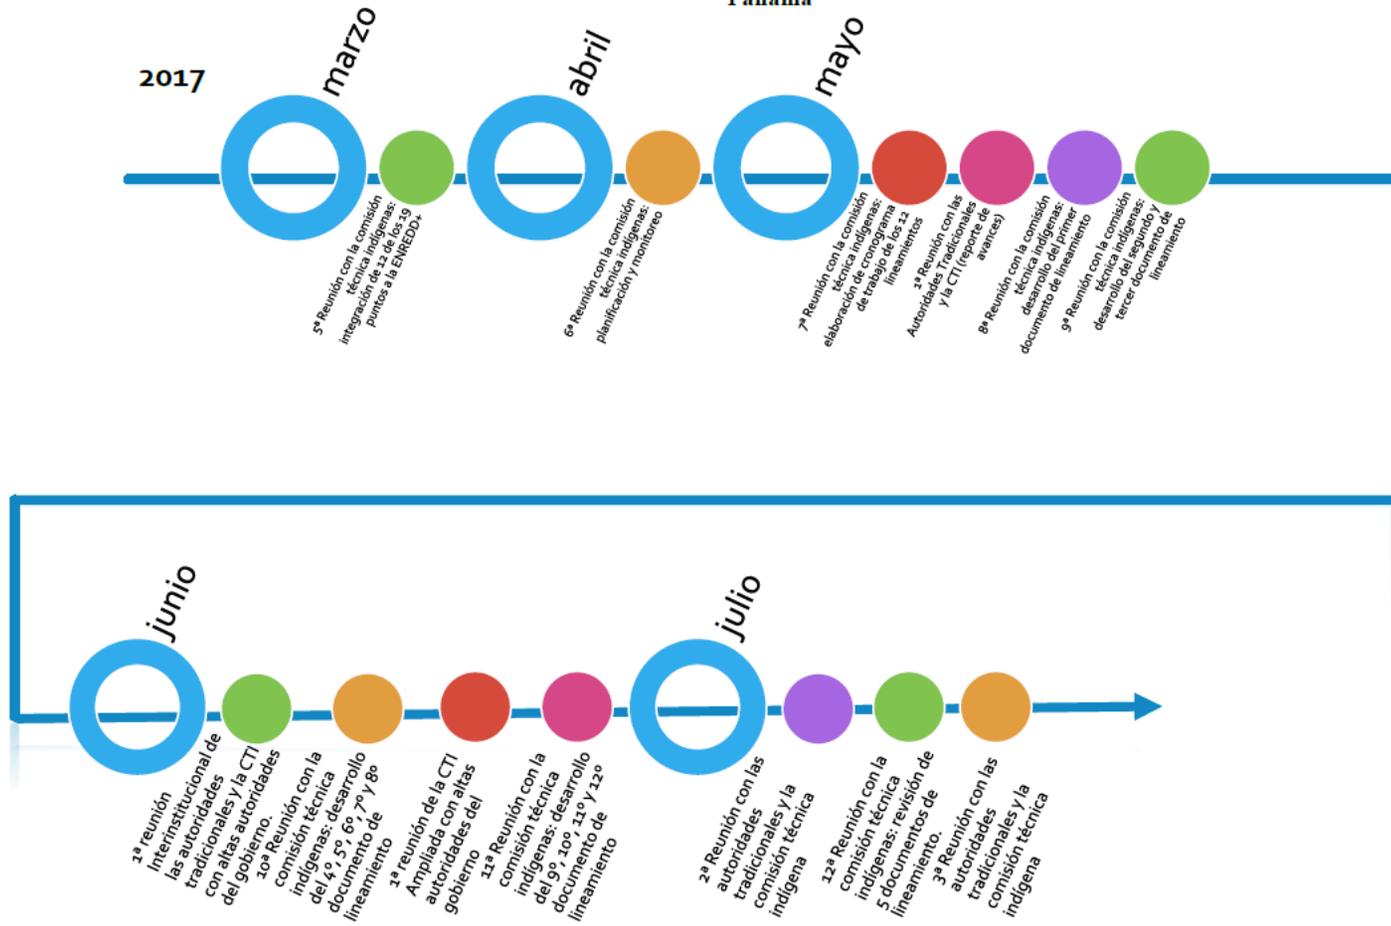

**Number and type of policy reforms initiated, completed or underway complying to REDD+ standards, if any (FCPF M&E Framework Indicator I.3.B.):**

**Number of policy reforms during the reporting period that are:**

**Underway:**

**Completed:**

1. **Ley 69 de 30 de octubre de 2017, que crea un programa de incentivos para la cobertura forestal y la conservación de bosques naturales, y dicta otras disposiciones**, publicada en gaceta oficial número 28397-C. Actualmente, MiAMBIENTE está desarrollando la propuesta de reglamentación, con base en lo establecido en el artículo 34 de la Ley en mención, al establecer: *“El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley, a través del Ministerio de Ambiente, en un término no mayor de ciento ochenta días calendarios, contado a partir de su promulgación”*.

**Please describe these policy reforms:**

1. **Ley 69 de 30 de octubre de 2017, que crea un programa de incentivos para la cobertura forestal y la conservación de bosques naturales, y dicta otras disposiciones**, que crea el programa de incentivos para la cobertura forestal y conservación de bosques naturales, a fin de consolidar la Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El programa de incentivos forestales beneficia actividades como la protección, restauración y conservación de bosques naturales; recuperación natural asistida; sistemas de agroforestales, silvopastoriles (bosques y ganado) y silvoagrícolas (bosques y siembras de productos). Además, manejo forestal sostenible y plantaciones comerciales; así como procesamiento de productos forestales maderables y no maderables.

**Design of national REDD+ Strategies addresses indicators for enhancement of livelihoods of local communities and for biodiversity conservation (FCPF M&E Framework Indicator 3.B.):**

**Provide examples of how national REDD Strategies address livelihoods of local communities and biodiversity conservation.**

Los recursos forestales desempeñan una función vital en la vida de las comunidades locales; para mejorar los medios de vida de estas comunidades, se espera mejorar sus ingresos mediante la gestión sostenible de los bosques y la Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas (tercera y quinta actividad REDD+). La primera apunta al aprovechamiento sostenido de los bosques (productos maderables y no maderables), mediante actividades de bajo impacto, brindando mejores ingresos. Se avanza ordenamiento y control de las actividades de aprovechamiento que se está implementando en Panamá Este, Darién y Comarcas Emberá-Wounaan, Wuargandí y Madugandí, donde se avanza con un mejor control y mayor equidad en el acceso al aprovechamiento forestal sostenible por parte de las comunidades.

Además, con la Alianza por el Millón de Hectáreas Reforestadas, ya se han puesto en funcionamiento 25 viveros comunitarios y 23 de MiAMBIENTE que, sumados a los esfuerzos de reforestación y restauración forestal, se genera mano de obra, mejorando los ingresos de las comunidades, y así facilitar la implementación de los 4 tipos de restauración facilitados en esta iniciativa:

- Restauración de tierras de vocación forestal: Consiste en reforestar a través de un modelo en el que se combine especies forestales con la producción ganadera. Mientras que las especies forestales puedan ser empleados como cerca viva y cortina rompe vientos se convierten, a su vez, en pastos, arbustos o árboles con valor nutritivo para el ganado.
- Reforestación comercial: Se busca establecer plantaciones forestales rentables que cuenten con especies de rápido crecimiento y alto potencial para la industria de aserrío.
- Conservación de los bosques naturales: La iniciativa se enfoca en la recuperación de la cobertura forestal con miras a proteger el recurso hídrico de importancia para la vida, y restaurar el paisaje natural intervenido en las áreas protegidas.
- Restauración de Bosques de galería: La tarea consiste en restaurar las áreas de bosques de galería para la protección del recurso hídrico en sitios que en la actualidad no cuentan con cobertura forestal.

Las actividades contempladas en la Alianza por el millón de hectáreas coinciden plenamente con las 5 actividades de REDD+, y **como parte del Fondo Reforesta Panamá se cuenta con recursos financieros de 15 millones de dólares anuales, para iniciar una fase de implementación de acciones REDD+. El administrador fiduciario es el Banco Nacional de Panamá.**

Los esfuerzos que se ha adelantado en las actividades REDD+, no solo contribuyen al mejoramiento de los ingresos de las comunidades, sino que mejoran la capacidad de adaptación de las mismas. Adicional, con la implementación de la Estrategia REDD+ (una vez aprobada e implementada), junto con el Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050, también en proceso de implementación, se contribuirá con el mejoramiento de los ingresos en las comunidades y en su capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático.

Las comunidades rurales como parte de los actores claves REDD+, poseen un vasto conocimiento adaptado a las condiciones locales para mantener la productividad de sus recursos naturales y sus paisajes. Las mujeres, los hombres, los jóvenes y los adultos mayores aportan una diversidad de habilidades y experiencias prácticas respecto a cómo gestionar el entorno que los rodea.

Los derechos legales de estas comunidades locales deberán ser protegidos, y facilitarse el acceso de sus productos a los mercados, proveyéndose además incentivos a las actividades de conservación que realicen.

Las discusiones de REDD+, se encuentran muy ligadas al tema de la conservación de la biodiversidad, las presiones económicas producto de los requerimientos por los múltiples beneficios que generan los bosques resaltan la importancia de considerar salvaguardas y estándares ambientales en la estrategia nacional REDD+, como en las diversas actividades y acciones REDD+ que se desarrollen.

Adicional, con el Programa “Bosques de Vida”, implementado con el apoyo de la Oficina en Panamá del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es una iniciativa del programa de apoyo a la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques en países en vías de desarrollo (ONU-REDD) y el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) para apoyar a pueblos indígenas y comunidades que viven en los bosques a participar en los procesos nacionales para frenar la deforestación y degradación de los bosques. A través de este proyecto, quince organizaciones de base comunitaria trabajan en cuatro comarcas indígenas y cuatro provincias en Panamá con un objetivo en común: ser guardianes de los bosques y revertir la deforestación en sus territorios, pues dependen de ellos como medios de vida y sustento. A través del proyecto se promueven técnicas sostenibles donde la agroforestería complementa la protección de las fuentes de agua y las riberas de los ríos, y el rescate de técnicas tradicionales que se transforman en agricultura orgánica y soberanía alimentaria. Ver más en <https://medium.com/@pnud/bosques-de-vida-9e43a4939bb2>  
En octubre de 2017 se firmó un Grant con la Fundación Almanaque Azul para el “Fortalecimiento de capacidades de organizaciones de base comunitaria en temas REDD+ prioritarios para Panamá en el marco de la consolidación de la fase de preparación REDD+ en Panamá, con fondos del FCPF.

### **3. PROGRESS AT R-PP sub component level**

#### **3.1. REDD Readiness Progress**

As a synthesis of the following output level assessments, please briefly describe here the progress made during the reporting period in developing the country Readiness Package (FCPF M&E Framework Indicator 1.A.): up to 300 words, if applicable

**Progress made during the reporting period in developing the country Readiness Package:**

- La Junta de Proyecto de fecha 22 de junio de 2017 aprueba la realización de la Evaluación de Medio Término del Proyecto. El Reporte de Medio Término de REDD ante el FCPF y por tanto la extensión del proyecto.
- Durante el año 2017 se establece y se ejecuta la hoja de ruta para género en tres fases para su futura implementación:

**FASE 1. PREPARANDONOS PARA INCORPORAR GÉNERO EN REDD+ (abril – junio)**

- Sensibilización funcionariado MiAMBIENTE en cuanto a la importancia de la promoción de la Igualdad de Género. (PNUD – FAO)
- Contratación empresas (2 consultorías): (i) para elaborar Estrategia de Comunicación Inclusiva y portal de conocimiento; (ii) diseño plan de capacitación y módulos presenciales y virtuales, elaboración de un análisis de relaciones de poder entre hombres y mujeres comunidades REDD+ y estrategia de igualdad de género en siguientes fases REDD+ Panamá.
- Diseño del plan de capacitaciones y los módulos a ser aplicados en esta primera etapa.
- Hacer convocatoria de Grants a organizaciones de mujeres para desarrollar las capacitaciones a distintos actores claves (funcionariado y población beneficiaria).
- Diseño de Estrategia de Comunicación Inclusiva.

**FASE 2. DESARROLLANDO CAPACIDADES EN REDD+ PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (julio – octubre)**

- Asignación de Grants y formación de formadores con los módulos elaborados.
- Implementación de las capacitaciones a diferentes actores clave.
- Desarrollo de la Estrategia de Comunicación Inclusiva y de los materiales comunicacionales.
- Realización de un análisis sobre relaciones de poder entre los géneros en comunidades.
- Diseño del portal de gestión de conocimiento de género y REDD+.


**FASE 3. GESTIONANDO CONOCIMIENTO DE IGUALDAD DE GÉNERO Y REDD+ (octubre – diciembre)**

- Implementación de las capacitaciones a diferentes actores clave.
- Puesta en funcionamiento del portal de gestión de conocimiento de género y REDD+, difusión de materiales comunicacionales.
- Elaboración de la estrategia de igualdad de género en siguientes fases REDD+.

- En agosto de 2017 se llevó a cabo la evaluación de medio término del proyecto PS 80097 para la Consolidación de la preparación de la fase de preparación de REDD+ Panamá con fondos del FCPF. Las 15 recomendaciones de la evaluación fueron respondidas y atendidas por el Ministerio de Ambiente y PNUD.
- En noviembre de 2017 se presenta el Reporte de Medio Término ante el FCPF y Banco Mundial, indicando que el proyecto ha avanzado en un 55% por lo cual reconoce la necesidad de una extensión en tiempo sin costo, indicando lo siguiente: “Among the main expected outcomes are: the establishment of a reference emissions level, which has been concluded and will be presented to the UNFCCC by Panama in January 2018, and improvements to the MRV system, which continue to be developed; also, the "climate, policy and law" firm, was hired to develop the REDD + strategy. The final document is expected to be ready by the first trimester of 2018. After that period, the consultation process will start, and the legal adoption process should culminate by the end of the year.”
- Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente presentó ante el Banco Mundial la actualización de la Propuesta de Preparación de REDD+ Panamá (R-PP, por sus siglas en inglés)
- Posteriormente, el Ministerio de Ambiente realizó cambios estratégicos a lo interno de sus estructuras del proyecto y de la Dirección de Cambio Climático, asignando un Coordinador Senior del PNUD para todos los proyectos de Cambio Climático, lo que permite a REDD+ superar los retos y mitigar los riesgos identificados. Parte de la toma de decisiones apuntan a un análisis exhaustivo, haciendo uso de estrategias que permitan la eficacia y eficiencia del proyecto, aplicando elementos de la gestión basada en resultados. Los cambios a nivel gerencial han generado una coordinación armonizada con los equipos técnicos de la Dirección de Cambio Climático de MiAMBIENTE y la Unidad Coordinadora de REDD+ ubicada en el Ministerio, para establecer una visión conjunta que permita responder a las metas de país en su Estrategia Nacional de Cambio Climático, permitiendo que las tomas de decisiones fluyan para asegurar que los procesos tanto administrativos como estratégicos puedan cumplir con los tiempos establecidos.

La ruta crítica a seguir para para el Borrador avanzado de la Estrategia Nacional REDD+, establece los plazos y actividades específicas para el proceso de retroalimentación, participación y consulta con los actores clave y la recopilación y análisis de la información necesaria. La ruta crítica establece las actividades específicas para el logro de cada paso del proceso de consulta, hasta su validación. Se espera contar con el borrador del documento de la ENREDD+ en mayo de 2018.

REDD+ avanza en la implementación de sus mecanismos de coordinación a través de sus procesos de incidencia y abogacía, liderando los pueblos indígenas como uno (1) de los cinco (5) grupos diferenciados, considerados como actores claves<sup>2</sup>.

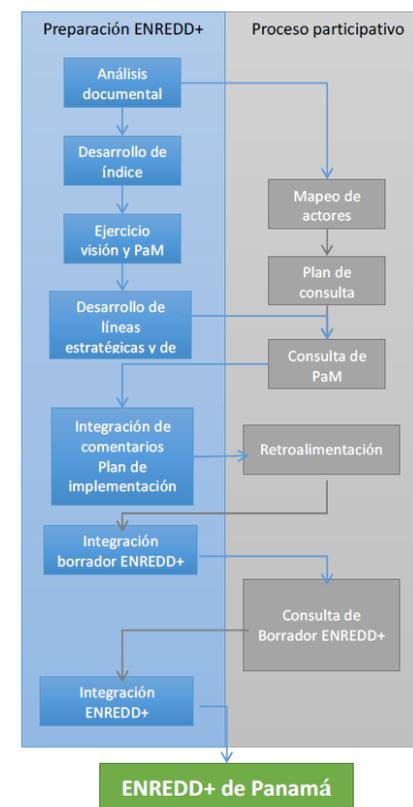

<sup>2</sup> Grupos Diferenciados de actores clave de REDD+ Panamá: pueblos indígenas, las poblaciones afrodescendientes, las comunidades campesinas, otros propietarios y usuarios individuales o colectivos del bosque, mujeres y hombres por la igualdad de género y empoderamiento de la mujer en el bosque.

| Please indicate which of your country R-PP components and sub-components have received support from FCPF through the Readiness Preparation Grant (>3.4 million USD) |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| Components  | Sub-components  | Support from FCPF (Yes/No) |
| 1. Readiness Organization and Consultation  | 1a. National REDD+ Management Arrangements  | Yes                        |
|   | 1b. Consultation, Participation, and Outreach   | Yes                        |
| 2. REDD+ Strategy Preparation   | 2a. Assessment of Land Use, Land Use Change Drivers, Forest Law, Policy and Governance  | Yes                        |
|   | 2b. REDD+ Strategy Options  | Yes                        |
|   | 2c. Implementation Framework  | Yes                        |
|   | 2d. Social and Environmental Impacts  | Yes                        |
| 3. Reference Emissions Level/Reference Levels   |   | Yes                        |
| 4. Monitoring Systems for Forests and Safeguards  | 4a. National Forest Monitoring System   | Yes                        |
|   | 4b. Information System for Multiple Benefits, Other Impacts, Governance, and Safeguards | Yes                        |

Level of overall achievement of planned milestones according to approved FCPF-financed Readiness Fund Grant (>3.4 million USD) (FCPF M&E Framework 1.3.b)

| Planned Milestones:   | Level of Achievement <sup>3</sup> :  | Tracking <sup>4</sup> :   |  |   |                      |  |  |  |  |  |                              |  |  |                                |  |  |                |
|---|--|---|--|---|----------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|----------------|
| 1) Environmental and Social Safeguards in the FCPF Readiness Fund.  | 1. Se cuenta con un diseño conceptual de salvaguardas, el análisis del marco legal. Pendiente del Sistema de Información de Salvaguardas.  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1415 358 1486 418"></td> <td data-bbox="1493 358 1570 418">x</td> <td data-bbox="1577 358 1885 418">Significant progress</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1415 423 1486 483"></td> <td data-bbox="1493 423 1570 483"></td> <td data-bbox="1577 423 1885 483">Progressing well, further development required</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1415 488 1486 548"></td> <td data-bbox="1493 488 1570 548"></td> <td data-bbox="1577 488 1885 548">Further development required</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1415 553 1486 613"></td> <td data-bbox="1493 553 1570 613"></td> <td data-bbox="1577 553 1885 613">Not yet demonstrating progress</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1415 618 1486 678"></td> <td data-bbox="1493 618 1570 678"></td> <td data-bbox="1577 618 1885 678">Non Applicable</td> </tr> </table> |  | x | Significant progress |  |  | Progressing well, further development required |  |  | Further development required |  |  | Not yet demonstrating progress |  |  | Non Applicable |
|   | x  | Significant progress  |  |   |                      |  |  |  |  |  |                              |  |  |                                |  |  |                |
|   |  | Progressing well, further development required  |  |   |                      |  |  |  |  |  |                              |  |  |                                |  |  |                |
|   |  | Further development required  |  |   |                      |  |  |  |  |  |                              |  |  |                                |  |  |                |
|   |  | Not yet demonstrating progress  |  |   |                      |  |  |  |  |  |                              |  |  |                                |  |  |                |
|   |  | Non Applicable  |  |   |                      |  |  |  |  |  |                              |  |  |                                |  |  |                |
| 2) Strategic Environmental and Social Assessments (SESAs) and Environmental and Social Management Frameworks (ESMFs). | 2. Pendiente SESA y ESMFs.   |   |  |   |                      |  |  |  |  |  |                              |  |  |                                |  |  |                |
| 3) Stakeholder Engagement in REDD+ Readiness.   | 3. Son 894 actores clave en el proceso de preparación de REDD+ Panamá.   |   |  |   |                      |  |  |  |  |  |                              |  |  |                                |  |  |                |
| 4) Grievance and Accountability.  | 4. Se cuenta con el Mecanismo de reclamos y quejas de MIAMBIENTE y se trabaja en la mejora para desagregar estadísticas en base a las 5 actividades REDD+.                                     |   |  |   |                      |  |  |  |  |  |                              |  |  |                                |  |  |                |
| 5) Diseminación en el nivel nacional  | 5. Se realiza la diseminación de los temas REDD+ a nivel nacional. En 2017 se realizaron 33 talleres a nivel nacional (894 personas de los cuales 411 son mujeres (46%) y 483 a hombres (54%). | <p>Please explain why:</p>  |  |   |                      |  |  |  |  |  |                              |  |  |                                |  |  |                |

<sup>3</sup> Countries are expected to provide data on the overall level of achievement of planned milestones as defined in their Readiness Preparation Grant Agreement, and, if applicable, on their Supplementary Grant Agreement for an additional grant of up to \$5 million. For instance, under their Preparation Readiness Grant Agreement (>3.4 million USD), Countries should provide data on (i) the support to the Coordination of the REDD+ Readiness Process and Multi-Stakeholder Consultations; (ii) the contribution to the Design of a National REDD+ Strategy; and (iii) the preparation of a National Reference Scenario for REDD+

<sup>4</sup> The level of achievement of planned milestones according to approved RF grant will be summarized through progress scores related to the synthesis of an overall achievement, qualitatively expressed on a four-color 'traffic light' scale and then explained. In case the assessment is not applicable, a fifth color scale "Non Applicable" can be selected.

This 'traffic light' scale is based on the system contained in the R-Package Assessment Framework

**Degree of achievement of planned milestones per R-PP component and sub-component (FCPF M&E Framework 1.3.c.).**  
**Countries are expected to rate progress toward the implementation of R-PP sub-component only once a year, as part of the reporting submitted by August 15<sup>th</sup> each year: Grado de logro de los hitos previstos por componente y subcomponente de R-PP (Marco de M & E del FCPF 1.3.c.).**  
**Se espera que los países califiquen el progreso hacia la implementación del subcomponente de R-PP sólo una vez al año, como parte de la presentación de informes a más tardar el 15 de agosto de cada año**

|  | Sub-component   | Progress against annual targets   |   | Tracking <sup>5</sup><br>(Please select your light rating)                          |   |  |
|--|---|---|---|---|---|--|
|  |   | Planned milestones  | Achievements  |   |   |  |
| R-PP Component 1 – Readiness Organization and Consultation | <b>Sub-Component 1a</b> – National REDD+ Management Arrangements<br><i>Purpose: setting-up national readiness management arrangements to manage and coordinate the REDD-plus readiness activities whilst mainstreaming REDD-plus into broader strategies</i><br><i>Country Self-Assessment Criteria: (i) accountability and transparency; (ii) operating mandate and budget; (iii) multi-sector coordination mechanisms and cross-sector collaboration; (iv) technical supervision capacity; (v) funds management capacity; (vi) feedback and grievance redress mechanism</i> | 500 actores clave participando de los procesos de consulta en la plataforma nacional sobre REDD+. | 894 actores clave participando de los procesos de consulta en la plataforma nacional sobre REDD+. |  | X | Significant progress                           |
|  |   |   |   |  |   | Progressing well, further development required |
|  |   |   |   |  |   | Further development required                   |
|  |   |   |   |  |   | Not yet demonstrating progress                 |
|  |   |   |   |  |   | Non Applicable                                 |
|  |   |   |   |   |   |  |

<sup>5</sup> The level of achievement of planned milestones per R-PP component should be self-assessed and reported, as well as summarized through progress scores related to the synthesis of this overall achievement, qualitatively expressed on a four-color 'traffic light' scale and then briefly explained. In case the assessment is not applicable, a fifth color scale 'Non Applicable' can be selected. This 'traffic light' scale is based on the system contained in the R-Package Assessment Framework, The R-Package assessment criteria are included to assist countries identify, plan and track their readiness preparations progress with the core aspects and desired outcomes of readiness preparation activities as contained in R-Package Assessment Framework.

|  | Sub-component   | Progress against annual targets  |  | Tracking <sup>5</sup><br>(Please select your light rating)                          |   |  |
|--|---|--|--|---|---|--|
|  |   | Planned milestones   | Achievements   |   |   |  |
|  | <p><b>Sub-Component 1b</b> – Consultation, Participation, and Outreach</p> <p><i>Purpose: broad consultation with and participation of key stakeholders for future REDD+ programs, to ensure participation of different social groups, transparency and accountability of decision-making</i></p> <p><i>Country Self-Assessment Criteria: (i) participation and engagement of key stakeholders; (ii) consultation processes; (iii) information sharing and accessibility of information; (iv) implementation and public disclosure of consultation outcomes</i></p> | <p>Elaboración del plan de fortalecimiento de capacidades e implementación de la Estrategia de Comunicación REDD+.</p> <p>Establecida la Plataforma de participación intersectorial y de multiactores representativa e inclusiva de los actores claves.</p> <p>Diagnóstico de necesidades de fortalecimiento de capacidades (Encuesta de Cambio Climático)</p> | <p>Plan de capacitación REDD+ aprobado y en ejecución a nivel nacional, con enfoque de género.</p> <p>894 actores claves de los cinco canales diferenciados conforman la plataforma de participación y consulta para la consolidación de la Estrategia Nacional REDD+.</p> <p>1200 panameños a nivel regional y nacional son consultados en relación al cambio climático, REDD+, haciendo énfasis en la Alianza por el Millón de ha, en la segunda medición realizada a principio de 2018.</p> |  | X | Significant progress                           |
|  |   |  |  |  |   | Progressing well, further development required |
|  |   |  |  |  |   | Further development required                   |
|  |   |  |  |  |   | Not yet demonstrating progress                 |
|  |   |  |  |  |   | Non Applicable                                 |
|  |   |  |  | Please explain why:   |   |  |

|   | Sub-component  | Progress against annual targets  |  | Tracking <sup>5</sup><br>(Please select your light rating)                          |   |  |
|---|--|--|--|---|---|--|
|   |  | Planned milestones   | Achievements   |   |   |  |
| R-PP Component 2 – REDD+ Strategy Preparation | <p><b>Subcomponent 2a:</b> Assessment of Land Use, Land Use Change Drivers, Forest Law, Policy and Governance</p> <p><i>Purpose: identification of key drivers of deforestation and/or forest degradation, as well as activities concerning conservation, sustainable management of forests, and enhancement of forest carbon stocks</i></p> <p><u>Country Self- Assessment Criteria:</u> (i) assessment and analysis; (ii) prioritization of direct and indirect drivers/barriers to forest enhancement; (iii) links between drivers/barriers and REDD+ activities; (iv) actions plans to address natural resource right, land tenure, governance; (v) implications for forest law and policy</p> | Realización de la evaluación Estratégica Social y Ambiental (EESA) de las opciones estratégicas de REDD+ Panamá. | Se cuenta con una hoja de ruta definida para los temas de evaluación Estratégica Social y Ambiental y Marco de Gestión Ambiental y Social, como resultado del Reporte de Medio Término y la Revisión del R-PP. |  |   | Significant progress                           |
|   |  | Desarrollo del Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)  |  |  | X | Progressing well, further development required |
|   |  |  |  |  |   | Further development required                   |
|   |  |  |  |  |   | Not yet demonstrating progress                 |
|   |  |  |  |  |   | Non Applicable                                 |
|   |  |  |  | Please explain why:   |   |  |

| Sub-component  | Progress against annual targets   |   | Tracking <sup>5</sup><br>(Please select your light rating)                          |   |  |
|--|---|---|---|---|--|
|  | Planned milestones  | Achievements  |   |   |  |
| <p><b>Subcomponent 2b:</b> REDD+ Strategy Options</p> <p><i>Purpose: Develop a set of policies and programs for addressing the drivers of deforestation and/or forest degradation</i></p> <p><i>Country Self- Assessment Criteria: (i) selection and prioritization of REDD+ strategy options; (ii) feasibility assessment; (iii) implications for strategy options on existing sectoral policies.</i></p> | Alto nivel de viabilidad de las opciones estratégicas contempladas en la Estrategia Nacional REDD+ en Panamá. | <p>Asamblea Nacional aprueba proyecto de ley de incentivos forestales y cobertura boscosa. <b>Ley 69 de 30 de octubre de 2017.</b></p> <p>Para dar cumplimiento al programa de incentivos forestales se establece el Fondo Reforesta Panamá, en el marco de la Iniciativa de la Alianza por el Millón de Hectáreas, conformado por representantes de los ministerios de Ambiente, Desarrollo Agropecuario, Comercio e Industrias, Economía y Finanzas, de la Asociación Nacional de Reforestadores y Afines de Panamá (ANARAP), organizaciones civiles ambientalistas y del sector empresarial.</p> |  | X | Significant progress                           |
|  |   |   |  |   | Progressing well, further development required |
|  |   |   |  |   | Further development required                   |
|  |   |   |  |   | Not yet demonstrating progress                 |
|  |   |   |  |   | Non Applicable                                 |
|  |   |   |   |   |  |

|   | Sub-component  | Progress against annual targets   |  | Tracking <sup>5</sup><br>(Please select your light rating)  |   |  |                      |   |   |                                       |   |  |                     |   |  |                       |   |  |                |  |  |
|---|--|---|--|---|---|--|----------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|---------------------|---|--|-----------------------|---|--|----------------|--|--|
|   |  | Planned milestones  | Achievements   |   |   |  |                      |   |   |                                       |   |  |                     |   |  |                       |   |  |                |  |  |
|   | <p><b>Subcomponent 2c:</b> Implementation Framework</p> <p><i>Purpose: Set out credible and transparent institutional, economic, legal and governance arrangements necessary to implement REDD+ strategy options</i></p> <p><i>Country Self- Assessment Criteria: (i) adoption and implementation of legislation/regulations; (ii) guidelines for implementation; (iii) benefit sharing mechanism; (iv) national REDD+ registry and system monitoring REDD+ activities</i></p> | <p>La unidad de planificación de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá es la cuenca hidrográfica, por lo cual los instrumentos de gestión son el Plan de Ordenamiento Territorial y los Planes de Manejo de Cuenca. Mediante la Ley 44 de 2002 y el Decreto Ejecutivo 479 de 2013.</p> <p>Se espera la creación 52 comités de cuenca en todo el país.</p> | <p>En 2017 se cuenta con 15 comités de cuenca, incluyendo la Cuenca del Canal de Panamá.</p> | <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Significant progress</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>Progressing well, further development</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Further development</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Not yet demonstrating</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Non Applicable</td> </tr> </table> <p><i>Please explain why:</i></p> |  |  | Significant progress |  | X | Progressing well, further development |  |  | Further development |  |  | Not yet demonstrating |  |  | Non Applicable |  |  |
|  |  | Significant progress  |  |   |   |  |                      |   |   |                                       |   |  |                     |   |  |                       |   |  |                |  |  |
|  | X  | Progressing well, further development   |  |   |   |  |                      |   |   |                                       |   |  |                     |   |  |                       |   |  |                |  |  |
|  |  | Further development   |  |   |   |  |                      |   |   |                                       |   |  |                     |   |  |                       |   |  |                |  |  |
|  |  | Not yet demonstrating   |  |   |   |  |                      |   |   |                                       |   |  |                     |   |  |                       |   |  |                |  |  |
|  |  | Non Applicable  |  |   |   |  |                      |   |   |                                       |   |  |                     |   |  |                       |   |  |                |  |  |

|  | Sub-component  | Progress against annual targets  |  | Tracking <sup>5</sup><br>(Please select your light rating)   |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  | Planned milestones   | Achievements   |  |   |  |
|  | <p><b>Subcomponent 2d:</b> Social and Environmental Impacts</p> <p><i>Purpose: Ensure compliance with the Common Approach and prepare a country specific Environmental and Social Management Framework (ESMF)</i></p> <p><i>Country Self-Assessment Criteria: (i) analysis of social and environmental safeguard issues; (ii) REDD+ strategy design with respect to impacts; (iii) Environmental and Social Management Framework</i></p> | Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA) y el Desarrollo del Marco de Gestión Ambiental y social (EMMF). | Pendiente la el desarrollo de la Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA) y el Marco de Gestión Ambiental y social (MGAS). |   |   | Significant progress                           |
|  |  |  |  |   | X | Progressing well, further development required |
|  |  |  |  |   | X | Further development required                   |
|  |  |  |  |   |   | Not yet demonstrating progress                 |
|  |  |  |  |   |   | Non Applicable                                 |
|  |  |  |  | <p><i>Please explain why:</i> Se cuenta con la hoja de ruta para el desarrollo de la Evaluación Estratégica Social y Ambiental y el Desarrollo del Marco de Gestión Ambiental y social (MGAS).</p> |   |  |

|   | Sub-component  | Progress against annual targets   |  | Tracking <sup>5</sup><br>(Please select your light rating)                          |   |  |
|---|--|---|--|---|---|--|
|   |  | Planned milestones  | Achievements   |   |   |  |
| R-PP Component 3 – Reference Emissions Level/Reference Levels | <b>R-PP Component 3</b> - Reference Emissions Level/Reference Levels<br><i>Purpose: Development of the general approach to establish a REL/RL</i><br><i>Country Self-Assessment Criteria: (i) demonstration of methodology; (ii) use of historical data, and adjusted for national circumstances; (iii) technical feasibility of the methodological approach, and consistency with UNFCCC/IPCC guidance and guidelines</i> | Elaboración del nivel de referencia de emisiones forestales para Panamá | Panamá finalizó en diciembre de 2017, el Documento Técnico de Niveles de Referencia Forestales, como parte de los compromisos adquiridos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). |  | X | Significant progress                           |
|   |  |   |  |  |   | Progressing well, further development required |
|   |  |   |  |  |   | Further development                            |
|   |  |   |  |  |   | Not yet demonstrating progress                 |
|   |  |   |  |  |   | Non Applicable                                 |
| And explain why:  |  |   |  |   |   |  |

|   | Sub-component  | Progress against annual targets           |  | Tracking <sup>5</sup><br>(Please select your light rating)                          |   |  |
|---|--|---|--|---|---|--|
|   |  | Planned milestones                        | Achievements   |   |   |  |
| R-PP Component 4: Monitoring Systems for Forests and Safeguards | <p><b>Subcomponent 4a:</b> National Forest Monitoring System</p> <p><i>Purpose: Design and develop an operational forest monitoring system and describe the approach to enhance the system over time</i></p> <p><i>Country Self- Assessment Criteria: (i) documentation of monitoring approach; (ii) demonstration of early implementation; (iii) institutional arrangements and capacities- Forests</i></p> | Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques. | <p>El Sistema de Monitoreo de Bosques consta de tres subcomponentes: Monitoreo terrestre satelital; Inventario Nacional Forestal y de Carbono (INFC); e inventario de gases de efecto invernadero.</p> <p>El mapa de cobertura y uso de la tierra 2012 se aprobó mediante resolución XXX de 2017.</p> <p>54 unidades de muestreo (UM) del inventario nacional forestal y de carbono (INFC) levantadas y analizadas. Pendiente 26 unidades de muestreo.</p> <p>El inventario de gases de efecto invernadero 2005-2010. Se desarrolló un sistema de recolección de información para el inventario de gases de efecto de invernadero.</p> <p>12 técnicos capacitados en INFC y 65 técnicos en manejo de drones.</p> |  | X | Significant progress                           |
|   |  |   |  |  |   | Progressing well, further development required |
|   |  |   |  |  |   | Further development required                   |
|   |  |   |  |  |   | Not yet demonstrating progress                 |
|   |  |   |  |  |   | Non Applicable                                 |
| And explain why:  |  |   |  |   |   |  |

| Sub-component   | Progress against annual targets   |   | Tracking <sup>5</sup><br>(Please select your light rating)   |   |  |                      |   |  |  |   |   |                              |   |  |                                |   |  |                |
|---|---|---|--|---|--|----------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|----------------|
|   | Planned milestones  | Achievements  |  |   |  |                      |   |  |  |   |   |                              |   |  |                                |   |  |                |
| <p><b>Subcomponent 4b:</b> Information System for Multiple Benefits, Other Impacts, Governance, and Safeguards</p> <p><i>Purpose: Specify the non-carbon aspects prioritized for monitoring by the country</i></p> <p><i>Country Self-Assessment Criteria: (i) identification of relevant non-carbon aspects, and social and environmental issues; (ii) monitoring, reporting and information sharing; (iii) Institutional arrangements and capacities – Safeguards</i></p> | <p>Diagnóstico situacional de Salvaguardas y Diseño de Información. s</p> | <p><i>Panamá cuenta con un diagnóstico y las recomendaciones concretas para la adopción de un enfoque nacional de salvaguardas y el diseño de un sistema de información de salvaguardas (SIS); se revisan los esquemas actuales de flujo de información para la contratación de consultorías para establecer el sistema</i></p> | <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Significant progress</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Progressing well, further development required</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>Further development required</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Not yet demonstrating progress</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Non Applicable</td> </tr> </table> <p>And explain why:</p> |  |  | Significant progress |  |  | Progressing well, further development required |  | X | Further development required |  |  | Not yet demonstrating progress |  |  | Non Applicable |
|    |   | Significant progress  |  |   |  |                      |   |  |  |   |   |                              |   |  |                                |   |  |                |
|    |   | Progressing well, further development required  |  |   |  |                      |   |  |  |   |   |                              |   |  |                                |   |  |                |
|    | X   | Further development required  |  |   |  |                      |   |  |  |   |   |                              |   |  |                                |   |  |                |
|    |   | Not yet demonstrating progress  |  |   |  |                      |   |  |  |   |   |                              |   |  |                                |   |  |                |
|    |   | Non Applicable  |  |   |  |                      |   |  |  |   |   |                              |   |  |                                |   |  |                |

| Disbursement rate of FCPF-financed Readiness Fund Grant (>3.4 million USD), in percentage (FCPF M&E Framework 1.3.d.): |                       |                                    |                   |   |  |  |                               |  |  |                                    |  |   |                                    |  |  |                        |  |  |                |
|--|-----------------------|------------------------------------|-------------------|---|--|--|-------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|--|------------------------|--|--|----------------|
|  |                       |                                    | Rate              | Tracking  |  |  |                               |  |  |                                    |  |   |                                    |  |  |                        |  |  |                |
| RF Grant - disbursement rate vs. planned disbursements.  |                       |                                    | <b>72%*</b>       | Please select your rating: <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Up to 10% variance with plans</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Between 10-25% variance with plans</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>Between 25-40% variance with plans</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>More than 40% variance</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Non Applicable</td> </tr> </table> |  |  | Up to 10% variance with plans |  |  | Between 10-25% variance with plans |  | X | Between 25-40% variance with plans |  |  | More than 40% variance |  |  | Non Applicable |
|  |                       | Up to 10% variance with plans      |                   |   |  |  |                               |  |  |                                    |  |   |                                    |  |  |                        |  |  |                |
|  |                       | Between 10-25% variance with plans |                   |   |  |  |                               |  |  |                                    |  |   |                                    |  |  |                        |  |  |                |
|  | X                     | Between 25-40% variance with plans |                   |   |  |  |                               |  |  |                                    |  |   |                                    |  |  |                        |  |  |                |
|  |                       | More than 40% variance             |                   |   |  |  |                               |  |  |                                    |  |   |                                    |  |  |                        |  |  |                |
|  |                       | Non Applicable                     |                   |   |  |  |                               |  |  |                                    |  |   |                                    |  |  |                        |  |  |                |
|  | <b>Presupuesto \$</b> | <b>Implementado<sup>6</sup></b>    | <b>% Progreso</b> |   |  |  |                               |  |  |                                    |  |   |                                    |  |  |                        |  |  |                |
| <b>FCPF</b>  | 4,104,000.00          |                                    |                   |   |  |  |                               |  |  |                                    |  |   |                                    |  |  |                        |  |  |                |
| <b>FCPF 2016</b>   | 1,909,676.00          | 893,098.18                         | 46.7%             |   |  |  |                               |  |  |                                    |  |   |                                    |  |  |                        |  |  |                |
| <b>FCPF 2017</b>   | 2,143,499.00          | 1,548,587.10**                     | 72%               |   |  |  |                               |  |  |                                    |  |   |                                    |  |  |                        |  |  |                |

| Disbursement rate of Total R-PP Budget in percentage (FCPF M&E Framework 1.3.d.):  |                              |                                 |                     |                   |   |  |  |                    |  |   |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---|--|--|--------------------|--|---|----------------|--|--|----------------|--|--|---------------|--|--|----------------|
|  |                              |                                 |                     | Rate              | Tracking  |  |  |                    |  |   |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                |
| Total Budget in R-PP - disbursement rate vs. planned disbursements (including other funding sources and FCPF Readiness Grant). |                              |                                 |                     | <b>88%***</b>     | Please select your rating: <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td>Up to 10% variance</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td>Between 10-25%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Between 25-40%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>More than 40%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Non Applicable</td> </tr> </table> |  |  | Up to 10% variance |  | X | Between 10-25% |  |  | Between 25-40% |  |  | More than 40% |  |  | Non Applicable |
|  |                              | Up to 10% variance              |                     |                   |   |  |  |                    |  |   |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                |
|  | X                            | Between 10-25%                  |                     |                   |   |  |  |                    |  |   |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                |
|  |                              | Between 25-40%                  |                     |                   |   |  |  |                    |  |   |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                |
|  |                              | More than 40%                   |                     |                   |   |  |  |                    |  |   |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                |
|  |                              | Non Applicable                  |                     |                   |   |  |  |                    |  |   |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                |
|  | <b>Presupuesto 2016-2017</b> | <b>Implementado<sup>7</sup></b> | <b>% Progreso</b>   |                   |   |  |  |                    |  |   |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                |
| <b>FCPF</b>  | 4,104,000.00                 | 2,441,685.28**                  | 59%                 |                   |   |  |  |                    |  |   |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                |
|  | <b>Presupuesto 2016-2017</b> | <b>Presupuesto Modificado</b>   | <b>Implementado</b> | <b>% Progreso</b> |   |  |  |                    |  |   |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                |
| <b>Ministerio de Ambiente</b>  | 250,000.00                   | 194,144.00                      | 193,916.00          | 99%               |   |  |  |                    |  |   |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                |
|  | <b>Presupuesto 2016</b>      | <b>Presupuesto Modificado</b>   | <b>Implementado</b> | <b>% Progreso</b> |   |  |  |                    |  |   |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                |
| <b>Ministerio de Ambiente</b>  | 250,000.00                   | 770,417.00                      | 762,823.00          | 99%               |   |  |  |                    |  |   |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                |
|  | <b>Presupuesto 2011-2016</b> | <b>Implementado<sup>8</sup></b> | <b>% Progreso</b>   |                   |   |  |  |                    |  |   |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                |
| <b>ONUREDD</b>   | 5,300,000.00                 | 5,207,329.97                    | 98%                 |                   |   |  |  |                    |  |   |                |  |  |                |  |  |               |  |  |                |

<sup>6</sup> PNUD – Sistema ATLAS

<sup>7</sup> PNUD – Sistema ATLAS

<sup>8</sup> PNUD – Sistema ATLAS

### 3.2. Engagement of stakeholders within the approach to REDD +

| Examples of actions/activities where IPs, CSOs, and local communities participate actively, if relevant (FCPF M&E Framework 3.1.a.):                  |  |   |   |             |   |            |         |         |       |           |                                     |    |    |    |      |                                    |    |    |    |      |                                |    |   |    |      |                                       |    |    |    |      |              |           |           |            |             |
|---|--|---|---|-------------|---|------------|---------|---------|-------|-----------|-------------------------------------|----|----|----|------|------------------------------------|----|----|----|------|--------------------------------|----|---|----|------|---------------------------------------|----|----|----|------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| <u>Action/activity</u>  | <u>Describe IP, CSO, and local community participation:</u>  |   |   |             |   |            |         |         |       |           |                                     |    |    |    |      |                                    |    |    |    |      |                                |    |   |    |      |                                       |    |    |    |      |              |           |           |            |             |
|   | <p>112 funcionarios del Ministerio de Ambiente fueron sensibilizados, para desarrollar sus capacidades y conocimientos respecto a la transversalización de género y su importancia en la conservación de los recursos naturales, en especial del bosque.</p> <p>A través de estos talleres de sensibilización, el proyecto REDD+ buscó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explicar en qué consiste el “Enfoque de Género y empoderamiento de la mujer”.</li> <li>• Reforzar los conocimientos sobre las desigualdades de género a nivel nacional y las implicaciones en términos de desarrollo del país.</li> <li>• Transferir las herramientas relacionadas a su ámbito de trabajo para promover una mayor igualdad entre los géneros.</li> </ul> <p>A continuación, se detalla las estadísticas de los participantes en los talleres de género:</p> <p style="text-align: center;"><b>Taller sobre Sensibilización en Género, Técnicos de las Direcciones Regionales de MiAMBIENTE</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Provincias</th> <th>Hombres</th> <th>Mujeres</th> <th>Total</th> <th>% Mujeres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bocas del Toro, Chiriquí y Comarcas</td> <td>13</td> <td>15</td> <td>28</td> <td>53.6</td> </tr> <tr> <td>Colon, Panamá: Norte, Metro, Oeste</td> <td>12</td> <td>26</td> <td>38</td> <td>68.4</td> </tr> <tr> <td>Darién, Panamá Este y Comarcas</td> <td>15</td> <td>7</td> <td>22</td> <td>31.8</td> </tr> <tr> <td>Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas</td> <td>11</td> <td>13</td> <td>24</td> <td>54.2</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>51</b></td> <td><b>61</b></td> <td><b>112</b></td> <td><b>54.5</b></td> </tr> </tbody> </table> |   |   |             |   | Provincias | Hombres | Mujeres | Total | % Mujeres | Bocas del Toro, Chiriquí y Comarcas | 13 | 15 | 28 | 53.6 | Colon, Panamá: Norte, Metro, Oeste | 12 | 26 | 38 | 68.4 | Darién, Panamá Este y Comarcas | 15 | 7 | 22 | 31.8 | Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas | 11 | 13 | 24 | 54.2 | <b>Total</b> | <b>51</b> | <b>61</b> | <b>112</b> | <b>54.5</b> |
| Provincias  | Hombres  | Mujeres   | Total   | % Mujeres   |   |            |         |         |       |           |                                     |    |    |    |      |                                    |    |    |    |      |                                |    |   |    |      |                                       |    |    |    |      |              |           |           |            |             |
| Bocas del Toro, Chiriquí y Comarcas   | 13   | 15  | 28  | 53.6        |   |            |         |         |       |           |                                     |    |    |    |      |                                    |    |    |    |      |                                |    |   |    |      |                                       |    |    |    |      |              |           |           |            |             |
| Colon, Panamá: Norte, Metro, Oeste  | 12   | 26  | 38  | 68.4        |   |            |         |         |       |           |                                     |    |    |    |      |                                    |    |    |    |      |                                |    |   |    |      |                                       |    |    |    |      |              |           |           |            |             |
| Darién, Panamá Este y Comarcas  | 15   | 7   | 22  | 31.8        |   |            |         |         |       |           |                                     |    |    |    |      |                                    |    |    |    |      |                                |    |   |    |      |                                       |    |    |    |      |              |           |           |            |             |
| Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas   | 11   | 13  | 24  | 54.2        |   |            |         |         |       |           |                                     |    |    |    |      |                                    |    |    |    |      |                                |    |   |    |      |                                       |    |    |    |      |              |           |           |            |             |
| <b>Total</b>  | <b>51</b>  | <b>61</b>                                       | <b>112</b>  | <b>54.5</b> |   |            |         |         |       |           |                                     |    |    |    |      |                                    |    |    |    |      |                                |    |   |    |      |                                       |    |    |    |      |              |           |           |            |             |
| Number of IP and REDD country CSO representatives (men/women) having been successfully trained by FCPF training programs (FCPF M&E Framework 3.1.b.): |  |   |   |             |   |            |         |         |       |           |                                     |    |    |    |      |                                    |    |    |    |      |                                |    |   |    |      |                                       |    |    |    |      |              |           |           |            |             |
| <u>Please list the training conducted:</u>  | <u>Duration (# of days)</u>  | <u># of participants # of men / # of women.</u> |  | X           | <i>Targets in terms of number of men and women to be trained by country to be defined</i> |            |         |         |       |           |                                     |    |    |    |      |                                    |    |    |    |      |                                |    |   |    |      |                                       |    |    |    |      |              |           |           |            |             |
| Mesas de trabajo con actores claves (afrodescendientes y campesinos), Chiriquí  | 1  | 49<br>24(H) / 13 (M)<br>12(S/S)                 |  |             |   |            |         |         |       |           |                                     |    |    |    |      |                                    |    |    |    |      |                                |    |   |    |      |                                       |    |    |    |      |              |           |           |            |             |
| Mesas de trabajo con actores claves (afrodescendientes y campesinos), Bocas del Toro  | 1  | 41<br>24 (H) / 13 (M)<br>5 (S/S)                |  |             |   |            |         |         |       |           |                                     |    |    |    |      |                                    |    |    |    |      |                                |    |   |    |      |                                       |    |    |    |      |              |           |           |            |             |
|   |  |   |  |             | <i>Non- Applicable</i>  |            |         |         |       |           |                                     |    |    |    |      |                                    |    |    |    |      |                                |    |   |    |      |                                       |    |    |    |      |              |           |           |            |             |

|   |   |                     |  |
|---|---|---------------------|--|
| Mesas de trabajo con actores claves (afrodescendientes y campesinos), Herrera       | 1 | 26<br>9(H) / 17(M)  |  |
| Mesas de trabajo con actores claves (afrodescendientes y campesinos), Coclé         | 1 | 38<br>20(H) / 18(M) |  |
| Taller con actores claves (afrodescendientes y campesinos) sobre ENREDD+, Darién    | 1 | 21<br>11(H) / 10(M) |  |
| Mesas de trabajo con actores claves (afrodescendientes y campesinos), Colón         | 1 | 45<br>17(H) / 28(M) |  |
| Mesas de trabajo con actores claves (afrodescendientes y campesinos), Panamá        | 1 | 38<br>11(H) / 25(M) |  |
| Reunión para lograr el fortalecimiento institucional de MiAMBIENTE sobre NRF        | 6 | 71<br>44(H) / 27(M) |  |
| Taller de socialización del proceso de construcción del nivel de referencia, David  | 1 | 28<br>14(H) / 14(M) |  |
| Taller de socialización del proceso de construcción del nivel de referencia, Chitré | 1 | 22<br>10(H) / 12(M) |  |

### 3.3. Knowledge sharing

| Has your country developed and published REDD+ knowledge products with FCPF support: |   |
|--|---|
| Yes/No: No   | Please provide the list of published REDD+ knowledge products, if any during reporting period: a) Informe de Niveles de Referencia de Emisiones Forestales (INREF). |

| How many people have been reached by these knowledge products, if any: |
|--|
| Overall number by product: N/A   |
| # of Men: 483  |
| # of Women: 411  |

| Have some experts of your country participated in any South-south learning activities? If yes, how many (men and women)? |   |   |
|--|---|---|
| Yes/No:<br>yes   | List the South-South learning activities: Primera visita a campo: Proyecto Proyecto Reporting for Results-based REDD+ (RRR+), organismo ejecutor MIAMBIENTE y Coalición de Países con Bosques Tropicales (CFRN) marzo, 2017 (Panamá). | # of men:(IP/CSO representatives, private sector representatives)<br><br># of women: (IP/CSO representatives, private sector representatives) |

#### 4. ISSUES, CHALLENGES AND RISKS

This section should present any problems, difficulties or constraints faced by the country in making progress towards the intended REDD+ results (outputs, outcomes and possible impacts), the main causes and their expected effect on the work plan. Actions that have been taken to overcome or manage these constraints/flaws/problems identified should be stated. Each problem/constraint should be stated as a separate point, along with associated proposed changes in work planning for the next six month/year to address it, as relevant.

It is expected that the country monitors any changes in the assumptions that underpin the logic of intervention of FCPF at the national level and other significant risks that may arise. This section should explain through a narrative any changes in the level of risk associated with the different assumptions, or describe new risks that may have emerged and have a significant bearing on the national work-planning with respect to FCPF support for the next year and beyond, along with the associated measures required to address this change.

##### RETOS:

- a) Dejar establecido el Sistema de Información de Salvaguardas, que asegure la participación de los actores clave a lo largo de las diferentes fases de REDD+ Panamá.
- b) Incorporar las demandas de los pueblos indígenas, establecidas en los 12 puntos entregados al Ministerio de Ambiente, en la Estrategia Nacional REDD+.
- c) Incrementar la capacitación en temas de REDD+ y reforzar la divulgación de REDD+ en comunidades de difícil acceso y comarcas indígenas.
- d) Establecer Sistema de Información de Salvaguardas de Panamá, para proteger los medios de vidas, los recursos naturales y el bienestar de las comunidades.
- e) Mejorar el mecanismo de reclamo que posee el Ministerio de Ambiente.

##### RIESGOS:

- f) Resurgimiento de conflictos por parte de los actores clave, en especial atención a los pueblos indígenas, durante la consulta de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá.
- g) Panamá se encuentra en un año preelectoral, lo que podría afectar el consenso y la toma de decisiones a nivel local y nacional.
- h) Falta de consenso para la validación de una Estrategia Nacional REDD+ Panamá.

#### 5. MAIN LESSONS LEARNED

This section should be used to provide information on important lessons learned since the beginning of the readiness process. It is expected that this section will be fairly substantial, making reference to different lessons learned, analysis documents developed, and/or experiences made in dealing with issues of particular interest to REDD+.

Las lecciones aprendidas son las siguientes:

1. Es necesario definir un marco institucional claro que facilite la cooperación y coordinación entre sectores que inciden y tomadores de decisiones entre los diferentes sectores involucrados en REDD+.
2. Incorporar directrices robustas y transparentes en el marco de las condiciones nacionales que puedan impactar a REDD+, adoptar una gestión basada en resultados.
3. Proporcionar sanciones claras, transparentes y aplicables por el no-cumplimiento, en combinación con

mecanismos de gestión de riesgos

4. Contar con procesos definidos y claros tanto para la contratación del recurso humano técnico que responda a las especializaciones y el alcance de REDD+.
5. Contar con mecanismos claros para la transferencia de conocimiento y el desarrollo de las capacidades nacionales, al momento de contar con asesorías técnicas internacionales.
6. Fortalecer la sinergia de coordinación entre la agencia garante y la implementadora para la toma de decisiones.
7. Identificación de metodologías alternativas para la obtención de datos de actividad para el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques (MAPATON 2017).
8. Desarrollo de capacidades nacionales para preparar al país en la construcción del Nivel de Referencia Forestal.
9. Mejorar las sinergias de coordinación entre proyectos para el Nivel de Referencia Forestal, Sistema de Monitoreo Satelital y la tercera comunicación de gases de efecto invernadero.
10. Fortalecimiento de capacidades de los Enlaces Técnicos Regionales y funcionarios de MiAMBIENTE, en el conocimiento y participación en la implementación del POA 2017, asegurará el apoyo necesario para el éxito de la programación regional establecida.
11. En el proceso de construcción de la estrategia, se pone de manifiesto la importancia de considerar la misma con un enfoque regional y con participación de actores clave debidamente informados para participar en la validación de la ENREDD+.
12. El fortalecimiento de capacidades de los actores clave, en el conocimiento y manejo del borrador de la ENREDD+ Panamá, asegurará el apoyo necesario para fortalecer el trabajo a ser realizado en la validación de la ENREDD+ en construcción.
