



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

MARN/DGCAIA/886/2007.

San Salvador, 10 de septiembre de 2007

ASUNTO: Remítese documento firmado

Arquitecta
Carolina Dreikorn
Oficial de Programa
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo
Presente.

Estimada arquitecta Dreikorn:

Para los fines pertinentes, remitimos un original, debidamente firmado, del proyecto "Actividades Habilitantes para la Preparación de la Segunda comunicación Nacional de El Salvador a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático".

Con toda consideración.



Violeta Larde de Rodríguez
Directora General de Cooperación y
Asuntos Internacionales Ambientales, a.i.



El Gobierno de El Salvador
A través del
Ministerio de Relaciones Exteriores

y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

En el Marco del
Plan de Acción de Programa de País 2007-2011 GOES-PNUD

Integran el proyecto
PIMS 3351 Actividades Habilitantes para la Preparación de
la Segunda Comunicación Nacional de El Salvador
a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático CMNCC

Financiado por
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF conocido por sus siglas en inglés)

a ser Ejecutado por

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN

El objetivo de este proyecto es el de facilitar a El Salvador a preparar su Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (SCN). Asimismo, darle continuación al proceso de formación de capacidades tanto institucional como nacional para cumplir sus compromisos ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Las actividades en la Segunda Comunicación Nacional son la continuación de las llevadas a cabo durante la Primera Comunicación Nacional y las actividades conexas desarrolladas a posteriori. Los principales componentes de este proyecto son: el Inventario de Gas Efecto Invernadero (GEI); la identificación de acciones de mitigación en Energía y Cambio de Uso de la Tierra; la profundización de los estudios de Vulnerabilidad y Adaptación en sectores y áreas seleccionadas y la definición de los lineamientos básicos de un Plan Nacional de Cambio Climático articulado a los planes nacionales y locales de desarrollo.

Sección I

Capítulo I. Análisis de la Situación

REFERENCIA A DOCUMENTO GEF ANEXO 1

Capítulo II. Estrategia del Proyecto

REFERENCIA A DOCUMENTO GEF ANEXO 1

2. Estrategia de Salida

El proyecto se implementará a partir de una estrategia de desarrollo de capacidades nacionales con varios actores para que los procesos empezados a partir del mismo puedan seguir autónomamente una vez terminada la implementación.

3. Participación del PNUD

El PNUD hará acopio de toda su experiencia y capacidades, tanto a nivel nacional como internacional, para proporcionar al Gobierno de El Salvador, los conocimientos y recursos técnicos y financieros que contribuyan a la calidad y oportunidad de los resultados del proyecto.

También contribuirá en la creación de alianzas con otros actores y acompañará la gestión de recursos adicionales para las actividades del presente proyecto y para la continuidad de las mismas. El PNUD proveerá apoyo técnico de calidad por medio de los/las Oficiales de Programa respectivos.

Bajo este Proyecto, el PNUD tendrá el rol de Agencia de Implementación (AI) de acuerdo a los lineamientos que el GEF delimita como mecanismo financiero. Por consiguiente, el PNUD como AI es considerada el brazo operacional del GEF y asume las siguientes responsabilidades: Trabajar de manera cercana con las organizaciones y entidades proponentes de proyectos, brindando apoyo para elaborar proyectos desde el diseño de la idea (o concepto) de proyecto hasta la etapa de aprobación del mismo; y Asiste en la implementación del proyecto, sobre todo en lo relacionado al monitoreo y evaluación de los resultados.

Capítulo III. Modalidades de gestión

El Gobierno de El Salvador por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, instancia que para estos efectos se denominará Contraparte Nacional de Coordinación, tiene la responsabilidad global de las actividades que reciben apoyo del PNUD. Su responsabilidad es velar por el logro general de los resultados que se persiguen a través del apoyo del PNUD al país. En particular, el Ministerio de Relaciones Exteriores como Contraparte Nacional de Coordinación actuará en consulta con la oficina del PNUD en El Salvador, a fin de coordinar la asistencia externa y determinar las disposiciones de gestión adecuadas para los proyectos y programas.

Dado que éste proyecto es parte integral del Plan de Acción del Programa de País 2007-2011, el cual ha sido suscrito por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el PNUD con fecha 19 de diciembre de 2006, se seguirá lo establecido en él para la suscripción de proyectos “Los proyectos que se lleven a

cabo en el presente Programa serán suscritos entre el PNUD y los Asociados en la implementación y deberán señalar de forma explícita su relación con el presente documento”.

El proyecto se ejecutará bajo la modalidad de Ejecución Nacional (NEX), en el que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), asume la responsabilidad de la ejecución asegurando el logro de los resultados esperados, para lo cual contará con apoyo técnico encargado de la realización de todas actividades circunscritas en el proyecto.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), actúa como Punto Focal ante las principales convenciones multilaterales ambientales, dentro de los cuales se cuentan: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Biodiversidad, Lucha contra la Desertificación y la Sequía, Humedales, entre otros.

A nivel nacional, La Dirección de Patrimonio Natural del MARN será la institución responsable de la implementación del proyecto, a través del Área de Cambio Climático de la Gerencia de Recursos Físicos y Energía, que tiene dentro de sus responsabilidades dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el país, bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático CMNUCC y el Protocolo de Kioto PK.

Los puntos focales de la CMNUCC y del PK, coordinarán el desarrollo de la SCN, con el apoyo técnico de instituciones internacionales especializadas de reconocido prestigio, en materia de mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación a los impactos adversos del cambio climático; quienes a su vez subcontratarán expertos nacionales con experiencia comprobada en la materia.

El proyecto planifica establecer un Comité Consultivo, para el cual se invitarán a las instituciones siguientes: MARN, Ministerio de Economía (MINEC), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) y el PNUD, el Comité servirá de enlace con los sectores relevantes de acuerdo al alcance de la SCN, facilitarán la obtención de información que sirva de base para el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto, propondrán líneas estratégicas para ejecución efectiva de la SCN, se les mantendrá informado de los avances y resultados alcanzados, tanto parciales como finales.

La modalidad de gestión de fondos será por Pagos Directos a proveedores o terceras partes por obligaciones contraídas por los asociados en la ejecución en apoyo de actividades acordadas en los planes de trabajo anuales. Para la ejecución del proyecto se aplicará los gastos relacionados a los Servicios de Apoyo a la Ejecución (ISS).

2. Compras y contrataciones

Todo contrato de personal, servicio, obras y adquisiciones suscrito en el marco del presente proyecto seguirá las normas de compras y contrataciones del PNUD y será suscrito entre MARN y el proveedor de los bienes o servicios.

3. Monitoreo y Evaluación

REFERENCIA A DOCUMENTO GEF ANEXO 1

4. Finalización del proyecto

El presente proyecto terminará: 1) por vencimiento del término previsto para su duración; 2) Por mutuo acuerdo de las partes; 3) Por cumplimiento de sus objetivos inmediatos antes o después de lo previsto; 4) Por fuerza mayor o caso fortuito.

5. Cláusula de Auditoria

REFERENCIA A DOCUMENTO GEF ANEXO 1

6. Contexto Legal

REFERENCIA A DOCUMENTO GEF ANEXO 1

Sección II. Plan Global de Trabajo y Presupuesto (AWP)

Award ID: 00044453

Award Title: PIMS 3351 Actividades Habilitantes para la Preparación de la Segunda Comunicación Nacional de El Salvador a la CMNCC

Project ID: 00052272

Project Title: PIMS 3351 Actividades Habilitantes para la Preparación de la Segunda Comunicación Nacional de El Salvador a la CMNCC

Resultados	Parte resp.	Presupuesto programado (U.S\$)							Total
		Fuente fondos	Código	Descripción	2007	2008	2009		
I. Circunstancias nacionales (incluye es cenario socioeconómico)									
Diagnóstico socioeconómico y amb vinculado al cambio climático	MARN	62000	71200	Personal internac.	8,000.00	7,000.00			15,000.00
			71300	Servicios contract.	2,500.00	2,500.00			5,000.00
Desarrollo de escenario socioeconómico	MARN	62000	71200	Personal internac.	7,000.00	8,000.00			15,000.00
			71300	Servicios contract.	2,500.00	2,500.00			5,000.00
Documento de circunstancias nacionales	MARN	62000	71200	Personal internac.		5,000.00			5,000.00
SUB-TOTAL					20,000.00	25,000.00			45,000.00
II. Inventario nacional de GEI									
Desarrollo inventario 2000 y recálculo del de 1994	MARN	62000	71200	Personal internac.	28,000.00	15,000.00		18,000.00	61,000.00
			71300	Servicios contract.	10,000.00	10,000.00		5,000.00	25,000.00
Propuesta institucionalización del inventario	MARN	62000	71200	Personal internac.		4,000.00		2,000.00	6,000.00
			71300	Servicios contract.		2,000.00		1,000.00	3,000.00
Documento de INGEI	MARN	62000	71200	Personal internac.				5,000.00	5,000.00
SUB-TOTAL					38,000.00	31,000.00		31,000.00	100,000.00
III. Estudios de mitigación									
Escenarios de emisiones sectores energía, CUSS y desechos sólidos	MARN	62000	71200	Personal internac.	5,000.00	5,000.00			10,000.00
			71300	Servicios contract.	2,500.00	2,500.00			5,000.00
Identificación de barreras sectores energía, CUSS y desechos sólidos	MARN	62000	71200	Personal internac.		5,000.00		5,000.00	10,000.00
			71300	Servicios contract.		2,500.00		2,500.00	5,000.00
Opciones de mitigación sector energía, CUSS y desechos sólidos	MARN	62000	71200	Personal internac.		6,000.00		4,000.00	10,000.00
			71300	Servicios contract.		2,500.00		2,500.00	5,000.00
Cuantificación del impacto sobre las emisiones de GEI	MARN	62000	71200	Personal internac.		5,000.00		15,000.00	20,000.00
			71300	Servicios contract.		2,500.00		2,500.00	5,000.00
Estimación de los costos de implementación y viabilidad de las opciones	MARN	62000	71200	Personal internac.		2,000.00		8,000.00	10,000.00
			71300	Servicios contract.		2,500.00		2,500.00	5,000.00
Síntesis de los escenarios de mitigación de los tres sectores	MARN	62000	71200	Personal internac.		10,000.00		15,000.00	25,000.00
			71300	Servicios contract.					
SUB-TOTAL					7,500.00	45,500.00		57,000.00	100,000.00
IV. Estudios de Vulnerabilidad y Adaptación									
Escenarios climáticos a diferentes horizontes de tiempo futuro	MARN	62000	71200	Personal internac.		15,000.00		15,000.00	15,000.00
			71300	Servicios contract.		5,000.00		5,000.00	5,000.00
Evaluaciones de vulnerabilidad, impactos y riesgos del cambio climático	MARN	62000	71200	Personal internac.		10,000.00		10,000.00	20,000.00
			71300	Servicios contract.		10,000.00		10,000.00	20,000.00
Desarrollo de criterios y líneas de acción para incorporación en políticas	MARN	62000	71200	Personal internac.				10,000.00	10,000.00
			71300	Servicios contract.				10,000.00	10,000.00
SUB-TOTAL						40,000.00		40,000.00	80,000.00

Resultados	Parte resp.	Fuente fondos	Código	Descripción	Presupuesto programado (U.S\$)			Total
					2007	2008	2009	
V. Otra información relevante	MARN	62000	74500	Misceláneos		5,000.00	8,000.00	13,000.00
Creación de capacidades y sensibilización pública						5,000.00	8,000.00	13,000.00
SUB-TOTAL						5,000.00	8,000.00	13,000.00
VI. Preparación y reinión de la SCN								
	MARN	62000	72500	Equipo computac.		15,000.00	2,000.00	17,000.00
			74200	Publicaciones			20,000.00	20,000.00
			74500	Misceláneos	1,000.00	2,000.00	1,000.00	4,000.00
			73200	Mantenim. Equipos		500.00	500.00	1,000.00
SUB-TOTAL					1,000.00	17,500.00	23,500.00	42,000.00
VII. Limitaciones y vacíos relac. con necesidades y capacidad								
Este resultado será financiado con fondos de contrapartida, del gobierno de El Salvador (GOES), de acuerdo al detalle del presupuesto de contrapartida	MARN	GOES						
SUB-TOTAL								
VIII. Supervisión e informes								
Este resultado será financiado con fondos de contrapartida, del gobierno de El Salvador (GOES), de acuerdo al detalle del presupuesto de contrapartida	MARN	GOES						
SUB-TOTAL								
IX. Realización de auditorías								
	MARN	62000	71300	Personal local		5,000.00	5,000.00	15,000.00
SUB-TOTAL						5,000.00	5,000.00	15,000.00
GRAN-TOTAL						71,500.00	169,000.00	405,000.00

Detalle del Presupuesto de Fondos de Contrapartida en Especies del MARN

No.	Rubro	Fuente de financiamiento	
		Monto	Descripción
1	Planeación y organización del proyecto	51,840.00	Fondo general del GOES
2	Dirección y coordinación técnica	51,840.00	Fondo general del GOES
3	Manejo de información	8,640.00	Fondo general del GOES
4	Apoyo técnico	43,200.00	Fondo general del GOES
5	Administración del proyecto	17,280.00	Fondo general del GOES
6	Apoyo administrativo	3,600.00	Fondo general del GOES
	TOTAL	176,400.00	

El MARN presentará al PNUD informes trimestrales en los que reportará los aportes de contrapartida en especie, los que deberán realizarse por medio de notas de cargo al proyecto sobre la base de las contribuciones reales del MARN al Proyecto.

MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACION

Año 2007, 2008 y 2009

Resultados y actividades a monitorear	Línea de base	Indicadores	Acciones de monitoreo/ Medios de Verificación	Fin 2007.	Oficial de programa del PNUD y
Diagnósticos Ambientales vinculados al CC y Escenarios Socio Económicos	<ul style="list-style-type: none"> Estudios generados en Primera Comunicación de CC 	<p>Nivel de participación, debate y aportes generado en eventos de consulta. No. y tipología de organizaciones involucradas en el proceso.</p> <p>Grado de adopción y articulación entre las instituciones participantes y con otros.</p>	Análisis de documentación secundaria, Informes de seguimiento y sistematizaciones	Fin 2007.	Oficial de programa del PNUD y
1. Inventario Nacional de Gas Efecto Invernadero INGEI 2000	<ul style="list-style-type: none"> Revisión del Inventario INGEI 1994 Documentos generados en Fase II de Primera Comunicación CC Guía de buenas practicas del IPCC 	<p>Nivel de participación, debate y aportes generado en eventos de consulta y desarrollo de Inventario. No. y tipología de organizaciones involucradas en el proceso (nacionales e internacionales).</p> <p>Grado de adopción y articulación entre las instituciones participantes de GOES, Academia y OSC..</p>	Análisis de documentación secundaria, Informes de seguimiento y sistematizaciones	Fin 2007 y Fin 2008	Oficial de programa del PNUD y la Unidad Coordinadora Regional (UCR) del PNUD-GEF

<p>Estudio de Mitigación del Sector Energético</p> <p>Estudio de Opciones de Mitigación en Cambio del Uso del Suelo y Silvicultura (CUSS)</p> <p>Estudio de Mitigación en Desechos Sólidos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Términos de Referencia detallados y metodologías establecidas • Escenarios de mitigación y estudios preparados en Primera Comunicación (Energía, CUSS y Desechos Sólidos) • Información y Estudios sobre desechos sólidos generados por otros proyectos (Descontaminación de áreas críticas-BID) 	<p>Grado de participación e involucración de consultores nacionales e instituciones nacionales (local y central) en el desarrollo de estudios.</p> <p>Nivel de participación, debate y aportes generado en eventos de consulta y desarrollo de los 3 Estudios .</p> <p>No. y tipología de organizaciones involucradas en el proceso (nacionales e internacionales).</p>	<p>Análisis de documentación, secundaría, Informes de seguimiento y sistematizaciones</p>	<p>Fin 2008</p>	<p>Oficial de programa del PNUD y la Unidad Coordinadora Regional (UCR) del PNUD-GEF</p>	
--	--	---	---	-----------------	--	--

<p>Estudios de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático</p>	<ul style="list-style-type: none"> Estudios de V&A desarrollados en Primera Comunicación y proyecciones (escenarios y estadísticas climáticas) Estadísticas meteorológicas Estudios y de estrategia de adaptación al CC de Zona Bajo Lempa 	<p>Grado de participación e involucración de consultores nacionales e instituciones nacionales (local y central) y representantes de comunidades en el desarrollo de estudios.</p> <p>Nivel de participación, debate y aportes generado en eventos de consulta y desarrollo en los Estudios. No. y tipología de organizaciones involucradas en el proceso (nacionales/local e internacionales).</p>	<p>Análisis de documentación secundaria, Informes de seguimiento y sistematizaciones</p>	<p>Fin 2008 y Tercer Trimestre del 2009</p>	<p>Oficial de programa del PNUD y la Unidad Coordinadora Regional (UCR) del PNUD-GEF</p>
<p>Documento Final Segunda Comunicación de Cambio Climático – que incluye el Plan Nacional de Cambio Climático</p>	<ul style="list-style-type: none"> Otras Comunicaciones de la región CA 	<p>Nivel de participación e insumos aportados en las consultas y divulgación del producto final. No. y tipología de organizaciones involucradas en el proceso (nacionales/local).</p>	<p>Análisis de documentación secundaria. Informes de seguimiento y sistematizaciones</p>	<p>Fin 2009</p>	<p>Oficial de programa del PNUD y la Unidad Coordinadora Regional (UCR) del PNUD-GEF</p>

8. Plan de Trabajo Detallado

Resultados/actividades	2007				2008				2009			
	1 T	2 T	3 T	4 T	1 T	2 T	3 T	4 T	1 T	2 T	3 T	4 T
0. Lanzamiento del Proyecto												
0.1. Planeación, organización y puesta en operación del proyecto												
0.2. Ajuste y desarrollo del Plan de Actividades detallado												
Componente 1												
Proceso de Contratación de Expertos Internacionales												
I. Circunstancias nacionales												
1.1. Conformación del equipo de trabajo y ajuste de los TDRs.												
1.2. Recopilación y análisis de la información de base												
1.3. Definición y acuerdo sobre abordaje metodológico y alcance del capítulo.												
1.4. Diagnóstico socio-económico y ambiental y su vinculación con Cambio Climático												
1.5. Fijación de las pautas, criterios y premisas para el desarrollo del escenario socioeconómico.												
1.6. Desarrollo del Escenario Socio-económico												
II. Inventario nacional de GEI												
2.1. Conformación del equipo de trabajo y ajuste de los TDRs.												
2.2. Actualización del Conocimiento sobre Guías de Buenas Prácticas y otra documentación del IPCC												
2.3. Revisión de los cálculos del INGEI 1994 y de los documentos de revisión generados en la Fase II.												
2.4. Análisis del INGEI 2000 e identificación de vacíos de información y												


Resultados/actividades	2007				2008				2009			
	1 T	2 T	3 T	4 T	1 T	2 T	3 T	4 T	1 T	2 T	3 T	4 T
metodológicos.												
2.5. Recolección de información adicional para el ajuste del INGEI 2000.												
2.6. Desarrollo de los inventarios para 2000 y re-cálculo del inventario 1994												
2.7. Propuesta de institucionalización del Inventario												
2.8. Revisión y comentarios, tanto por expertos nacionales como internacionales del INGEI.												
III. Estudios de Litigación												
3.1. Definición de los criterios básicos y de contexto para el análisis de mitigación.												
3.2. TDRs detallados y metodologías												
3.3. Estudio de mitigación del sector energético												
a) Diagnóstico y escenario energético de referencia												
b) Ajuste del modelo LEAP y corrida de referencia												
c) Identificación de opciones de mitigación y cuantificación de sus efectos												
d) Escenario de mitigación y corrida del modelo LEAP												
e) Cuantificación de los impactos sobre emisiones.												
f) Identificación de barreras												
g) Estimación de costos incrementales												
h) Síntesis de los resultados de los análisis de mitigación en energía.												
3.4. Opciones de mitigación en CUSS												
a) Identificación y análisis de antecedentes												
c) Identificación de los instrumentos												
d) Identificación de las posibles opciones de mitigación en cuanto a tipo de actividades, regiones y especies más atractivas												
e) Cuantificación del impacto esperado de												

Resultados/actividades	2007				2008				2009			
	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
las acciones anteriores												
f) Análisis de barreras												
g) Costeo preliminar de las diferentes opciones												
3.5. Opciones de mitigación en desechos sólidos												
a) Identificación de la información relevante de la estrategia gubernamental para Oriente												
b) Estimación de las emisiones de la línea de referencia												
c) Estimación del efecto de las medidas de mitigación sobre emisiones evitadas												
d) Condiciones para la extrapolación a nivel nacional												
e) Estimación del impacto de la generalización de rellenos sanitarios a nivel nacional sobre la reducción de emisiones												
Componente 2												
Proceso de Contratación de Expertos												
IV. Estudios de V&A												
4.1. Planificación y organización del abordaje de V&A												
4.2. Ajustar los Términos de Referencia de los estudios de vulnerabilidad.												
4.3. Proyecciones climáticas al 2020 y 2085												
a) Procesamiento y control de calidad de la información climática												
b) Generación y análisis de estadísticas meteorológicas												
c) Desarrollo de indicadores e índices												
d) Corrida del modelo SDSM y análisis de las salidas												
e) Construcción de escenarios climáticos												

Resultados/actividades	2007				2008				2009			
	1 T	2 T	3 T	4 T	1 T	2 T	3 T	4 T	1 T	2 T	3 T	4 T
f) Elaboración y presentación de resultados												
4.4. Evaluación de impactos del cambio climático en sistemas humanos priorizados												
a) Evaluación de los resultados de los estudios: i) evaluación de los impactos del cambio climático en la zona costera, y ii) Evaluación de los impactos del cambio climático en las comunidades humanas de la planicie costera central												
b) Evaluar los impactos y vulnerabilidad de sistemas socio-naturales priorizados.												
c) Estimar la influencia de cambios futuros de los parámetros climáticos relevantes.												
d) Lograr la participación activa de los actores locales.												
4.5. Propuesta de criterios normas y líneas de acción para incorporar la adaptación al CC en políticas sectoriales												
a) Criterios y lineamientos para incorporar el CC en la política de ordenamiento del uso de los recursos costero-marinos.												
b) Criterios y lineamientos para zonificación y ordenamiento del territorio de la zona costera.												
c) Criterios y lineamientos para incorporar la adaptación al cambio climático en los planes de manejo de los sistemas naturales de la zona costera.												
d) Propuestas de ordenanzas municipales para minimizar, reducir o prevenir los impactos del cambio climático en los sistemas humanos evaluados.												
V. Otras Actividades												
5.1. Reuniones de trabajo y talleres de												

Resultados/actividades	2007				2008				2009			
	1 T	2 T	3 T	4 T	1 T	2 T	3 T	4 T	1 T	2 T	3 T	4 T
presentación y divulgación												
5.2. Preparación y remisión de la SCN												
a) Preparación y consulta del documento final de la Segunda Comunicación Nacional (SCN).												
b) Preparar y traducir al idioma inglés el Resumen Ejecutivo de la SCN.												
c) Reproducción y distribución del documento de la SCN												
d) Entrega oficial de la SCN a la Secretaria de la CMNUCC.												
5.3. Evento de divulgación de la SCN.												
VI. Supervisión e informes												
6.1. Preparar el Informe Inicial del proyecto.												
6.2. Preparar informes trimestrales de avance para la Oficina Regional del GEF-PNUD y la oficina local de PNUD.												
6.3. Preparar informes semestrales de avance físico de las actividades y resultados.												
6.4. Elaborar el Informe Final del proyecto y remitirlo al donante.												
6.5. Reuniones de información y consulta semestrales con el Comité de Consultivo del Proyecto.												
6.6. Realización de auditorías anuales												
6.7. Ejecución de Reuniones Tripartitas para el monitoreo de la ejecución del proyecto.												

Estructura Organizacional para la implementación del Proyecto

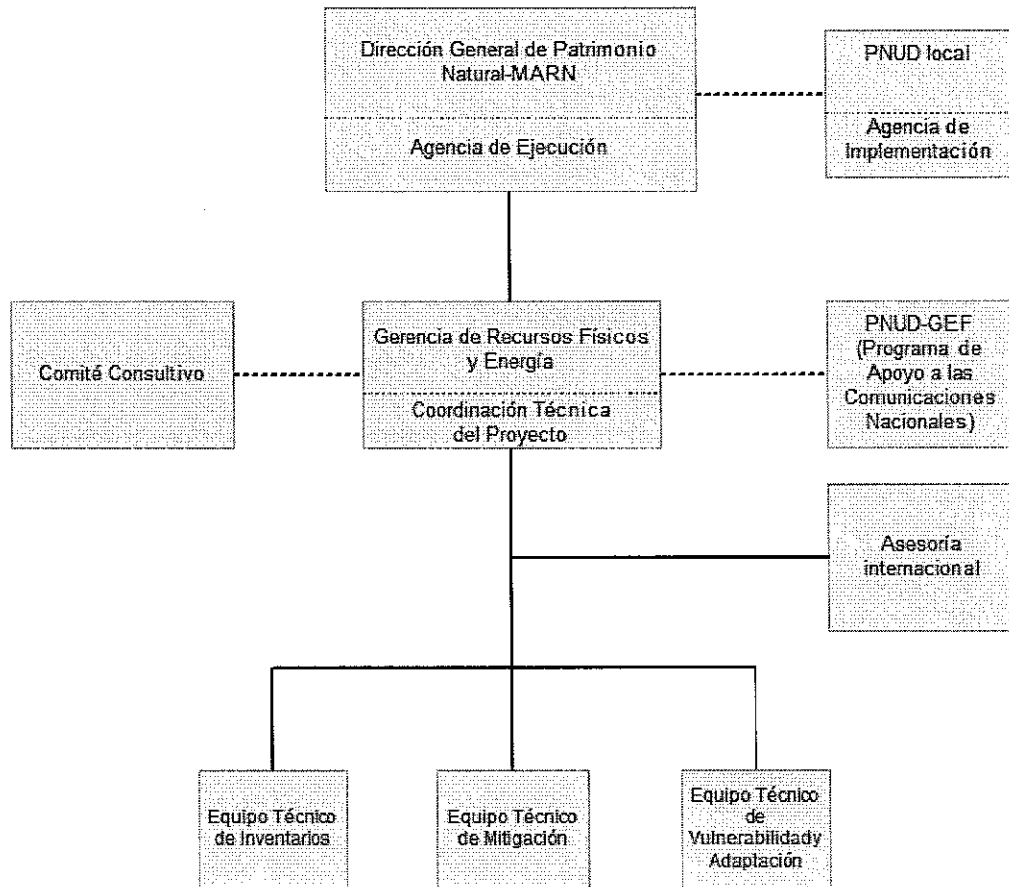

País: El Salvador

UNDAF Resultado(s)/Indicador(es): MA1 Políticas, estrategias y recursos que vinculen el cambio climático y energía con áreas estratégicas de la gestión del desarrollo, medio ambiente y gestión de riesgos establecida.

CPAP Resultado: 4.1 Incrementadas capacidades nacionales de formulación e implementación de políticas, estrategias y planes para el manejo sostenible del medio ambiente en las áreas de cambio climático, energía, ecosistemas y recursos hídricos.

CPAP Producto:: 4.2.1.1 Desarrollo de capacidades nacionales, apoyo al diseño y ejecución de estrategias y programas de cambio climático y energía. En particular, se prevé apoyar la estrategia nacional del país en la materia, en el marco de la segunda Comunicación sobre cambio climático, y apoyar iniciativas concretas de uso de opciones energéticas sostenibles y de adaptación al cambio climático en áreas geográficas clave

Institución Designada: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MARN

Nombre del proyecto: PIMS 3351 Actividades Habilitantes para la preparación de la Segunda Comunicación Nacional de El Salvador a la CMNCC

Identificación del proyecto: 00052272

Duración del proyecto: 3 años

Presupuesto total:	\$405,000
Recursos asignados:	
• Gobierno	\$176,400 en especies
• Regulares	_____
• Otros: (incluye aportes en especie)	
○ Donante	_____
○ Donante	_____
○ Donante	_____

Presupuesto total : \$405,000

Aprobado por MARN

Fecha:



Carlos José Guerrero

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Asociado en la Implementación

Aprobado por PNUD

Jessica Faieta
Representante Residente
